

①



Santo Domingo, D.N.
28 de septiembre de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución del D.M. Paradero.**



En la visita técnica realizada el 13 de junio de 2023 se validó la ejecución de 773.00 metros cuadrados de aceras y 751.46 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.


La supervisión externa ha validado la ejecución de 189.3 metros cuadrados de aceras, y 199 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 962.30 metros cuadrados de aceras y 950.46 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,

Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 270205
REGIÓN: CIBAO NOROESTE
PROVINCIA: VALVERDE
MUNICIPIO: ESPERANZA
DISTRITO MUNICIPAL: PARADERO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13 de junio de 2023

TÉCNICOS: 1. César De Los Santos
2. Ing. Ana Indhira Ramírez

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECCION LA CAYOTA (CALLE PRINCIPAL)	331.50	1.00	2.00	320.73	2.00	663.00	641.46
TRAMO B	SECCION LOMA DE AGUACATE	110.00	1.00	1.00	110.00	1.00	110.00	110.00
Total							773.00	751.46

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,720,556.18
Monto desembolsado RD\$ 2,720,556.18 (100%)
Avance de obra 104.88%





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NOROESTE
PROVINCIA: VALVERDE
MUNICIPIO: ESPERANZA
DISTRITO MUNICIPAL: PARADERO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13 de junio de 2023

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 773.00 metros cuadrados de aceras y 751.46 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Este distrito esta construyendo por contrato.
2. Hasta el momento esta cumpliendo con los parametros recomendados.
3. En este distrito damos por cerrado dicho programa.




IMÁGENES

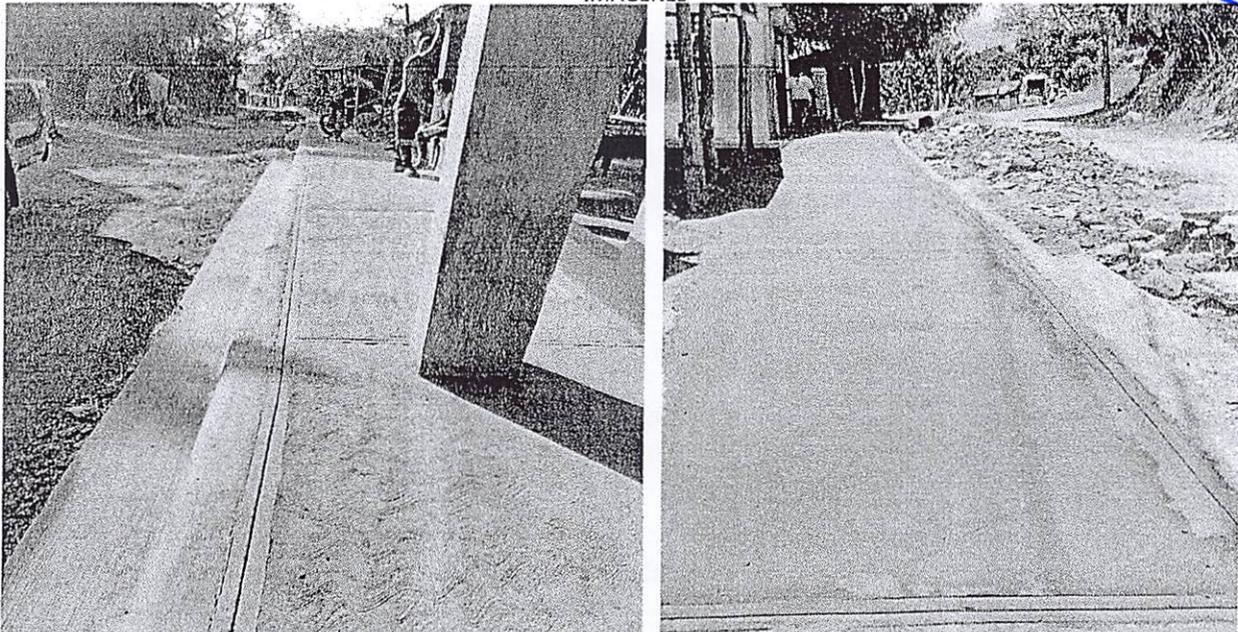





LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

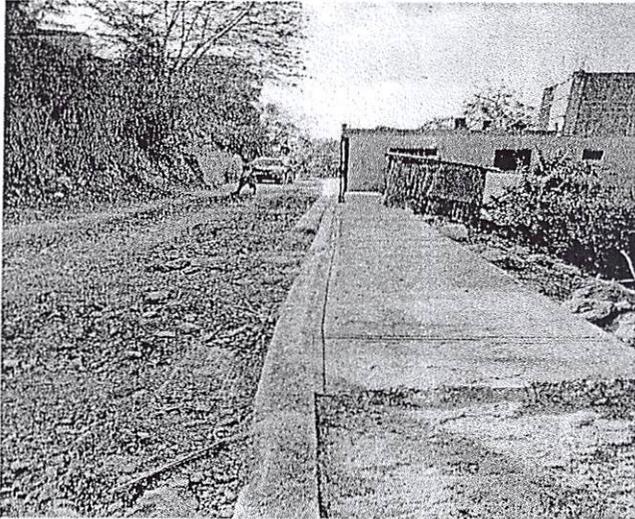

Suministra los datos de este reporte,


CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico



**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: VALVERDE
MUNICIPIO: ESPERANZA
DISTRITO MUNICIPAL: PARADERO
BARRIO Y/O SECTOR:

EL AGUACATE

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
b. Contratista

Razón Social: JUNTA DISTRITAL DE PARADERO
RNC ó Cédula: 430076112

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
b. Incluye demoliciones de tramos:
c. Incluye badenes:
d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES




4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	El Aguacate	19.6386935	-70.8966488	19.6379981	-70.896853	189.3	1	199	189.3	199
Tramo B										
Tramo C										
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

Unidad Ejecutiva
 REVISADO
16 ENI 023
 CONTRATORIA
 Oficina Interna



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										

Unidad de Planeación
 Privada
 10 ENE 2023
 CONTRATORIA
 Alcaldía Municipal de Esperanza



5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Los contenes se ven muy bien construidos, las aceras estan violinadas y tienen su debido relleno.

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Anthony y Esidro Almonte Lopez

FIRMA:

Anthony Al

CÉDULA:

094-0023263-4

CODIA:

43217

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

13 de septiembre 2023



Valida y aprueba los datos suministrados,

Alba R. Cruz

Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal





CONTRALORIA
18 ENE 2023
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna




REDMI NOTE 12 PRO

CONTRATORIA
2025 2021
Código Interno



COMUNIDAD
16-11-2017
Unidad 11
Antena

REDMI NOTE 5

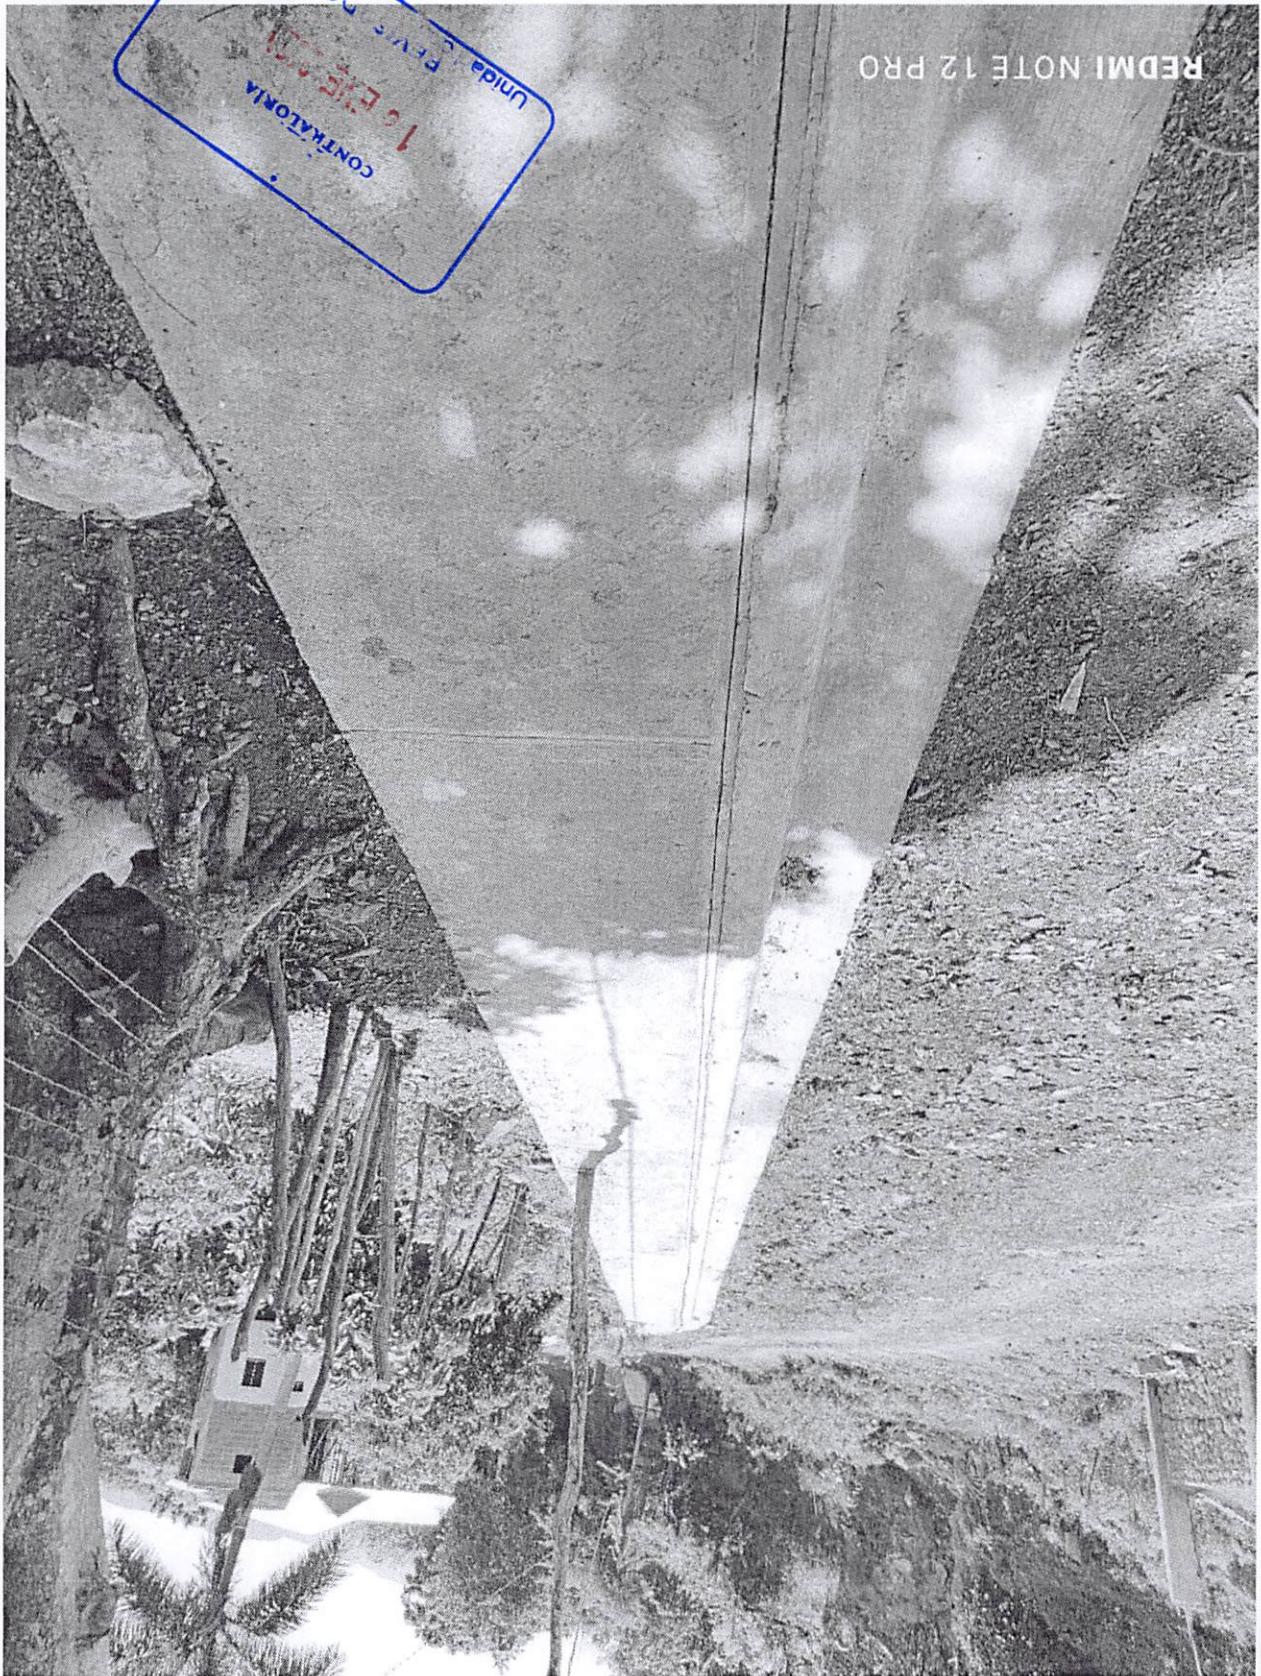



REDMI NOTE 12 PRO

CONTRALORIA
16/05/2024
Unidade FFEV-02
Via Interna
