

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 180502
 REGIÓN: CIBAO NORTE
 PROVINCIA: PUERTO PLATA
 MUNICIPIO: LOS HIDALGOS
 DISTRITO MUNICIPAL: NAVAS

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 11 de mayo de 2023
 1. Ing. Richard Cabrera
 TÉCNICOS: 2. Arq. Keilin Mora


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ CRISTOBAL COLON	26.30	1.00	1.00			26.30	
TRAMO B	C/ CRISTOBAL COLON	39.60	1.00	1.00			39.60	
TRAMO C	C/ CRISTOBAL COLON	62.80	1.00	1.00	62.80	1.00	62.80	62.80
TRAMO D	C/ CRISTOBAL COLON	27.30	1.00	1.00			27.30	
TRAMO E	C/ LOS CEDROS	69.70	1.00	1.00	59.40	1.00	69.70	59.40
TRAMO F	C/ LOS CEDROS	121.50	1.00	1.00	121.50	1.00	121.50	121.50
TRAMO G	C/ LOS CEDROS	107.80	1.00	1.00	111.30	1.00	107.80	111.30
TRAMO H	C/ VISTA ALEGRE	43.60	1.00	1.00	43.60	1.00	43.60	43.60
TRAMO I	C/ VISTA ALEGRE	100.90	1.00	1.00	163.10	1.00	100.90	163.10
TRAMO J	C/ LOS CEDROS				203.50	1.00		203.50
TRAMO K	CALLE VISTA ALEGRE	13.30	2.10	1.00			27.93	
TRAMO L	CALLE VISTA ALEGRE	61.90	1.00	1.00	61.90	1.00	61.90	61.90
TRAMO M	CALLE VISTA ALEGRE	66.00	2.90	1.00	88.40	1.00	191.40	88.40
Total							880.73	915.50

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA



Montto asignado RD\$ 2,995,813.44
 Montto desembolsado RD\$ 2,995,813.45 (100%)
 Avance de obra 113.64%

Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA
Técnico



ARQ. KEILIN MORA
Técnico

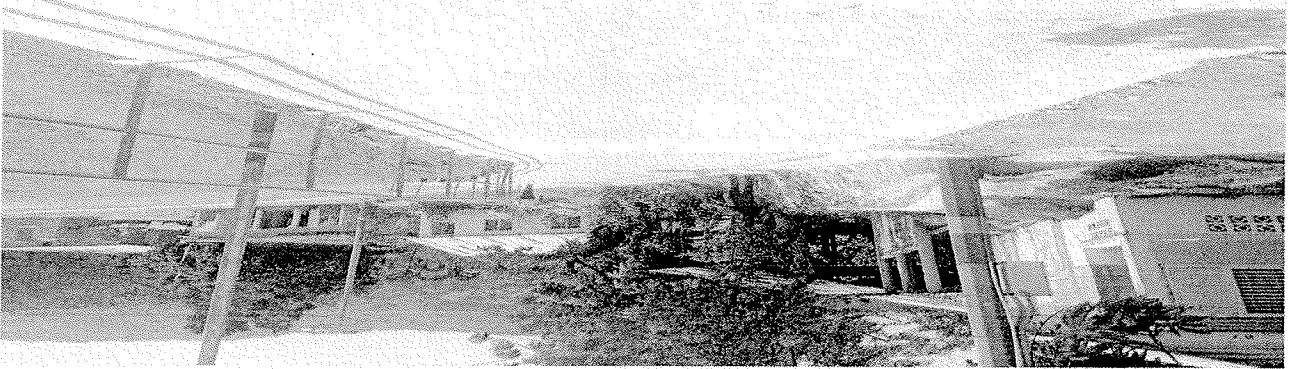

LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—

