

Santo Domingo, D.N.
09 de mayo de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho


Asunto: **Remisión de reporte de avance de ejecución del DM Cenoví**

En la visita técnica realizada el 15 de septiembre del 2022 se validó la ejecución de 1,249.16 metros cuadrados de aceras y 1,112 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 240 metros cuadrados de aceras y 300 metros lineales de contenes con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.


Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 1,489.16 metros cuadrados de aceras y 1,412 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local **aún no ha cumplido** con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 95 % de los fondos asignados para este territorio.


Para su conocimiento y fines de lugar,



Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 060103

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: DUARTE

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE MACORÍS


DISTRITO MUNICIPAL: CENOVÍ

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 15 de septiembre de 2022

1. Ing. Richard Cabrera

TÉCNICOS: 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (M)	ANCHO DE ACERAS (M)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (M)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (M2)	TOTAL DE CONTENES (M)
TRAMO A	CALLE LOS INDIOS	279.50	1.26	1	279.50	1	352.17	279.5
TRAMO B	CALLE LOS INDIOS	233.00	1.18	1	233.00	1	274.94	233
TRAMO C	CALLE DEL PORQUERO	214.50	0.80	1	214.50	1	171.6	214.5
TRAMO D	CALLE PRINCIPAL CENOVI-BANDERA	385.00	1.17	1	385	1	450.45	385
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							1249.16	1112.00




AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,199,657.24

Monto desembolsado RD\$ 4,199,657.25 (100%)

Avance de obra 110.26%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 15 de septiembre de 2022

PROVINCIA: DUARTE

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE MACORÍS

DISTRITO MUNICIPAL: CENOVÍ


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,249.16 metros cuadrados de aceras y 1,112.00 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Se pudo observar una buena terminación en la acera y contenes construido hasta el momento de la visita.

IMÁGENES

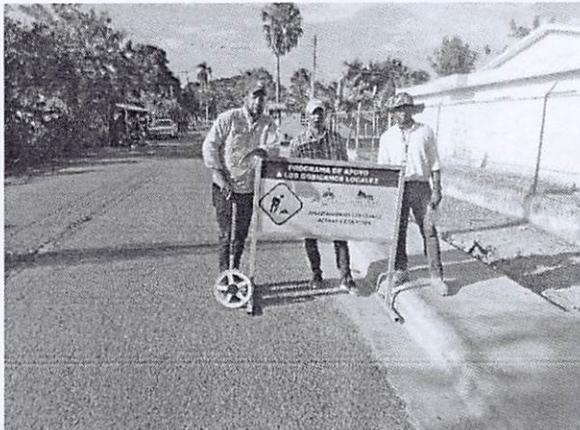



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

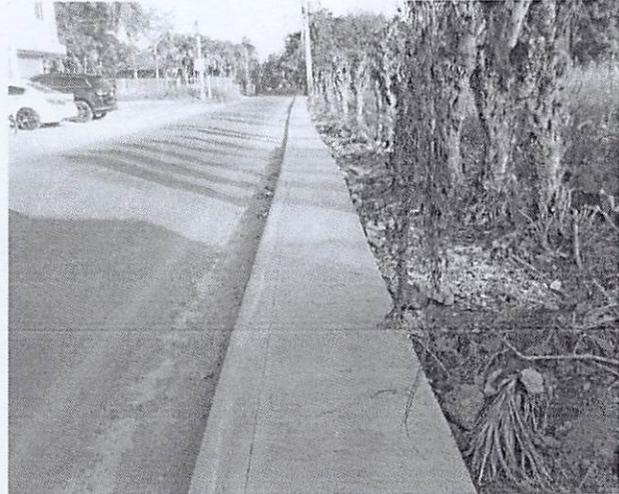

Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA
Técnico

CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico





LIGA MUNICIPAL
DOMINICANA

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

REPORTES DE AVANCE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA:

DUARTE

MUNICIPIO:

SAN FRANCISCO DE MACORIS

DISTRITO MUNICIPAL:

CENOVI

BARRIO Y/O SECTOR:

GENIMILLO



2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local

b. Contratista

Razón Social

Pedro Soel Candalaria

RNC ó Cédula:

0560162553-5

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

a. Reparación de aceras y contenes:

b. Incluye demoliciones de tramos:

c. Incluye badenes:

d. Otros:



4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	CARRETERA GENIMILLO	364313	2125615	364376	2125483	150	0.80	150	240.00	300
Tramo B										
Tramo C										
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										



5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Reporte Avance de Obra.

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.



Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Julio Cesar Espinoz

CÉDULA:

056 0014007-2

CODIA:

8831

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:


11/04/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,

AM


Firma y sello
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



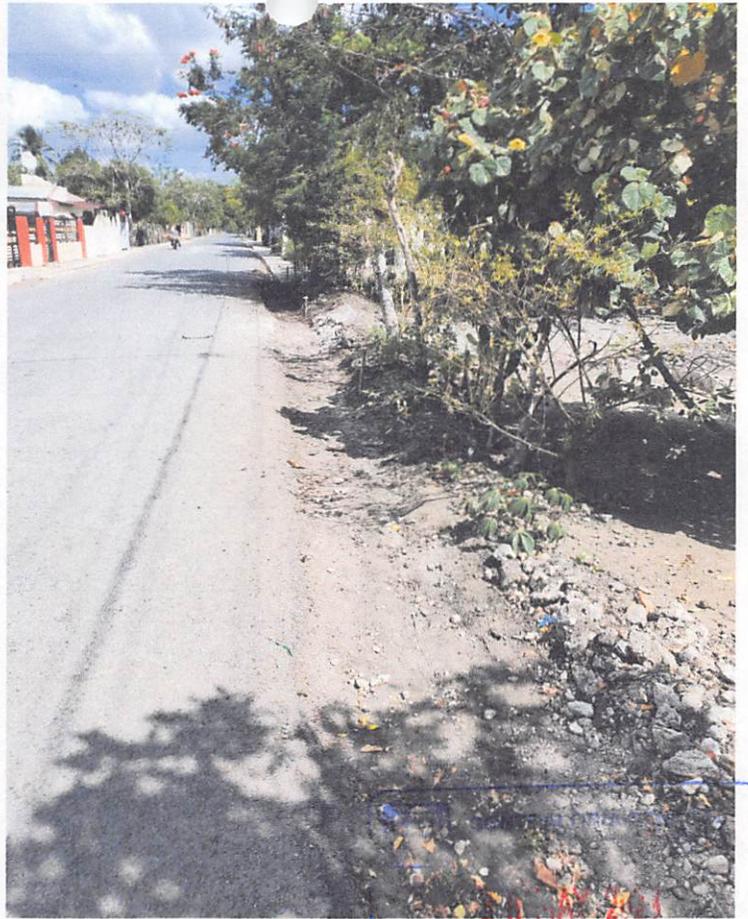

REVISADO



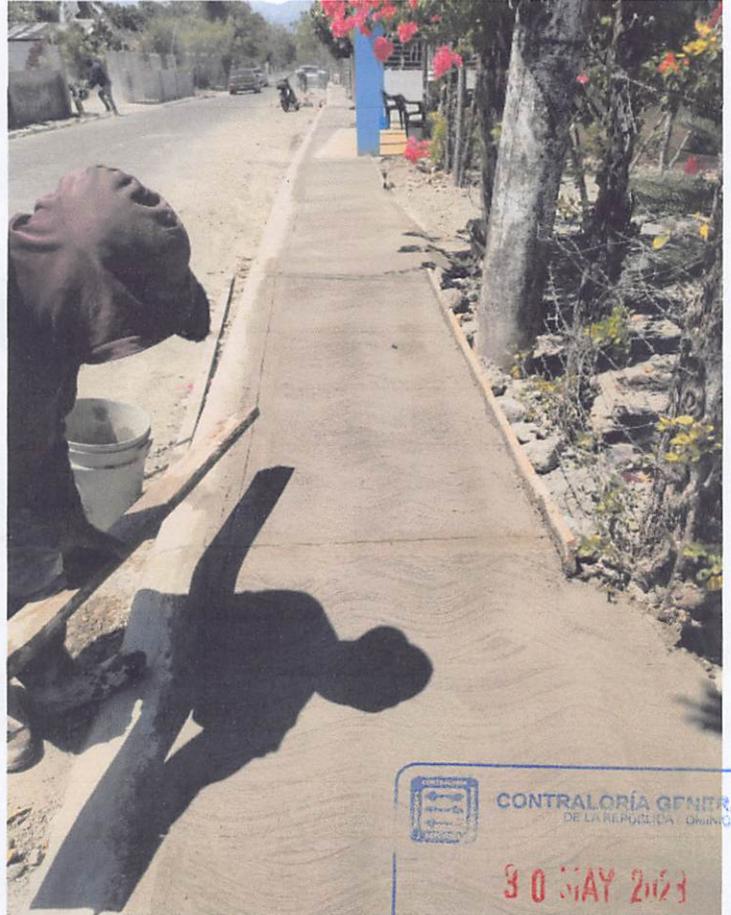

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA GUINEANA
30 MAY 2023
REVISADO
Unidad de Auditoría



