



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

Santo Domingo, D.N.
15 de mayo de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de reporte de cierre de ejecución del DM Capotillo**

En la visita realizada por el CODIA se validó la ejecución de 1,244 metros lineales de contenes, en la visita técnica realizada el 04 de mayo del 2023 se validó la ejecución de 1,263.32 metros cuadrados de aceras y 1,620.60 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 779.2 metros cuadrados de aceras y 974 metros lineales de contenes con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 2,042.52 metros cuadrados de aceras y 3,838.60 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales



PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

INFORMES DE PROYECTOS (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: Dajabon

MUNICIPIO: Soma de Cabrera

DISTRITO MUNICIPAL: Capatzen

BARRIO Y/O SECTOR:

Entrada del Distrito

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local

b. Liga Municipal Dominicana

c. Contratista

Nombre:

RNC:

2- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

2.1. Datos técnicos

Los datos requeridos en este numeral son para fines estadísticos. En el marco de este programa solo se contempla la construcción nueva de aceras y contenes, todas las obras de reparación, mejora y obras complementarias como badenes, imbornales, etc., corren con fondos del gobierno local.

- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros: _____

2.2. Nombre, tramos, longitud, ancho y datos georreferenciales de las aceras a intervenir

Tome en su celular la localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		ANCHO DE LA CALLE (m)	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Calle principal	19' 24"	71' 39"	19' 24"	71' 39"					691
Tramo B		49" N	49" W	59" N	28" W					553
Tramo C		19' 24"	71' 39"	14' 24"	71' 39"					1244
Tramo D		49" N	49" W	59" W	28" W					
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

2.2 Entorno inmediato (Edificaciones existentes): Viviendas Escuelas: Comercio:
Cuartel Policial: Iglesias: Parques: Canchas y/o Play: Otros:

3- REFERENCIAS DEL SITIO

Fotografías de las calles a intervenir

Anexar imágenes de las calles donde se construirá aceras y/o contenes.

Suministra los datos de esta ficha de identificación,

Nombre completo de los técnicos:

Keby Ramon Tejeda T. CODIA 30581

Entidad: CODIA

Liga Municipal Dominicana

Fecha de la visita técnica:

28/6/2022

Valida y aprueba los datos suministrados,



H. gómez

Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 050202
REGIÓN: CIBAO NOROESTE
PROVINCIA: DAJABÓN
MUNICIPIO: LOMA DE CABRERA
DISTRITO MUNICIPAL: CAPOTILLO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de mayo de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Ramírez
 2. Arq. Keilin Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	ENTRADA AL DISTRITO MUNICIPAL				55.90	1		55.9
TRAMO B	ENTRADA AL DISTRITO MUNICIPAL				43.30	1		43.3
TRAMO C	ENTRADA AL DISTRITO MUNICIPAL				23.50	1		23.5
TRAMO D	ENTRADA AL DISTRITO MUNICIPAL				75.10	1		75.1
TRAMO E	ENTRADA AL DISTRITO MUNICIPAL				33.5	1		33.5
TRAMO F	ENTRADA AL DISTRITO MUNICIPAL				134.8	1		134.8
TRAMO G	ENTRADA AL DISTRITO MUNICIPAL	631.66	1.00	2	444.2	2	1263.32	888.4
TRAMO H	Entrada al Distrito Municipal		6.00		55.9	1		55.9
TRAMO I	Entrada al Distrito Municipal		6.00		43.3	1		43.3
TRAMO J	Entrada al Distrito Municipal		6.00		23.5	1		23.5
TRAMO K	Entrada al Distrito Municipal		6.00		75.1	1		75.1
TRAMO L	Entrada al Distrito Municipal		6.00		33.5	1		33.5
TRAMO M	Entrada al Distrito Municipal		6.00		134.8	1		134.8
Total							1263.32	1620.60

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,835,626.30
 Monto desembolsado RD\$ 2,835,626.30 (100%)
 Avance de obra 199.36%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de mayo de 2023

PROVINCIA: DAJABÓN

MUNICIPIO: LOMA DE CABRERA

DISTRITO MUNICIPAL: CAPOTILLO



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,263.32 metros cuadrados de aceras y 1,620.60 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Este distrito esta construyendo por contrato.
2. Ellos cuentan con la misma cantidad de contenes y aceras.
3. Los contenes y aceras construídos hasta la fecha cumplen con los criterios constructivos según las norr

IMÁGENES

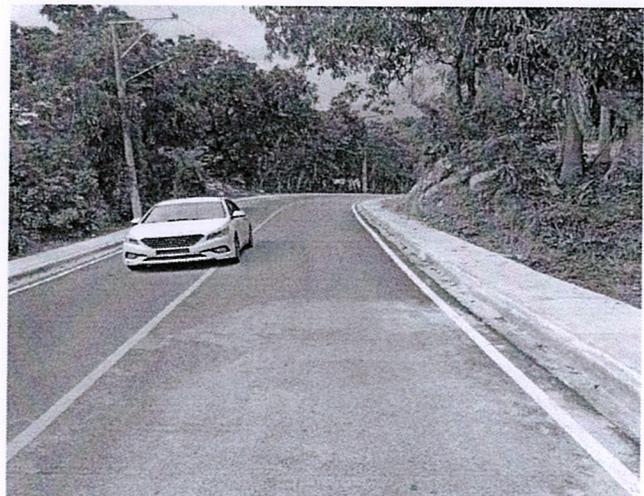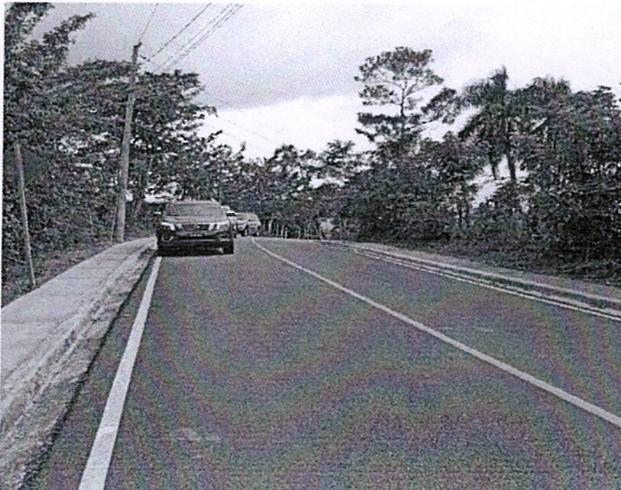





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

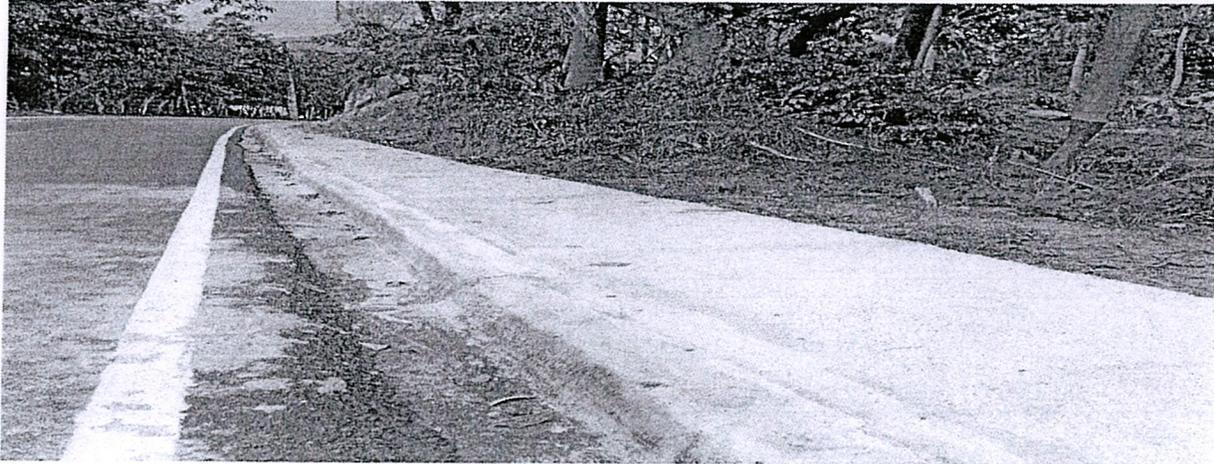

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ

Técnico



ARQ. KEILIN MORA

Técnico





**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: DAJABON

MUNICIPIO: LOMA DE CABRERA

DISTRITO MUNICIPAL: CAPOTILLO

BARRIO Y/O SECTOR:

CALLE 16 DE AGOSTO, CAPOTILLO

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
- b. Contratista

Razón Social JUNTA DISTRITAL DE CAPOTILLO
RNC ó Cédula: 430025852

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros:

CONSTRUCCON DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Calle 16 de agosto, Capotillo	19-415696,	-71-659623	19-413575	-71-663597	487	0.8	487	779.2	974
Tramo B										
Tramo C										
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										



5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El Alcalde quiere saber si con estos metros ya el proceso está culminado al 100%, aunque solo haya recibido el 50% de los fondos como avance.

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Anthony Isidro Almonk Lopez.

CÉDULA:

094-0023263-4

CODIA:

43 217

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

5 de Mayo del 2023.

Valida y aprueba los datos suministrados,

[Firma manuscrita]

Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



