



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 240402
REGIÓN: CIBAO SUR
PROVINCIA: SANCHEZ RAMÍREZ
MUNICIPIO: LA MATA
DISTRITO MUNICIPAL: LA BIJA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 21 de abril de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Richard Cabrera
2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (M)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	LA SOLEDA	187.32	1.00	1	136.80	1	187.32	136.8
TRAMO B		200.72	1.00	1	157.50	1	200.72	157.5
TRAMO C		761.50	1.00	1	761.50	1	761.5	761.5
Total							1149.54	1055.80

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,663,784.07
Monto desembolsado RD\$ 3,663,784.08 (100%)
Avance de obra 110.10%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO SUR
PROVINCIA: SÁNCHEZ RAMÍREZ
MUNICIPIO: LA MATA
DISTRITO MUNICIPAL: LA BIJA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24/04/2023



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,149.54 metros cuadrados de aceras y 1,055.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Se pudo observar una buena terminación en las aceras y contenes.
2. También pudimos observar las aceras cuentan con jardineras incluidas.

IMÁGENES

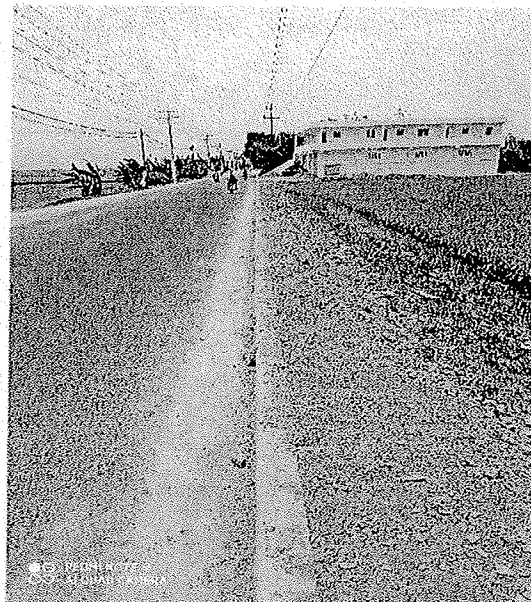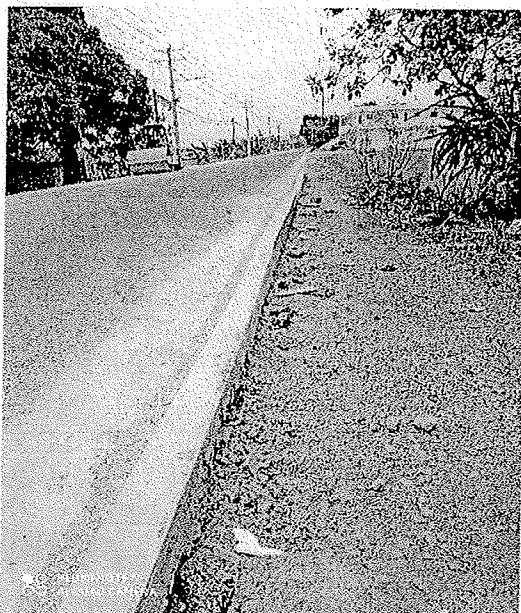



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA
Técnico

FELIPE REYES
Técnico

