



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

Santo Domingo, D.N.
29 de febrero de 2024


Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de avance de ejecución de obra de la ampliación de un
Cementerio en el Pino**

Tengo a bien dirigirme a usted con atención al informe presentado por el supervisor asignado a la ampliación de un cementerio en el municipio de el Pino, Luego de haber revisado cada detalle del mismo validamos que esta se encuentra en un avance del 60 % aproximadamente.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales

lunes, 5 de febrero de 2024

INFORME DE OBRA

1. LOCALIZACIÓN

Provincia	Dajabón
Municipio	El Pino
Distrito	N/A
Municipal	N/A
Barrio y/o sector	N/A

2. PROYECTO

Compra de terreno y construcción para la ampliación del cementerio el Pino.

3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA



LATITUD

19.441240

LONGITUD

71.478061

4. ALCANCE DEL PROYECTO

El Siguiete Proyecto Se Está Llevando A Cabo La Construcción de una ampliación Cementerio El Cual Está Ubicado En El Municipio el pino Provincia Dajabon Y Llevara Por Nombre cementerio el pino, El Mismo Constara Con Las Siguietes Características:

Compra de terreno, de 1,112.34 mt² de terreno al lado del cementerio existente, 41 nichos, remozamiento de 80.4 mt por 1.70 de altura de pared frontal del cementerio existente, construcción de 204.61 mt lineales de contenes y 204.61 mt cuadrados de acera frotada y violinada. un Baden en la puerta principal.

Corte, bote de capa vegetal y suministro de relleno con su compactación. Puerta frontal en hierro, jardinería.

Construcción De 206 mtl de muros de Bloques de hormigón 6" para la ampliación del nuevo terreno del cementerio con columnas de 0.15x0.30 cada 3.5 mt de separación, en total son 30 columnas. También incluye pañete y pintura de los muros.

5. CONDICIONES DEL TERRENO

El terreno era boscoso, por lo que se implementó el corte y tala de bosque para la limpieza del terreno y se colocó relleno de reposición.

6. INFORME DE AVANCE

El avance de dicha obra tiene un porcentaje de un 60% de su ejecución.

Reporte De Avance De Proyectos En Ejecución (Compra De Terreno Y Construcción Para La Ampliación Del Cementerio El Pino)

Actividades	
Cronograma de actividades	
1	Compra Del Terreno De La Ampliación Del Cementerio
2	Preliminares - Área General
3	Movimiento De Tierra Para Contén Y Aceras
4	Hormigón Simple Aceras 204.61 Mt Cuadrado
5	Hormigón Simple Contén 204.61 Mt Lineales
6	Jardinería
7	Instalaciones Sanitarias
8	Preliminares Verja Perimetral Cementerio, L=206 M, H=1.40 M
9	Movimiento De Tierra Verja Perimetral
10	Hormigón Armado 1:2:4 Verja Perimetral
11	Muros De Verja Perimetral
12	Terminación De Superficie Verja Perimetral
13	Pintura Verja Perimetral
14	Limpieza Final Verja Perimetral
15	Preliminares - Construcción De Badén - L=6.00x1.50m
16	Movimiento De Tierra Del Baden
17	Hormigón Ciclópeo Del Baden
18	Hormigón Armado Del Baden
19	Preliminares - Construcción De Nichos (41 Unds)
20	Movimiento De Tierra De Los Nichos
21	Hormigón Armado De Los Nichos
22	Muros De Bloques De Los Nichos
23	Terminación De Superficie De Los Nichos
24	Pintura De Los Nichos
25	Preliminares - Remozamiento De Cementerio Existente
26	Hormigón Simple En Remozamiento
27	Terminación De Superficie En Remozamiento
28	Pintura En Remozamiento
29	Herrería En Remozamiento


Reporte De Avance De Proyectos En Ejecución (Compra De Terreno Y Construcción Para La Ampliación Del Cementerio El Pino)

Actividades	% Pres.	Avance % Pres.	Status
Compra Del Terreno De La Ampliación Del Cementerio	32.0%	32.0%	
Preliminares - Área General	7.2%		
Movimiento De Tierra Para Contén Y Aceras	4.0%		
Hormigón Simple Aceras 204.61 Mt Cuadrado	6.0%		
Hormigón Simple Contén 204.61 Mt Lineales	6.0%		
Jardinería	1.2%		
Instalaciones Sanitarias	0.2%		
Preliminares Verja Perimetral Cementerio, L=206 M, H=1.40 M			
Movimiento De Tierra Verja Perimetral	0.7%	0.7%	
Hormigón Armado 1:2:4 Verja Perimetral	8.7%	8.7%	
Muros De Verja Perimetral	5.4%	5.4%	
Terminación De Superficie Verja Perimetral	7.1%	7.1%	
Pintura Verja Perimetral	2.9%	1.4%	en ejecución
Limpieza Final Verja Perimetral	0.1%	0.1%	
Preliminares - Construcción De Badén - L=6.00x1.50m			
Movimiento De Tierra Del Baden	0.1%		
Hormigón Ciclópeo Del Baden	0.1%		
Hormigón Armado Del Baden	0.3%		
Preliminares - Construcción De Nichos (41 Unds)	0.0%		
Movimiento De Tierra De Los Nichos	0.1%		
Hormigón Armado De Los Nichos	5.1%		
Muros De Bloques De Los Nichos	3.3%		
Terminación De Superficie De Los Nichos	4.2%		
Pintura De Los Nichos	0.4%		
Preliminares - Remozamiento De Cementerio Existente			
Hormigón Simple En Remozamiento	0.5%	0.5%	
Terminación De Superficie En Remozamiento	3.6%	3.6%	
Pintura En Remozamiento	0.5%	0.1%	en ejecución
Herrería En Remozamiento	0.2%	0.2%	

100.00% 60%

7. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS




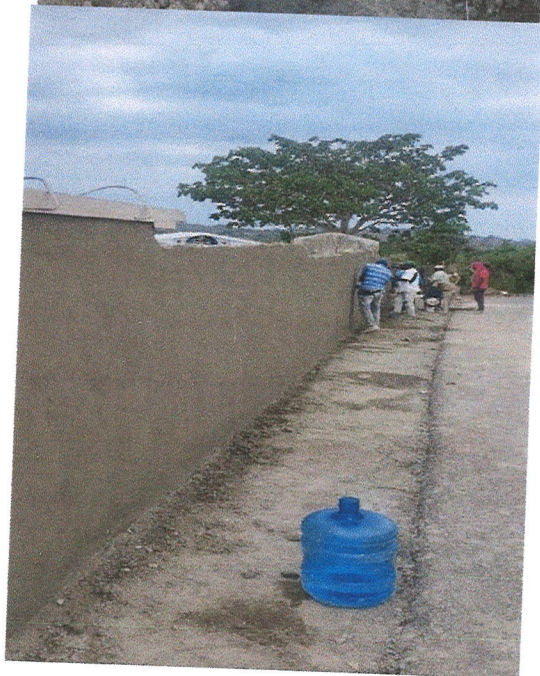



7. OBSERVACIONES

8. SUMINISTRADO Y VALIDADO POR:



ANTHONY ISIDRO ALMONTE LÓPEZ
Codia: 43217
Cedula: 094-0023263-4
SUPERVISOR



NELSON DARIO PEÑA LANTIGUA
ALCALDE
