



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

Santo Domingo, D.N.
27 de mayo del 2025

Al:

Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planearquitectura y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía:

Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho



Asunto:

Remisión de informe de Cierre de Pedernales

En la visita técnica realizada el 23 de junio del 2022 se validó la ejecución de 1443.10 metros cuadrados de aceras y 1104.55 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del "Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales".

La supervisión externa ha validado la ejecución de 1878.10 metros cuadrados de aceras y 1898.70 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 3,321.24 metros cuadrados de aceras y 3003.25 metros lineales de contenes, lo que corresponde al 100 % o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,

Elizabeth García Valera
Técnico

Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL
-DOMINICANA-

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 160101
REGIÓN: ENRIQUILLO
PROVINCIA: PEDERNALES
MUNICIPIO: PEDERNALES
DISTRITO MUNICIPAL: -
FECHA DE VISITA TÉCNICA: 22 de mayo de 2025
TÉCNICOS:
1. Ing. Ana Indhira Rámites

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD DE CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	sector guayaacanes calle 3era	90.00	1.00	2	90.00	2	180	180
TRAMO B	Casco Urbano Calle 27 de febrero empezando en la esquina Juan Iopez (esta comunica al mercado binacional) lado derecho	890.10	1.00	1	890.10	1	890.1	890.1
TRAMO C	Casco Urbano Calle 27 de febrero empezando en la esquina Juan Iopez (esta comunica al mercado binacional) lado izquierdo	808.00	1.00	1	828.60	1	808	828.6
TRAMO D								
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							1878.10	1898.70

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 1,939,291.63
Monto desembolsado RD\$ 969,645.82 (50%)
Avance de obra 376.20%

LEVANTAMIENTO DE INSPECCION 22-5-2025

Av. Jiménez Moya, Esq. Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, Apartado Postal No. 1471, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.:809-533-3686



LIGA MUNICIPAL -DOMINICANA-

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: PEDERNALES

MUNICIPIO: PEDERNALES

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 22 de mayo de 2025



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,878.10 metros cuadrados de aceras y 1,898.70 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. Este Municipio esta construyendo por contrato.
2. Ya cumplio con el monto estimado a construir en dicho territorio, esta obra esta ejecutada al 100%.
3. La plantilla utilizada coincide con la recomendada por la LMD.

IMÁGENES

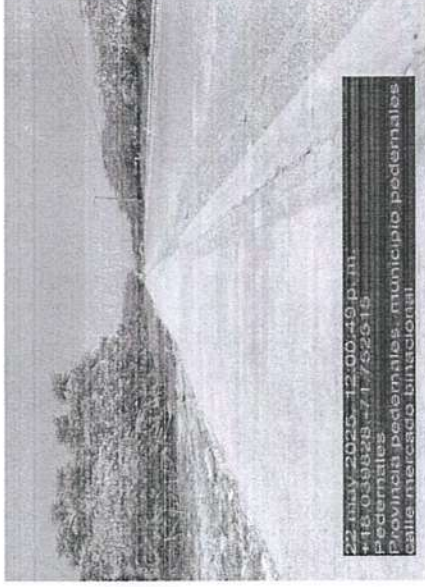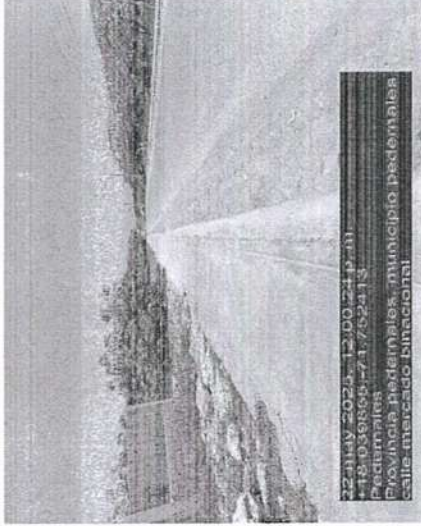



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

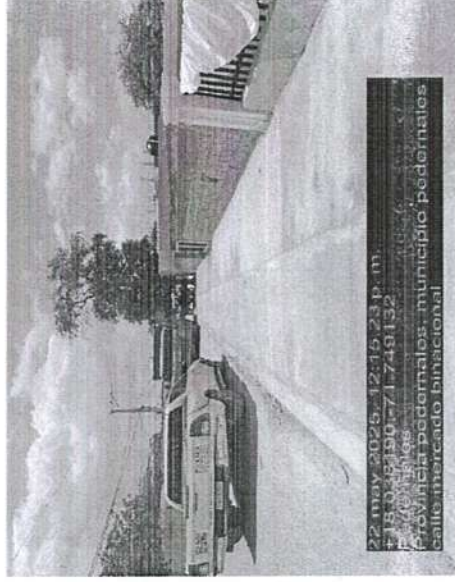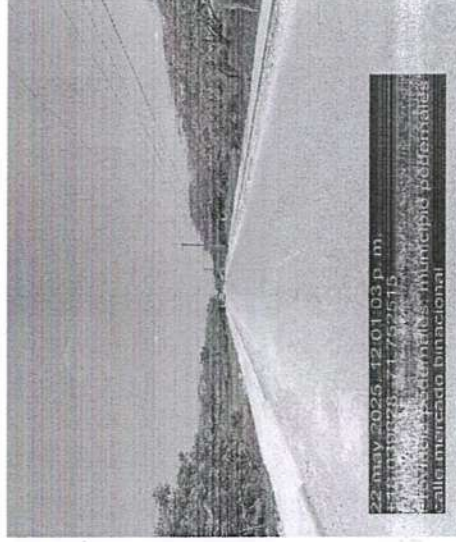

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ

Técnico

Técnico

Técnico



LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 160101
REGIÓN: ENRIQUILLO
PROVINCIA: PEDERNALES
MUNICIPIO: PEDERNALES
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 23/6/2022

TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Rámirez
2. Elisabeh Aguilera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Av. Libertad	128.70	1.40	2	128.70	2	360.36	257.7
TRAMO B	Av. Libertad	66.00	1.45	1	66.00	1	95.7	66
TRAMO C	Av. Libertad	142.50	1.15	1	142.50	1	163.875	142.5
TRAMO D	Av. Libertad	46.30	1.15	1	46.3	1	53.245	46.3
TRAMO E	Av. Libertad	44.50	1.30	1	44.5	1	57.85	44.5
TRAMO F	Av. Libertad	165.30	1.50	1	165.3	1	247.95	165.3
TRAMO G	C/ Segunda	35.55	1.39	1	35.55	1	49.4145	35.55
TRAMO H	C/ Rosendo Perez	86.00	1.00	1	14.3	1	86	14.3
TRAMO I	C/ 1er Abril - C/ Segunda	53.10	1.30	1	53.1	1	69.03	53.1
TRAMO J	Calle M	35.70	0.80	1	35.7	1	28.56	35.7
TRAMO K	C/ Socrates Nolasco	56.10	0.77	1	56.1	1	43.197	56.1
TRAMO L	C/ Socrates Nolasco	39.60	0.95	2	47.4	2	75.24	54.8
TRAMO M	C/ Socrates Nolasco	40.90	1.10	1	40.9	1	41.59	40.9
TRAMO N	Calle 13 de Marzo	52.10	1.30	1	52.1	1	67.73	52.1
Total							1443.14	1104.55

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,188,920.26
Monto desembolsado RD\$ 4,188,920.26 (100%)
Avance de obra 111.91%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 23/6/2022

PROVINCIA: PEDERNALES

MUNICIPIO: PEDERNALES

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,443.14 metros cuadrados de aceras y 1,104.55 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.


NOTAS

1. Este Municipio está construyendo por contrato.
2. Ya cumple con el monto estimado a construir en dicho territorio, esta obra esta ejecutada al 100%.
3. La plantilla utilizada coincide con la recomendada por la LMD.

IMÁGENES



Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RAMÍREZ

Técnico


EUSEBIT AGÜILLERA

Técnico

