



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 140201

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

MUNICIPIO: CABRERA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de octubre de 2022

1. Arq. Zunilda Del Rosario

TÉCNICOS: 2. Ing. Félix Tavárez

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CARRETERA PRINCIPAL FRENTE AL PARADOR FOTOGRÁFICO CERCA DE LA PLAYA	1,491.20	1.00	2	1,474.60	1	2982.4	1474.6
TRAMO B								
TRAMO C								
TRAMO D								
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							2982.40	1474.60

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,056,714.35

Monto desembolsado RD\$ 4,056,714.35 (100%)

Avance de obra 194.60%





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de octubre de 2022

PROVINCIA: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

MUNICIPIO: CABRERA

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 2,982.40 metros cuadrados de aceras y 1,474.60 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. La calidad de las aceras no se encuentran muy apreciables, ya que esta por las fotos anexas pueden ver que teniendo ya 8 meses de construida estan muy deterioradas.


IMÁGENES

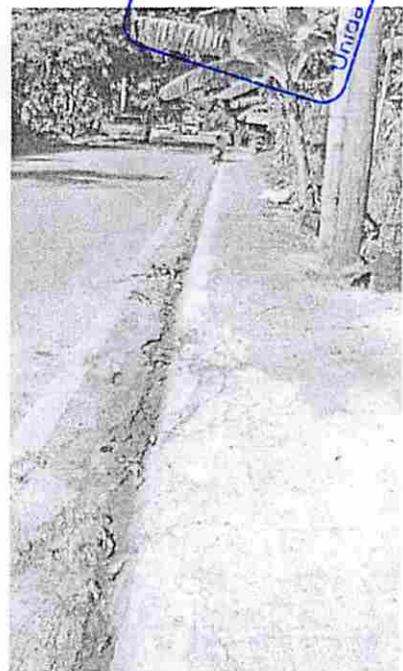

CONTRALORIA
C 1 FEB 2024
Unidad Ejecutiva



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

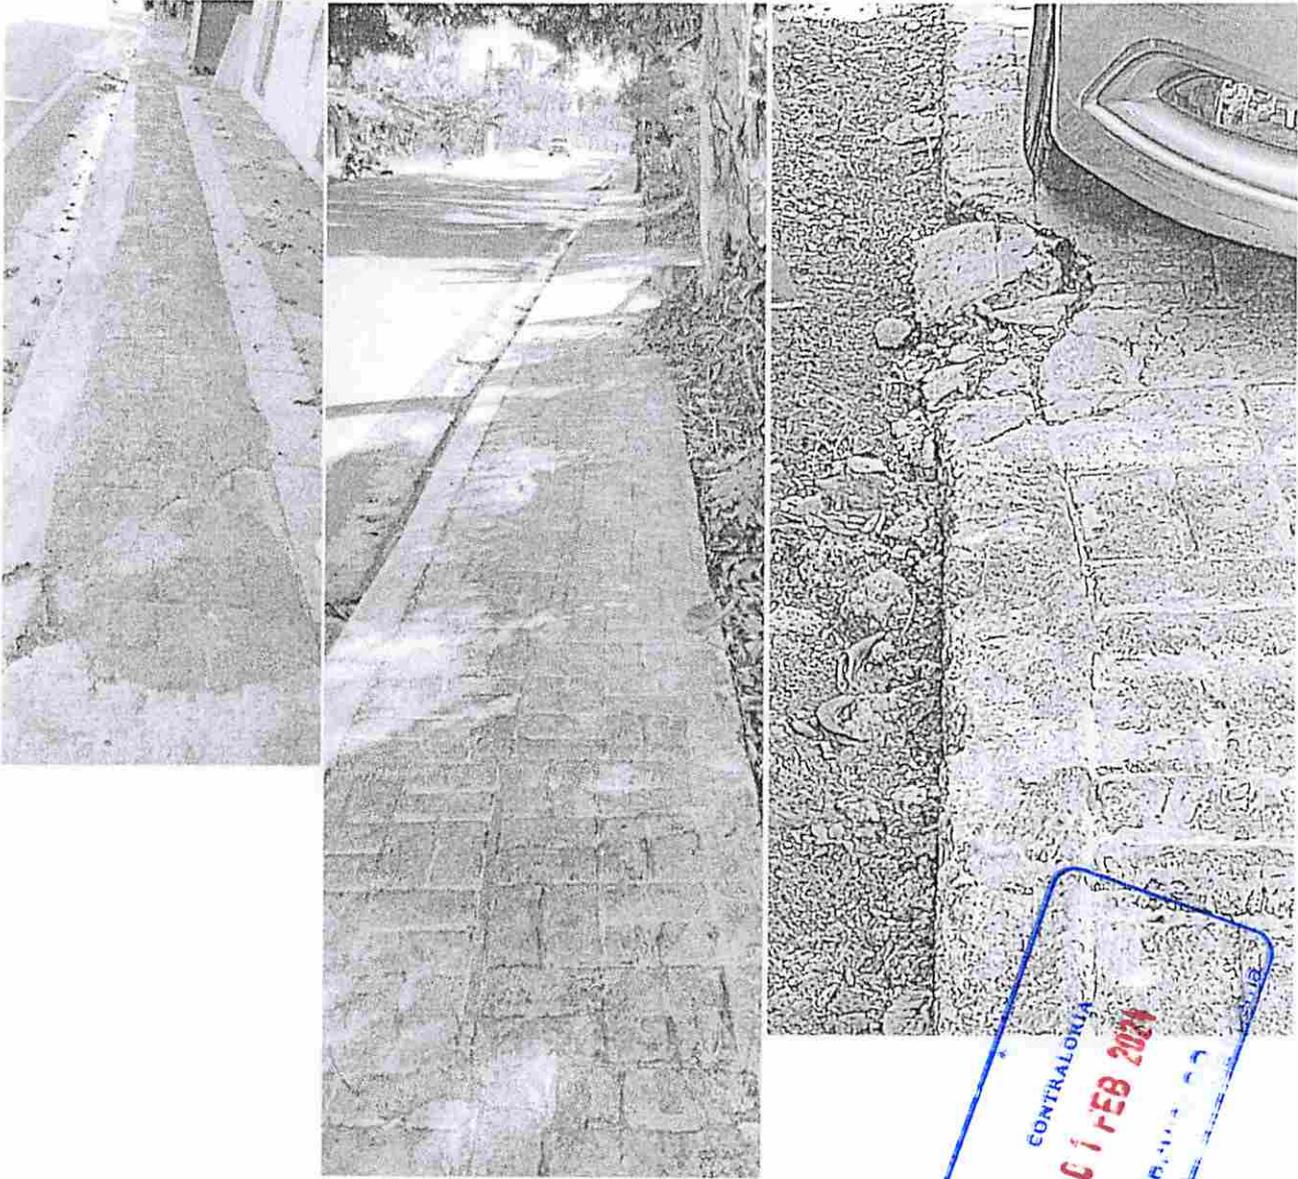



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

Suministra los datos de este reporte,

Zunilda Del Rosario G.

ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO

Técnico

Félix Tavárez

ING. FÉLIX TAVÁREZ

Técnico

