

Santo Domingo, D.N.
17 de octubre de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución de Monte plata.**




En la visita técnica realizada el 04 de octubre de 2022 se validó la ejecución de 2,164.60 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 1,480.7 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia que se ha ejecutado 3,645.3 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.


Nota: El gobierno local decidió construir sólo contenes para impactar más comunidades, rendir los fondos y aprovechar el programa de asfaltado.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales





LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 290101

REGIÓN: HIGUAMO

PROVINCIA: MONTE PLATA

MUNICIPIO: MONTE PLATA


DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de octubre de 2022

1. Ing. Asamín Ferreras

TÉCNICOS: 2. Ing. Félix Tavárez

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE 1				187	2		374
TRAMO B	CONT. CALLE 1				59.7	2		119.4
TRAMO C	CALLE 2				42.4	2		84.8
TRAMO D	CONT. CALLE 2				40	2		80
TRAMO E	CALLE 3				150.1	2		300.2
TRAMO F	CONT. CALLE 3				150.1	2		300.2
TRAMO G	CALLE 4				189.5	2		379
TRAMO H	CONT. CALLE 4				122	2		244
TRAMO I	CALLE 5				69.5	2		139
TRAMO J	CALLE PRINCIPAL				72	2		144
Total							0.00	2164.60

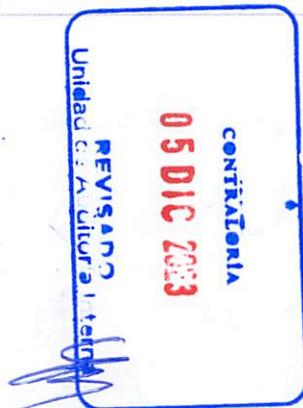


AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 5,447,208.17

Monto desembolsado RD\$ 2,723,604.09 (50%)

Avance de obra 100.61%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: HIGUAMO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de octubre de 2022

PROVINCIA: MONTE PLATA

MUNICIPIO: MONTE PLATA

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 2,164.60 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS






1. Solo se construyeron contenes, con el fin de aprovechar el programa de asfaltado.
2. La modalidad de ejecución es vía gobierno local.

IMÁGENES

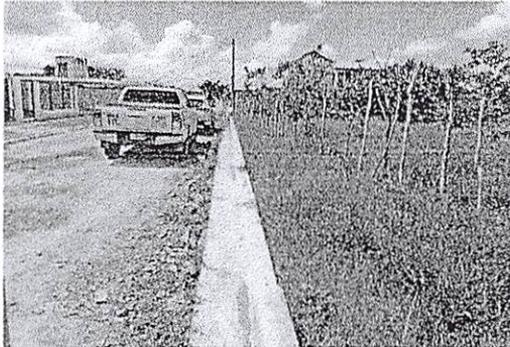




LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

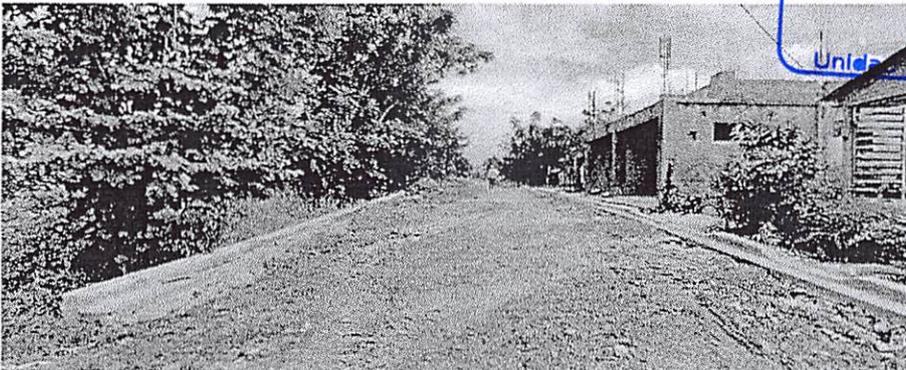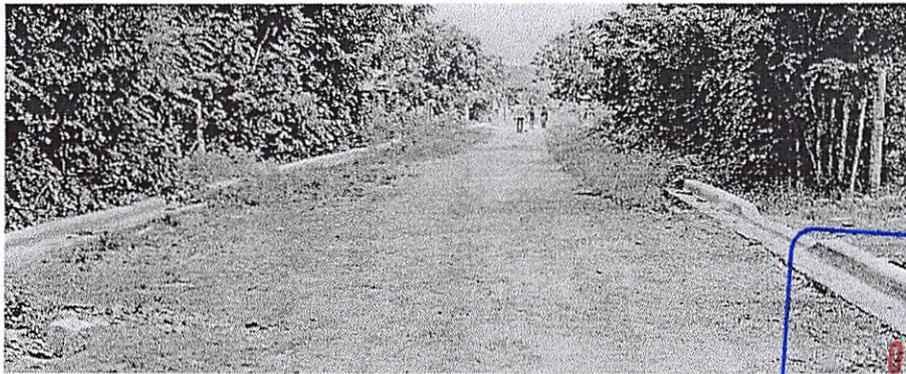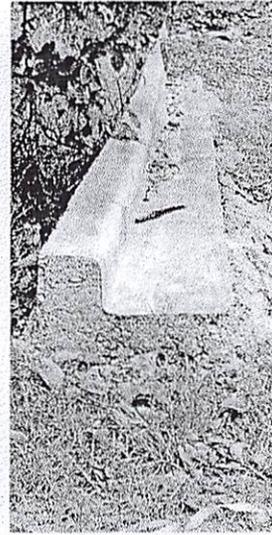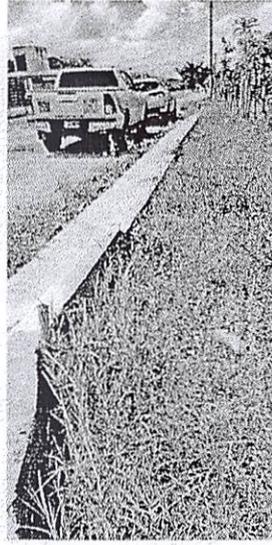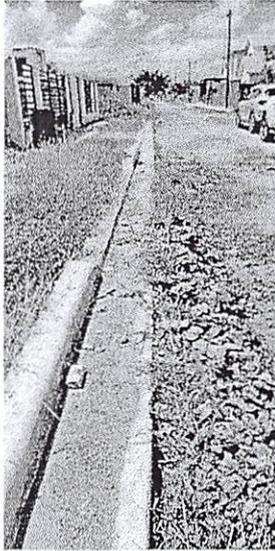




LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

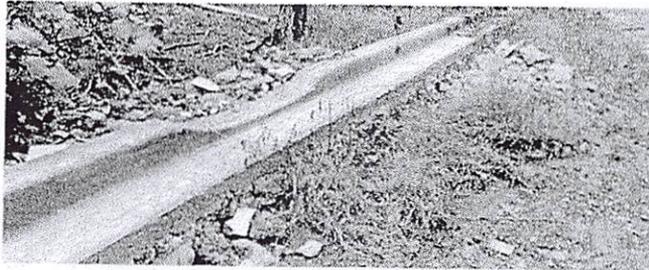

Suministra los datos de este reporte,


ING. ASAMÍN FERRERAS

Técnico


ING. FÉLIX TAVÁREZ

Técnico



PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO ✓

PROVINCIA: MONTE PLATA
MUNICIPIO: MONTE PLATA
DISTRITO MUNICIPAL:
BARRIO Y/O SECTOR:
LA LUISA BLANCA

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)


- a. Gobierno Local
b. Contratista

Razón Social: CONSTRUCTORA CAMILA
RNC ó Cédula: 131201131

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes: X ✓
b. Incluye demoliciones de tramos: X
c. Incluye badenes:
d. Otros:

CONSTRUCCION DE CONTENES



4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	S/N.	18.737062	-69.895560	18.739132	-69.897185	-	-	899.70	-	899.70
Tramo B	Barranca del Estero	18.811029	-69.778901	18.811155	-69.778360	-	-	581.00		581.00
Tramo C										
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

REVISADO
 Unidad Ejecutiva de Planeación
 05 DIC 2023
 CONTADORIA

$\Sigma = 1,480.7$

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.



Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Señor E. Henriquez D.

CÉDULA:

001-1022649-5

CODIA:

21125

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

09/10/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,

Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal





La Luisa Blanca




La Luisa Blanca



Centro de la ciudad



Centro de la ciudad

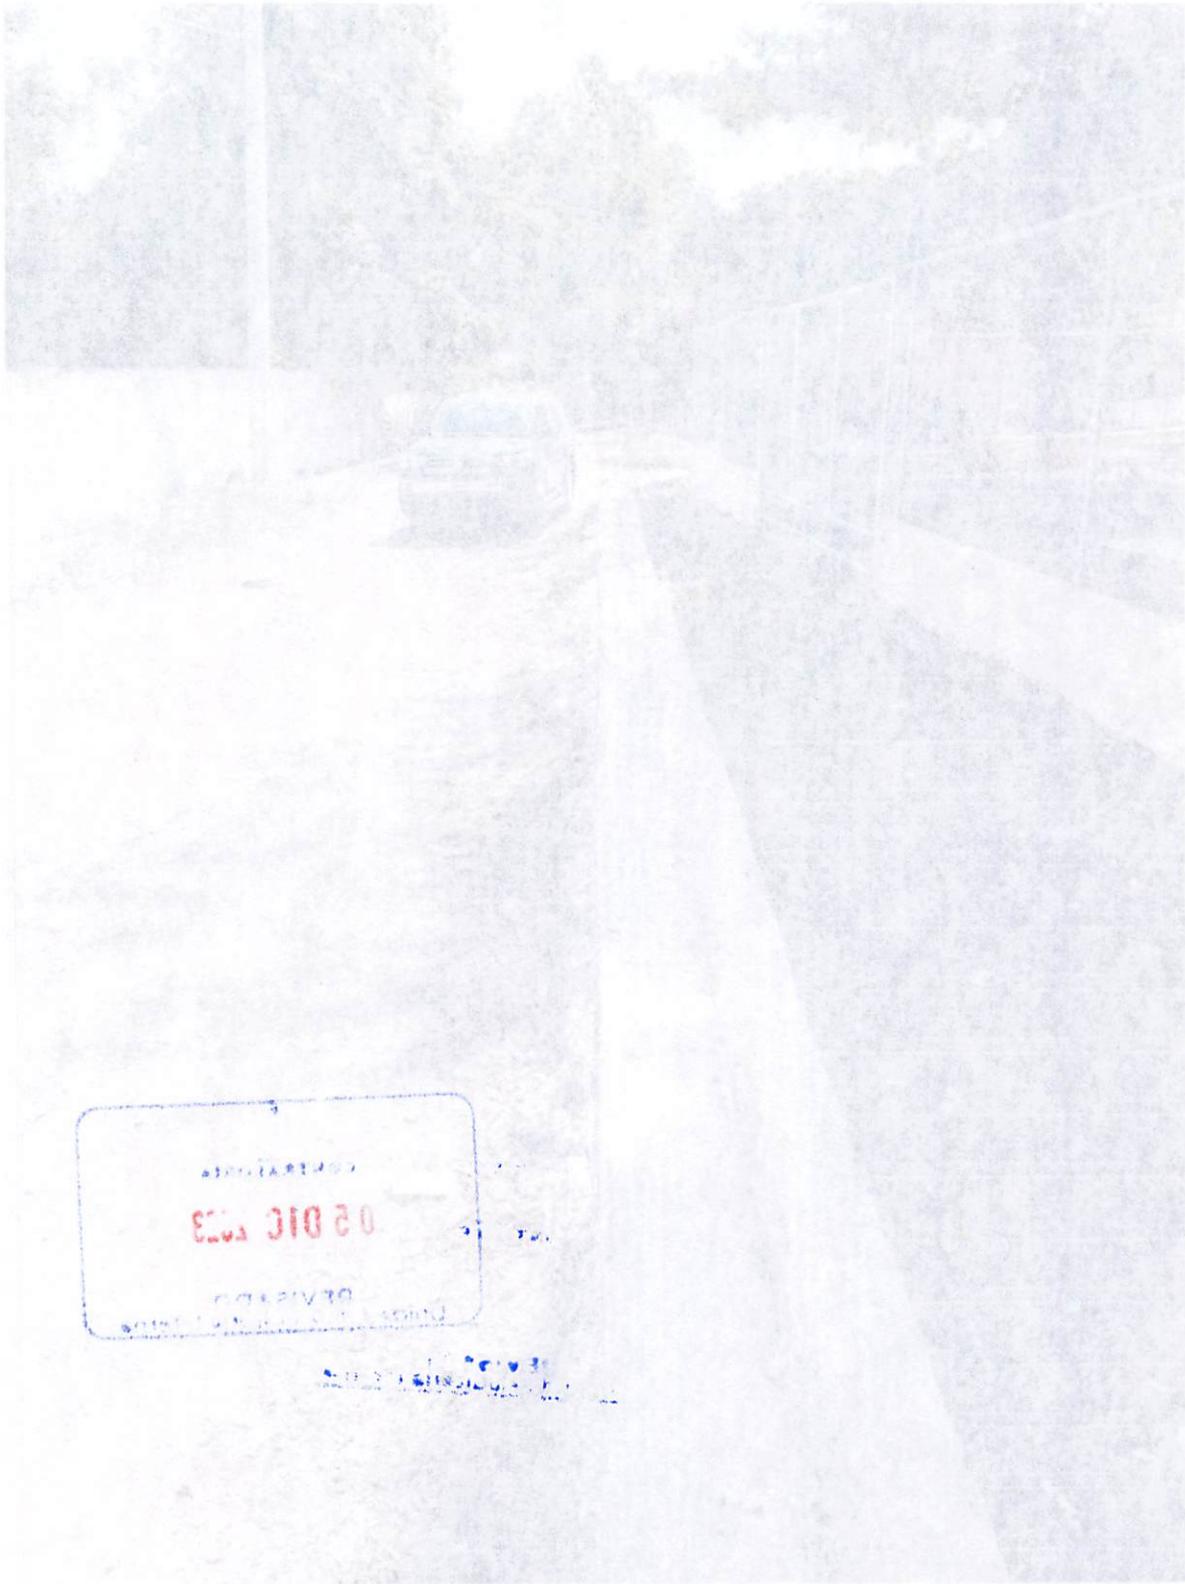

CONTRATO
02 DIC 2023
DIRECCIÓN DE...

Centro de la ciudad



Centro de la ciudad




CONTRATORIA
05 DIC 2023
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

centro de la ciudad



La Luisa Blanca

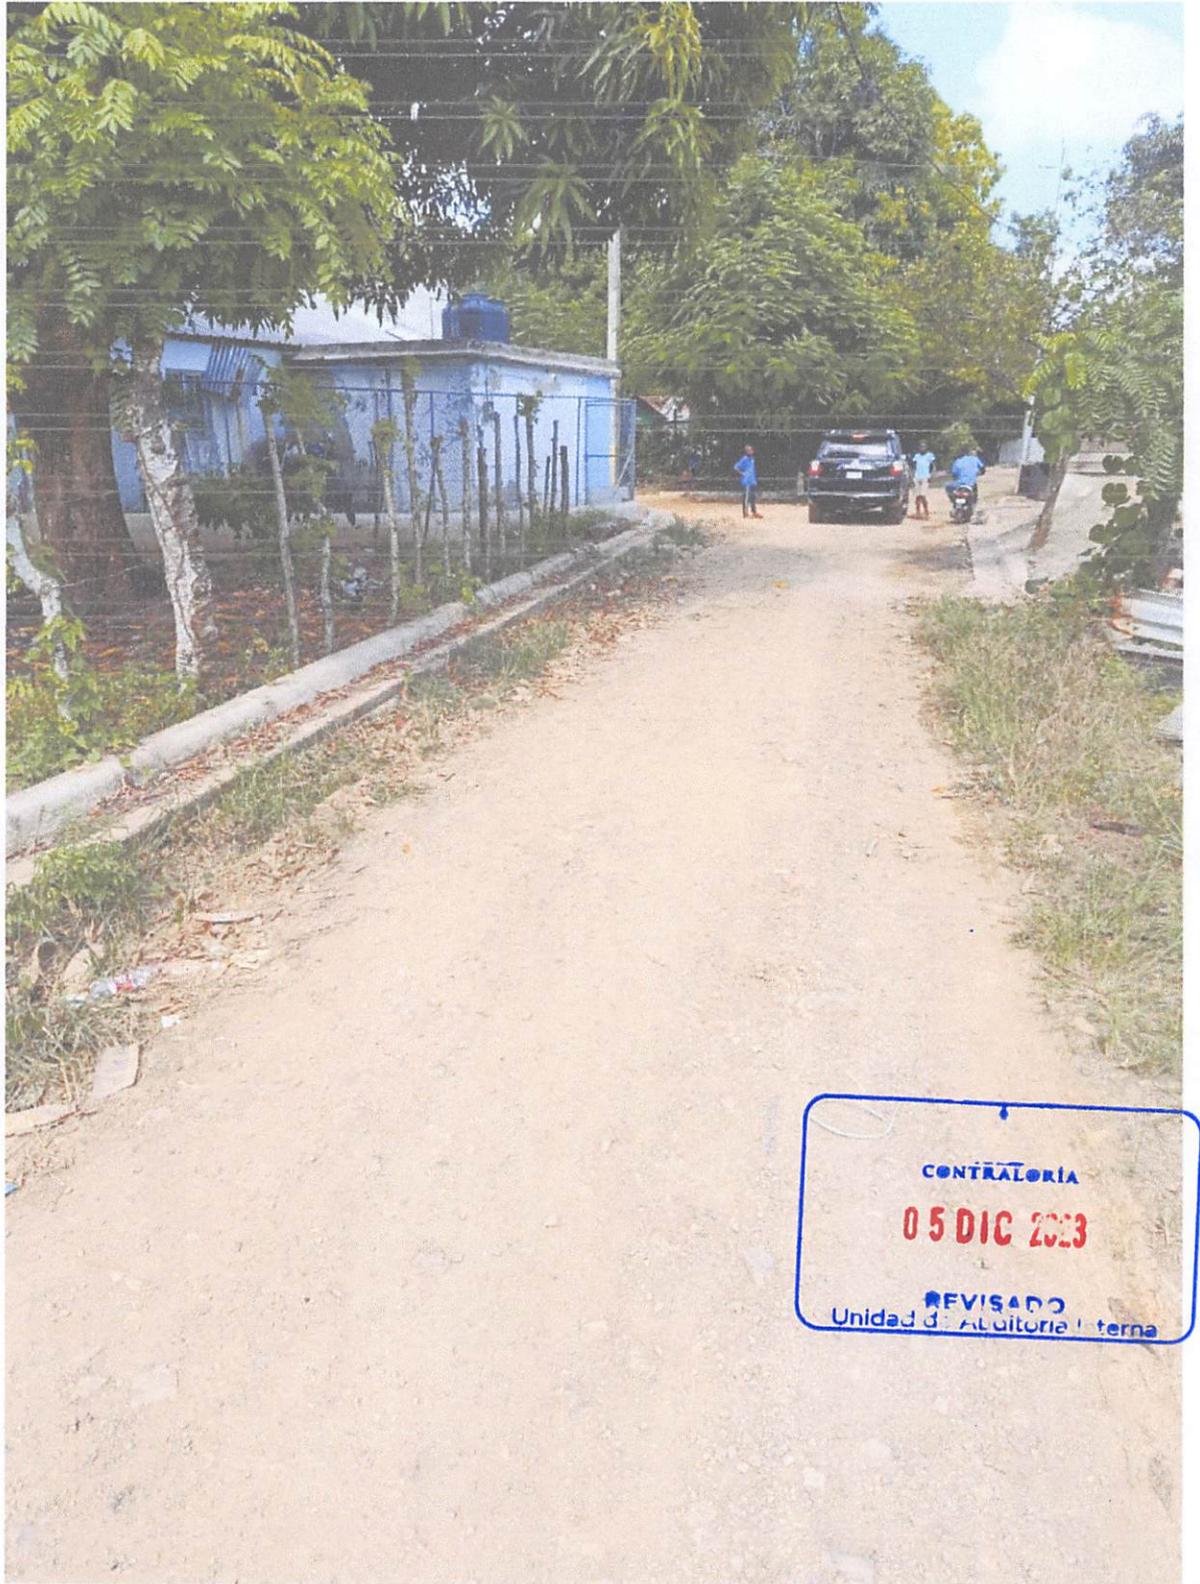

CONTRALORIA
05 DIC 2023
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

La Luisa Blanca



La Luisa Blanca
