

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

3ER COMPONENTE

REPORTES DE AVANCE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: DUARTE
 MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE MACORIS
 DISTRITO MUNICIPAL: N/A
 BARRIO Y/O SECTOR:

MAMA TINGO 2,VISTA AL VALLE,SECTOR OLIMPIA,BARRIO
 LINDO,HATILLO,MANHATTAN, VISTA AL VALLE,LOS JARDINES 2,SALVADOR
 THEN,Y THEN 2

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
 b. Contratista

Razón Social	CONSTRUCTORA FEES
RNC ó	SRL/1-3121636-6
Cédula:	BO MANHATTAN,BO LINDO,HATILLO,VISTA AL VALLE

NAZARET DISLA	ZUNILDA AMARILIOS
VELEZ/05600907421	CARVAJAL/05600843675
MAMA TINGO2,VISTA AL VALLE,SECTOR OLIMPIA	LOS JARDINES2,SALVADOR THEN,THEN 2

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
 b. Incluye demoliciones de tramos:
 c. Incluye badenes:
 d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	CALLE S/N EN MANHATTAN	365354	2136440	365364	2136599	160.00	1.00	160.00	308.00	308.00
Tramo B	BARRIO LINDO, HATILLO									
Tramo C	CALLE S/N	364266	2136063	364241	2135996	77.00	0.80	77.00	90.00	117.00
Tramo D	CALLE S/N	364244	2135992	364194	2136000	51.00	0.80	51.00	65.00	84.00
Tramo E	CALLE S/N	364194	2136000	364203	2136046	47.00	0.80	47.00	67.00	87.00
Tramo F	CALLE S/N	364184	2136053	364242	21360637	47.00	0.80	47.00	45.00	47.00
Tramo G	SECTOR SALVADOR THEN									
Tramo H	CALLE S/N	364905	2136210	365830	2136188	108.00	0.50	108.00	108.00	206.00
Tramo I	CALLE S/N	364996	2136182	364933	2136183	62.00	0.50	62.00	62.00	124.00
Tramo J	LOS JARDINES II									
Tramo K	CALLE S/N	367869	2136735	367992	2136516	265.00	1.00	265.00	510.00	515.00
Tramo L	CALLE S/N	367936	2137174	367887	2137110	78.00	1.00	78.00	164.00	167.00

Σ = 2,394.6
Σ = 2,149.99

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m ²)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M	CALLE S/N	367887	2137110	367908	2137102	23.00	1.00	23.00	20.00	20.00
Tramo N	MAMA TINGO II									
Tramo O	CALLE S/N	365993	2136193	365985	2136319	144.90	1.00	144.90	259.00	251.00
Tramo P	CALLE S/N	365983	2136287	365994	2136286	9.80	0.95	9.80	9.31	9.80
Tramo Q	CALLE S/N	365979	2136303	365945	2136308	32.20	1.00	32.20	62.90	62.90
Tramo R	CALLE S/N	365948	2136316	365956	2136377	62.40	1.00	62.40	124.50	120.50
Tramo S	CALLE S/N	365973	2136380	365947	2136386	26.70	1.00	26.70	55.00	52.00
Tramo T	CALLE S/N	365940	2136373	365950	2136400	22.50	1.00	22.50	22.50	20.50
Tramo U										
Tramo V	SECTOR OLIMPIA									
Tramo W	CALLE S/N SECTOR OLIMPIA	367169	2136122	367280	2136213	145.60	1.00	145.60	145.60	145.60
Tramo X	CALLE S/N SECTOR OLIMPIA	367155	2136097	367177	2136069	34.70		34.70	32.18	57.30

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 1.-LA FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE SOLO FUE POSIBLE CON LA CONDICION DE QUE SE LE PERMITIERA COLOCAR, EN LA PÁGINA DE LA FIRMA, LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL AYUNTAMIENTO.
- 2.-ESTE AVANCE DEL APORTE FUE DISTRIBUIDO EN SEIS SECTORES DIFERENTES CON TRES CONTRATISTAS, CADA UN CON DOS OBRAS.
- 3.-LAS CALLES EN ESTOS SECTORES NO TIENEN NOMBRE AUN

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.


SECTOR OLIMPIA



MAMA TINGO 2



MANHATTAN

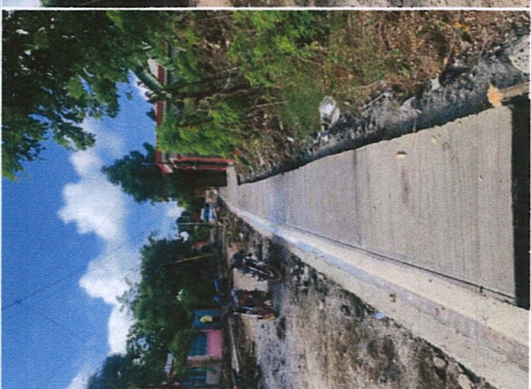

BARRIO LINDO, HATILLO





SALVADOR THEN



En Resumen, se Construyeron:


- Un total de 202.90 ml de Contenes y 177.78 Mt2 de Aceras en el sector Olimpia.
- Un total de 536.72 ml de Contenes y 553.21 Mt2 de Aceras en el sector Mamá Tingó.
- Un total de 682 ml de Contenes y 674 Mt2 de Aceras en el sector Los Jardines Segunda Etapa.
- Un total de 330 ml de Contenes y 170 Mt2 de Aceras en el sector Salvador Then y Then Segunda Etapa.
- Un total de 335 ml de Contenes y 267 Mt2 de Aceras en el sector Barrio Lindo Hatillo.
- Un total de 308 ml de Contenes y 308 Mt2 de Aceras en el sector Manhattan de Vista al Valle.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

JULIO CESAR MUÑOZ-MINIER

FIRMA:



CÉDULA:

056004007-2


CODIA:

8831

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

30/10/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,



Firma y sello

SIQUIO AUGUSTO NG DE LA ROSA
Alcaldía Municipal
