



# LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 170201  
**REGIÓN:** VALDESIA  
**PROVINCIA:** PERAVIA  
**MUNICIPIO:** NIZAO  
**DISTRITO MUNICIPAL:** -

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 2 de junio de 2023

**TÉCNICOS:** 1. Ing. Danilo Mercado  
 2. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m <sup>2</sup> )	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	ESQ. CALLE MELLA DE LOS BOMBERO	10.30	0.83	1.00	93.10	2.00	8.55	186.20
TRAMO B	ZONA COLEGIO SALVADOR				74.80	2.00		149.60
TRAMO C	ZONA COLEGIO SALVADOR				41.20	2.00		82.40
TRAMO D	ZONA DE CARLITO				104.70	2.00		209.40
TRAMO E	ZONA DE CARLITO				20.00	2.00		40.00
TRAMO F	ZONA LA POLLERA				112.30	2.00		224.60
TRAMO G	ZONA LA POLLERA				89.90	2.00		179.80
TRAMO H	ZONA LA POLLERA				60.10	2.00		120.20
TRAMO I	ZONA PROFESOR JUAN				101.60	2.00		203.20
TRAMO J	ZONA PROFESOR JUAN				120.20	2.00		240.40
TRAMO K	C/ 1 ERA(SANTO MP)				119.40	2.00		238.80
TRAMO L	RESP. MELLA				113.20	2.00		226.40
TRAMO M	SECTOR LA MINA				171.20	2.00		342.40
TRAMO N	SECTOR PICUA				106.50	2.00		213.00
TRAMO O	LAS TRES VIAS	135.00	1.09	1.00			146.61	
TRAMO P	LAS TRES VIAS	29.60	0.86	1.00			25.46	
TRAMO Q	LAS TRES VIAS	14.10	0.44	1.00			6.13	
TRAMO R	LAS TRES VIAS	90.20	0.95	1.00			85.69	
TRAMO S	ZAPOTAL				150.00	2.00		300.00
<b>Total</b>							<b>272.44</b>	<b>2,956.40</b>


## AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,042,506.82  
 Monto desembolsado RD\$ 2,021,253.42 (50%)  
 Avance de obra 196.87%



LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —





# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 2 de junio de 2023

PROVINCIA: PERAVIA

MUNICIPIO: NIZAO

DISTRITO MUNICIPAL: -

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 272.44 metros cuadrados de aceras y 2,956.40 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

## NOTAS


1. Este distrito ejecutó por administración.
2. Esta obra cumple con los estándares de calidad recomendado por el programa.

## IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

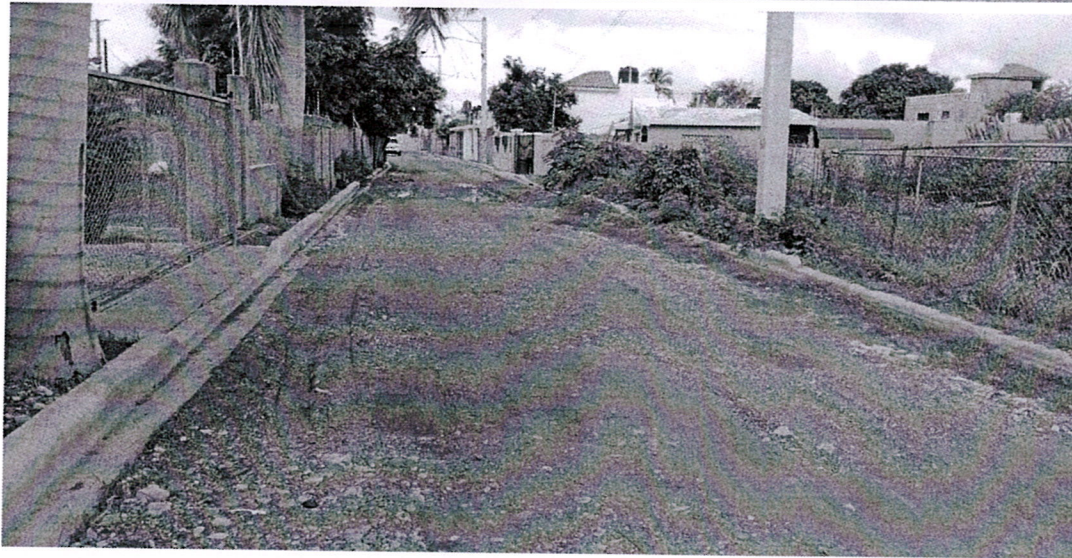

Suministra los datos de este reporte,

  
ING. DANILLO MERCADO  
Técnico

  
ING. STAYLIN MENDOZA  
Técnico
