



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 020301

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: LAS YAYAS DE VIAJAMA

DISTRITO MUNICIPAL: ~~LA VILLA~~

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 30 de mayo de 2023

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	VIAJOMA	55.10	1.00	2.00	55.10	2.00	110.20	110.20
TRAMO B	VIAJOMA C/ B	393.40	1.00	1.00	441.30	1.00	393.40	441.30
TRAMO C		64.00	1.00	1.00	64.00	1.00	64.00	64.00
TRAMO D	VIETNAM FRANC. CAAMAÑO	133.70	1.00	2.00	133.70	2.00	267.40	267.40
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							835.00	882.90

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,296,123.67

Monto desembolsado RD\$ 1,648,061.84 (50%)

Avance de obra 101.57%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 30 de mayo de 2023

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: LAS YAYAS DE VIAJAMA

DISTRITO MUNICIPAL: -



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 835.00 metros cuadrados de aceras y 882.90 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. Este gobierno local esta ejecutando esta obra por contrato
2. Estas aceras y contenes cumplen con los estandares recomendados por la LMD

IMÁGENES

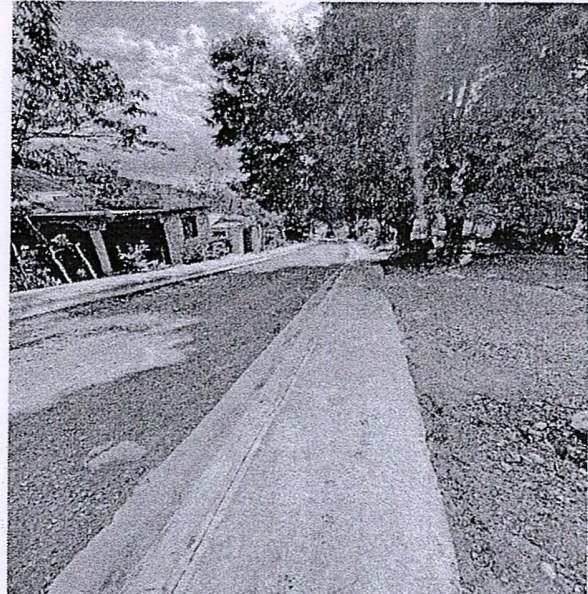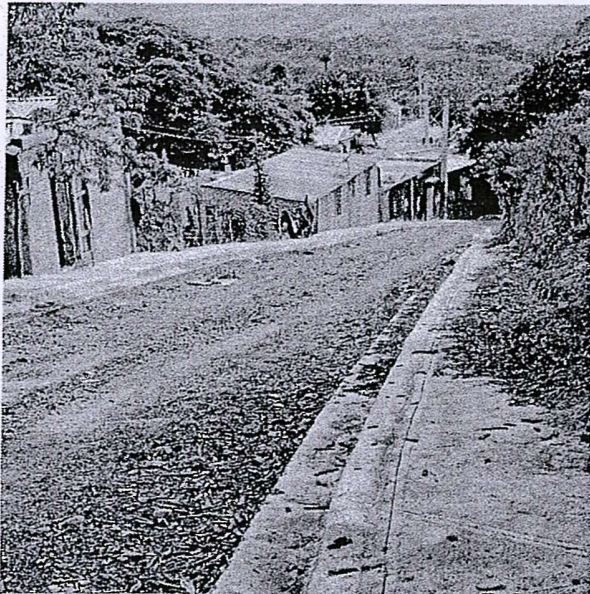




LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

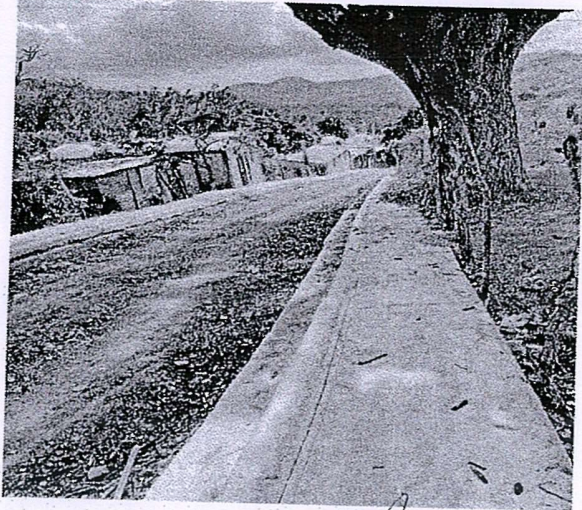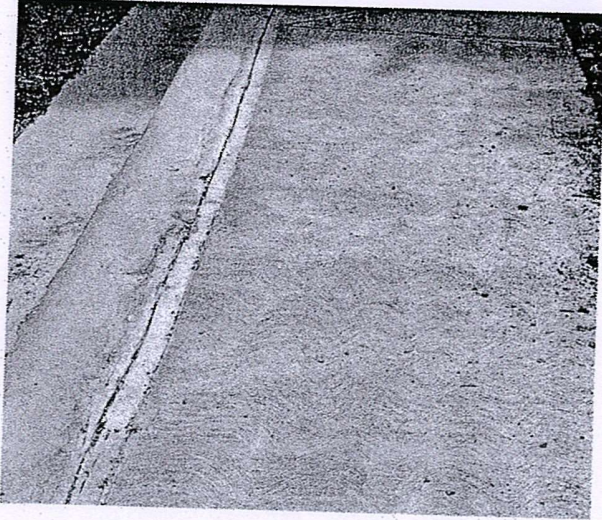

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico


CESAR DE LOS SANTOS
Técnico

