



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE AVANCE DE OBRA

CODIGO: 050201

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

PROVINCIA: DAJABÓN

MUNICIPIO: LOMA DE CABRERA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 9 de febrero de 2023

1. Ing. Edward Acosta

TÉCNICOS: 2. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/PRIMERA	153.00	1.41	1	299.50	1	215.735	299.5
TRAMO B	C/SEGUNDA	52.20	1.18	1	104.40	1	61.76	104.4
TRAMO C	C/TERCERA				199.60	1		199.6
TRAMO D	C/PROYECTO				138.4	1		138.4
TRAMO E	C/PROYECTO 2				183.2	1		183.2
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							277.50	925.10

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,787,964.36

Monto desembolsado RD\$ 3,787,964.36 (100%)

Avance de obra 70.68%



**LIGA MUNICIPAL  
DOMINICANA**

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN: CIBAO NOROESTE**

**FECHA DE VISITA TÉCNICA: 9 de febrero de 2023**

**PROVINCIA: DALABÓN**

**MUNICIPIO: LOMA DE CABRERA**


**DISTRITO MUNICIPAL: -**

**INFORME DE AVANCE DE OBRA**


A la fecha de 09/02/2023 se ha ejecutado 277.50 metros cuadrados de aceras y 925.10 metros lineales de contén, lo que corresponde al 70.68% del fondo asignado para este territorio.

**NOTAS**


1. Hasta la fecha de la visita, se contruyeron aceras y contenes con buena calidad.
2. La terminacion es un punto a favor en este proyecto, ya que goza de buena terminación.

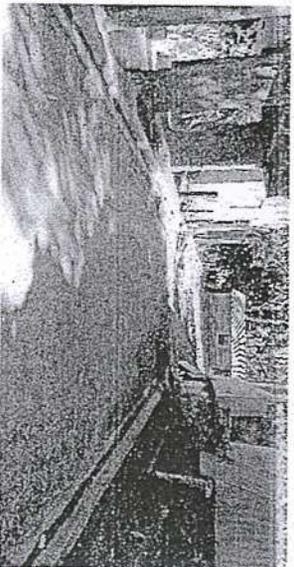



IMAG024.jpg

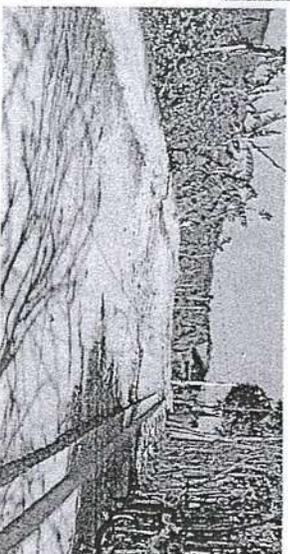


IMAG025.jpg



LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

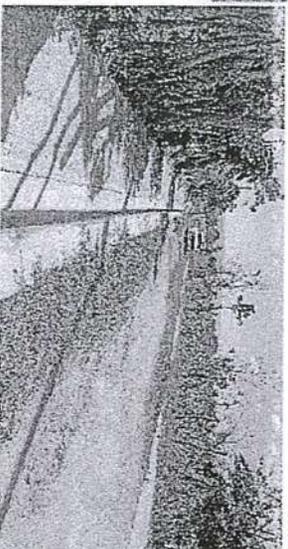

Suministra los datos de este reporte,



ING. EDWARD ACOSTA

Técnico



ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico

