



**LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —**

Santo Domingo, D.N.  
23 de julio de 2023

Al:

Ingeniero

**Valentín Santos García**

Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y  
Ordenamiento Territorial  
Su Despacho-

Via:

Ingeniero

**Nelson D. Peña Luna**

Director Asesoría Construcciones Municipales  
Su Despacho



Remisión de informe de cierre de ejecución de Loma de Cabrera.

En la visita técnica realizada el 09 de febrero de 2023 se validó la ejecución de 277.50 metros cuadrados de aceras y 925.10 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 1133.47 metros cuadrados de aceras y 1141.70 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 1376.74 metros cuadrados de aceras y 2056.30 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,

  
**Elizabeth García V.**

Técnico

Dirección Asesoría Construcciones Municipales



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE AVANCE DE OBRA

CODIGO: 050201

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

PROVINCIA: DAJABÓN

MUNICIPIO: LOMA DE CABRERA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 9 de febrero de 2023

1. Ing. Edward Acosta

TÉCNICOS: 2. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/PRIMERA	153.00	1.41	1	299.50	1	215.735	299.5
TRAMO B	C/SEGUNDA	52.20	1.18	1	104.40	1	61.76	104.4
TRAMO C	C/TERCERA				199.60	1		199.6
TRAMO D	C/PROYECTO				138.4	1		138.4
TRAMO E	C/PROYECTO 2				183.2	1		183.2
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							277.50	925.10

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,787,964.36

Monto desembolsado RD\$ 3,787,964.36 (100%)

Avance de obra 70.68%



**LIGA MUNICIPAL  
-- DOMINICANA --**

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN: CIBAO NOROESTE**

**FECHA DE VISITA TÉCNICA: 9 de febrero de 2023**

**PROVINCIA: DALABÓN**

**MUNICIPIO: LOMA DE CABRERA**


**DISTRITO MUNICIPAL: -**

**INFORME DE AVANCE DE OBRA**


A la fecha de 09/02/2023 se ha ejecutado 277.50 metros cuadrados de aceras y 925.10 metros lineales de contén, lo que corresponde al 70.68% del fondo asignado para este territorio.


**NOTAS**

1. Hasta la fecha de la visita, se contruyeron aceras y contenes con buena calidad.
2. La terminacion es un punto a favor en este proyecto, ya que goza de buena terminación.


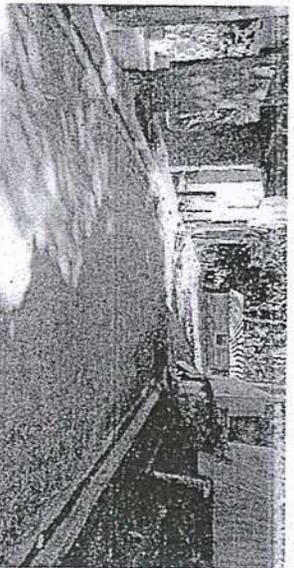


IMAG024.jpg

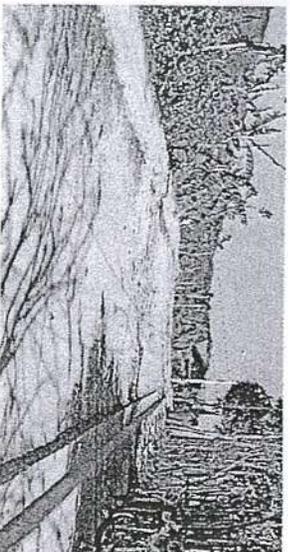



LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

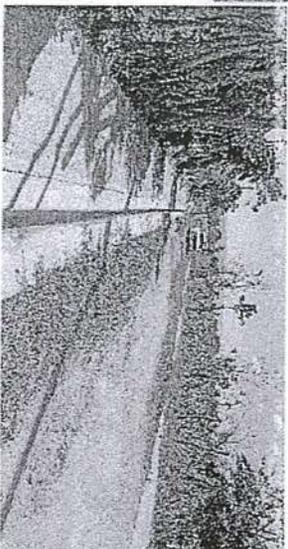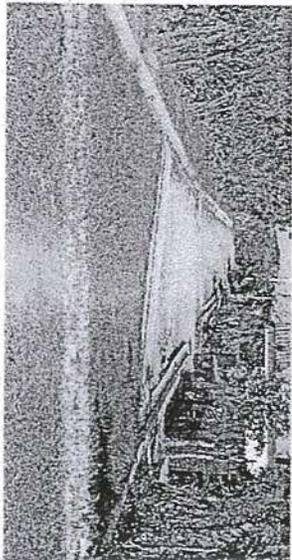

Suministra los datos de este reporte,



ING. EDWARD ACOSTA

Técnico



ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico



**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE  
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

---

**REPORTES DE AVANCE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)**

**3ER COMPONENTE**

**1- UBICACIÓN DEL PROYECTO**

PROVINCIA: DAJABON

MUNICIPIO: LOMA DE CABRERA

DISTRITO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_

BARRIO Y/O SECTOR: \_\_\_\_\_

<b>MONTE GRANDE</b>
---------------------

**2- UNIDAD EJECUTORA ( Marque con una X)**

- a. Gobierno Local
- b. Contratista

Razón Social	Ayuntamiento Municipal Loma de Cabrera
RNC ó Cédula:	430-00440-5

**3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ( Marque con una X)**

- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros: \_\_\_\_\_

<b>Construcción de Aceras y Contenes</b>
--

**4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.  
Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Monte Grande Lado Izquierdo	19.450282	-71.623347	19.454692	-71.625934	459.28	1	441.5	459.28	441.5
Tramo B	Monte Grande Lado Derecho	19.450282	-71.623347	19.454692	-71.625934	674.27	1	700.2	674.27	700.2
Tramo C										
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										



#### 4- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Los contenes se construyeron encima de cunetas, haciendo un mejor drenaje en las aguas lluvias, fuese que cuando hay exceso de agua, comienzan a funcionar las cunetas. En varios tramos se utilizo' encache como soporte del contén por el desmoronamiento como es un área montañosa en muchos lugares se uso' relleno para la pendiente. Pasado en el presupuesto la obra está en 95% de su ejecución final.

#### 5- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Anthony Isidro Almont Lopez

CÉDULA:

094-0023263-4

CODIA:

43217

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

22 de Julio del 2025

Valida y aprueba los datos suministrados,

*Fic. Francisco C.*

Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



