

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 060103

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: DUARTE

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE MACORÍS

DISTRITO MUNICIPAL: CENOVI

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 15 de septiembre de 2022

1. Ing. Richard Cabrera

TÉCNICOS: 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (M)	ANCHO DE ACERAS (M)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (M)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (M2)	TOTAL DE CONTENES (M)
TRAMO A	CALLE LOS INDIOS	279.50	1.26	1	279.50	1	352.17	279.5
TRAMO B	CALLE LOS INDIOS	233.00	1.18	1	233.00	1	274.94	233
TRAMO C	CALLE DEL PORQUERO	214.50	0.80	1	214.50	1	171.6	214.5
TRAMO D	CALLE PRINCIPAL CENOVI-BANDEIRA	385.00	1.17	1	385	1	450.45	385
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							1249.16	1112.00

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,199,657.24

Monto desembolsado RD\$ 4,199,657.25 (100%)

Avance de obra 110.26%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 15 de septiembre de 2022

PROVINCIA: DUARTE

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE MACORÍS

DISTRITO MUNICIPAL: CENOVÍ


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,249.16 metros cuadrados de aceras y 1,112.00 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Se pudo observar una buena terminación en la acera y contenes construido hasta el momento de la visita.

IMÁGENES

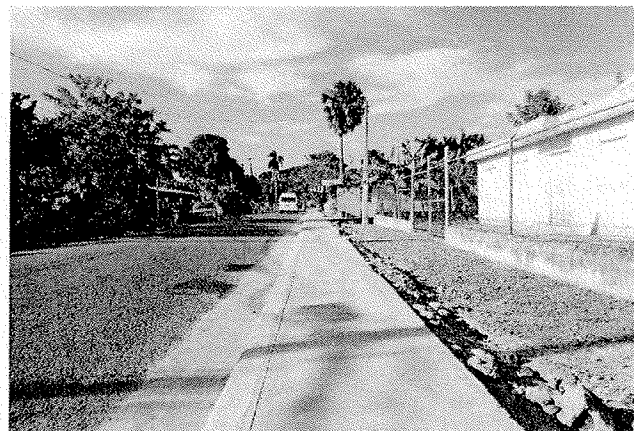



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

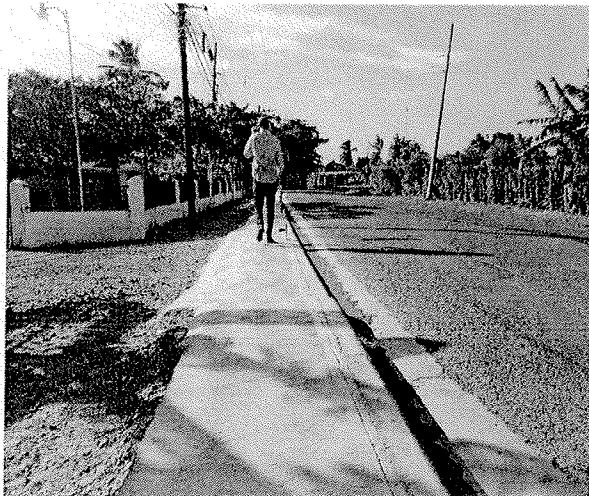

Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA
Técnico

CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico
