

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 050203
REGIÓN: CIBAO NOROESTE
PROVINCIA: DAJABÓN
MUNICIPIO: LOMA DE CABRERA
DISTRITO MUNICIPAL: SANTIAGO DE LA CRUZ

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 14 de julio de 2023
TÉCNICOS: 1. Ing. Félix Tavárez
 2. Arq. Kellin Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL				11.90	1.00		11.90
TRAMO B	C/FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL				12.00	1.00		12.00
TRAMO C	C/FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL				217.20	1.00		217.20
TRAMO D	C/PRINCIPAL, LOS TRES CAÑOS				138.90	1.00		138.90
TRAMO E								
TRAMO F	SECTOR LA CLINICA CALLE 1RA				86.45	2.00		172.90
TRAMO G	CALLE 2DA				53.30	2.00		106.60
TRAMO H	CONTIN. DE LOS TRES CAÑOS C/PARTE ATRÁS				821.90	1.00		821.90
TRAMO I	C/COMUN. CON PARTIDO				80.00	1.00		80.00
TRAMO J	PERIMETRO DEL PARQUE	151.80	2.88	1.00			437.18	
TRAMO K	C/ 1A LATERAL DERECHA DEL PARQUE				86.10	2.00		172.20
TRAMO L	C/ 1A LATERAL DERECHA DEL PARQUE				156.30	2.00		312.60
TRAMO M	C/ 2B PERPENDICULAR DEL PARQUE				35.00	2.00		70.00
Total							437.18	2,116.20

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,890,612.68
 Monto desembolsado RD\$ 1,445,306.34 (50%)
 Avance de obra 203.39%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 14 de julio de 2023

PROVINCIA: DAJABÓN

MUNICIPIO: LOMA DE CABRERA

DISTRITO MUNICIPAL: SANTIAGO DE LA CRUZ


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 437.18 metros cuadrados de aceras y 2,116.20 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Estos contenes cumplen con lo establecido por el programa que otorga la LMD.
2. Toda ejecución tienen muy buena terminación.
3. La construcción de las aceras en el parque frente al ayuntamiento se encuentran así ya que por la información del ingeniero le dejaron 5 cm libre para darle una terminación en rallado profundo.

IMÁGENES

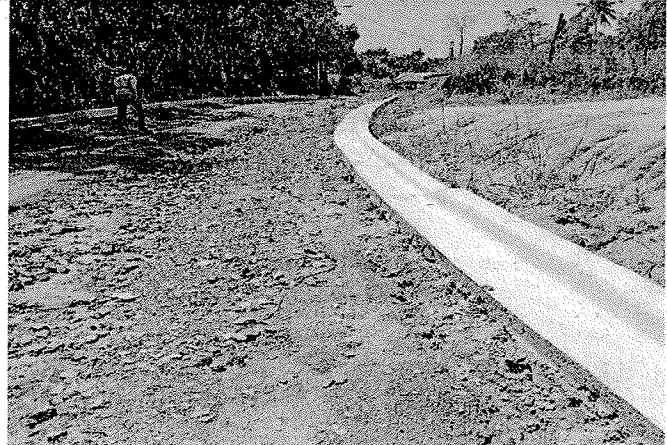



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**




Suministra los datos de este reporte,



ING. FÉLIX TAVÁREZ

Técnico



ARQ. KEILIN MORA

Técnico
