



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 150601

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

PROVINCIA: MONTE CRISTI

MUNICIPIO: VILLA VÁSQUEZ

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 10 de mayo de 2023

1. Ing. Richard Cabrera

TÉCNICOS: 2. Felipe Reyes


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	GENERAL CABRERA	28.05	1.25	2			70.125	
TRAMO B	LA ALTAGRACIA	78.30	1.30	2	78.30	2	203.58	156.6
TRAMO C	16 DE AGOSTO	22.30	1.50	1	22.30	1	33.45	22.3
TRAMO D	CALLE DE LA SALIDA	49.50	2.00	1	49.50	1	99	49.5
TRAMO E	SECTOR LAS CALLERAS C/1	373.90	0.70	1	373.90	1	261.73	373.9
TRAMO F	C/2	97.10	0.70	2	97.10	2	135.94	194.2
TRAMO G	C/3	481.70	0.70	1	455.1	1	337.19	455.1
TRAMO H	C/4	63.20	0.70	2	63.20	2	88.48	126.4
TRAMO I								
Total							1229.50	1378.00

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,170,916.83

Monto desembolsado RD\$ 4,170,916.84 (100%)

Avance de obra 119.86%



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

FECHA DE VISTA TÉCNICA: 10 de mayo de 2023

PROVINCIA: MONTE CRISTI

MUNICIPIO: VILLA VÁSQUEZ

DISTRITO MUNICIPAL: -



INFORME DE CIERRE DE ELECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,229.50 metros cuadrados de aceras y 1,378.00 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Las aceras tienen menos de un metro de ancho.
2. Algunas zonas han sido maltratadas por inundaciones

IMÁGENES

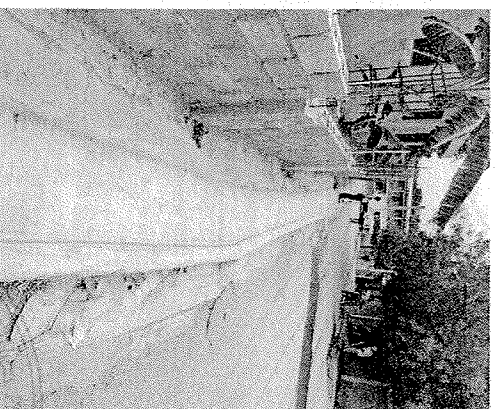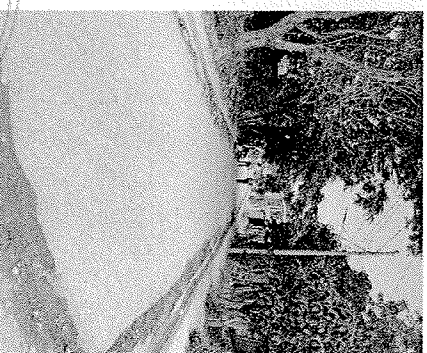

Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA

Técnico

FELIPE REYES

Técnico

