

LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

Santo Domingo, D.N.
07 de diciembre de 2023

Al:

Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía:

Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto:

Remisión de informe de cierre de ejecución de Peralta.


En la visita técnica realizada el 30 de mayo de 2023 se validó la ejecución de 1,334.50 metros cuadrados de aceras y 1,393.90 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 1,257.6 metros cuadrados de aceras y 1,217.6 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia que se ha ejecutado 1,593.1 metros cuadrados de aceras y 2,611.5 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 020501

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: PERALTA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 30 de mayo de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Ramírez
2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ La Mina, Sec. Carrizal	139.90	1.00	1.00	164.20	1.00	139.90	164.20
TRAMO B	C/ PRINCIPAL	145.60	1.00	2.00	145.60	2.00	291.20	291.20
TRAMO C	CALLE B	126.30	1.00	1.00	126.30	1.00	126.30	126.30
TRAMO D	CALLE C	692.40	1.00	1.00	692.40	1.00	692.40	692.40
TRAMO E		84.70	1.00	1.00	119.80	1.00	84.70	119.80
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							1,334.50	1,393.90

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,261,259.34
Monto desembolsado RD\$ 2,130,629.67 (50%)
Avance de obra 124.53%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: PERALTA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 30 de mayo de 2023



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,334.50 metros cuadrados de aceras y 1,393.90 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. Este ayuntamiento esta construyendo por contrato
2. Estas aceras y contenes cumplen con lo recomendado por la LMD
3. Al momento de realizar este levantamiento la alcaldesa estuvo presente

IMÁGENES

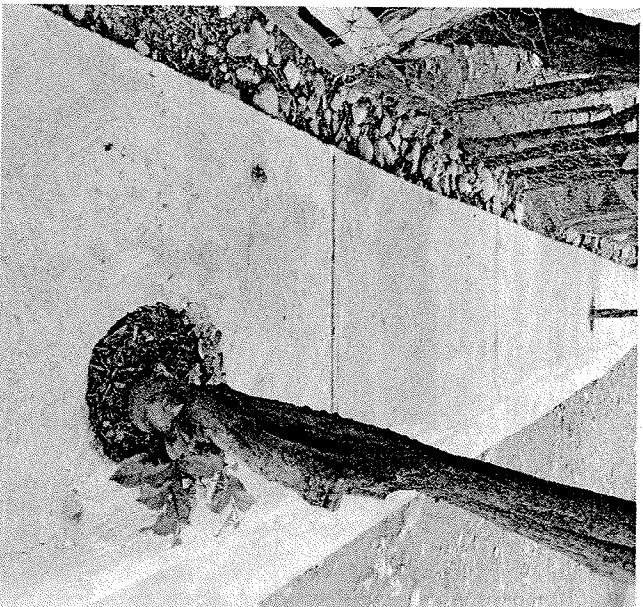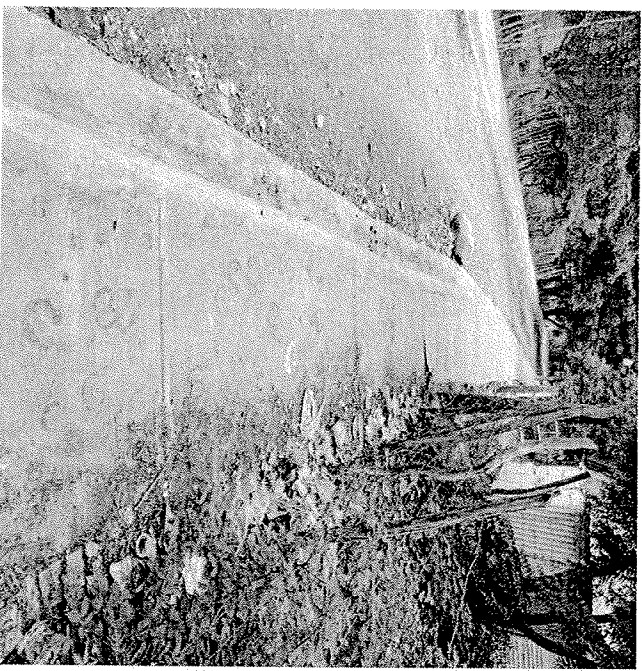





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

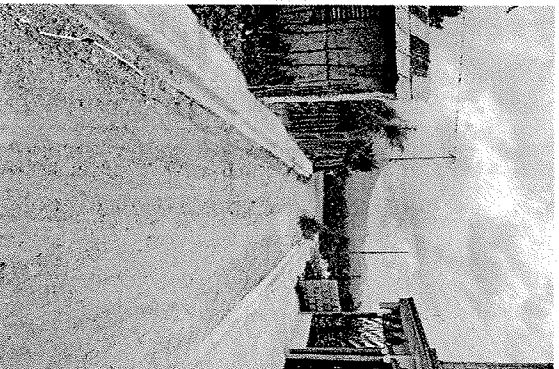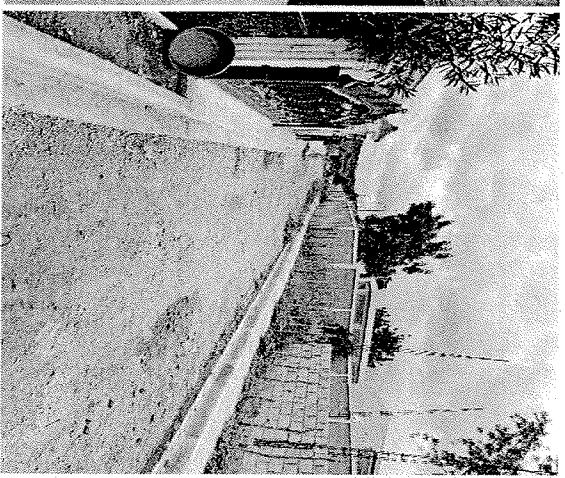

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico


CESAR DE LOS SANTOS
Técnico



PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA:	AZUA
MUNICIPIO:	PERALTA
DISTRITO MUNICIPAL:	SECCION EL CARRIZAL
BARRIO Y/O SECTOR:	
	EL PUERTO

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local ☐
- b. Contratista ☐

Razón Social	ING.ELVIS PORFIRIO PEREYRA SAVIÑON
RNC ó Cédula:	416000313

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	CALLE PROYECTO EL PUERTO	18.521850	-70.823822	18.521794	-70.823369	36.65	1.04	36.65	73.30	73.30
Tramo B	CALLE PRINCIPAL	18.519861	-70.823411	18.519836	-70.823218	166.25	0.98	166.25	332.5	332.5
Tramo C	CALLE RESPALDO PRINCIPAL	18.520127	-70.823693	18.520084	-70.824120	142.2	1.00	142.2	284.4	284.4
Tramo D	CALLE SEGUNDA	18.521587	-70.824443	18.521564	-70.824514	220	0.98	220	440	400
Tramo E	CALLE RESPALDO SEGUNDA	18.523770	-70.823899	18.522874	-70.824041	63.7	0.78	63.7	127.4	127.4
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

$\Sigma = 1257.6$ $\Sigma = 1.017.6$



5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Este es el informe con relación al tercer componente.

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,



NOMBRE COMPLETO:

CARLOS MODESTO NAVARRO INOA

CÉDULA:

001-1643975-3

CODIA:

34554

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

02/11/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,



Junta Distrital o Alcaldía Municipal
