

Santo Domingo, D.N.
12 de febrero de 2024

Al:

Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía:

Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto:

Remisión de informe de Avance de Yamasá.

En la visita técnica realizada el 24 de febrero de 2023 se validó la ejecución de 1,562.37 metros cuadrados de aceras y 1,999 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 763.7 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.


Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 1,562.37 metros cuadrados de aceras y 2,763 metros lineales de contenes, lo que corresponde al 96 % de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales





LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—


SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 290401
REGIÓN: HIGUAMO
PROVINCIA: MONTE PLATA
MUNICIPIO: YAMASÁ
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24 de febrero de 2023
TÉCNICOS: 1. Ing. Danilo Mercado
2. Arq. Keilin Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	AL LADO DEL CEMENTERIO				61.50	2		123
TRAMO B	AL LADO DEL CEMENTERIO				10.30	1		10.3
TRAMO C	AL LADO DEL CEMENTERIO				12.00	1		12
TRAMO D	AL LADO DEL CEMENTERIO				70.20	2		140.4
TRAMO E	CALLE FRENTE AL CEMENTERIO				47.2	2		94.4
TRAMO F	CALLE FRENTE AL CEMENTERIO				9.2	1		9.2
TRAMO G	CALLE FRENTE AL CEMENTERIO				45.2	1		45.2
TRAMO H	CALLE FRENTE AL CEMENTERIO				96.5	2		193
TRAMO I	CALLE AL LADO DEL CEMENTERIO				18.2	2		36.4
TRAMO J	CALLE AL LADO DEL CEMENTERIO				14.8	2		29.6
TRAMO K	CALLE AL LADO DEL CEMENTERIO				60.3	2		120.6
TRAMO L	INICIANDO EN LA BANCA HER. CONCEPCION				177.7	2		355.4
TRAMO M	CALLE CUESTA DEL JOBO				10	2		20
TRAMO N	CALLE CUESTA DEL JOBO				5.7	1		5.7
TRAMO O	CALLE CUESTA DEL JOBO				46.9	2		93.8
TRAMO P	CALLE CUESTA DEL JOBO				23.4	1		23.4
TRAMO Q	CALLE CUESTA DEL JOBO				87.5	2		175
TRAMO R	CALLE CUESTA DEL JOBO				5.7	1		5.7
TRAMO S	CALLE CUESTA DEL JOBO				85.5	2		171
TRAMO T	ENTRANDO POR LA BANCA LA PRIMERA				167.6	2		335.2




LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO U	A PARTIR DE AQUÍ LA SEGUNDA INSPECCION							
TRAMO V	LA CUESTA DEL JOBO, CALLE DEL CEMENTERIO	106.85	1.00	2			213.7	
TRAMO W	CALLE DEL CEMENTERIO	9.50	2.64	1			25.08	
TRAMO X	CALLE 2DA DEL CEMENTERIO	133.30	0.90	2			239.94	
TRAMO Y1	CALLE DEL CEMENTERIO DEL OTRO LADO DEL BADEN	52.10	1.31	2			135.981	
TRAMO Z1	CALLE 2DA DEL CEMENTERIO PARTE ARRIBA	87.10	0.88	2			153.296	
TRAMO AA	CALLE LOS JAVILLONES	165.80	0.93	2			308.388	
TRAMO AB	CALLE SABANA, CUESTA DEL JOBO	128.20	0.95	2			243.58	
TRAMO AC	CALLE 2DA CUESTA DEL JOBO	121.20	1.00	2			242.4	
Total							1562.37	1999.30

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 5,773,222.08
Monto desembolsado RD\$ 2,886,611.05 (50%)
Avance de obra 123.89%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: HIGUAMO
PROVINCIA: MONTE PLATA
MUNICIPIO: YAMASÁ
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24 de febrero de 2023

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,562.37 metros cuadrados de aceras y 1,999.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. La ejecución de estas aceras y contenes cumplen con los estándares de calidad establecido por el programa.
2. En este reporte anexamos las fotos de tramos de Aceras inconcluso las cuales se estan ejecutando.


IMÁGENES







LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

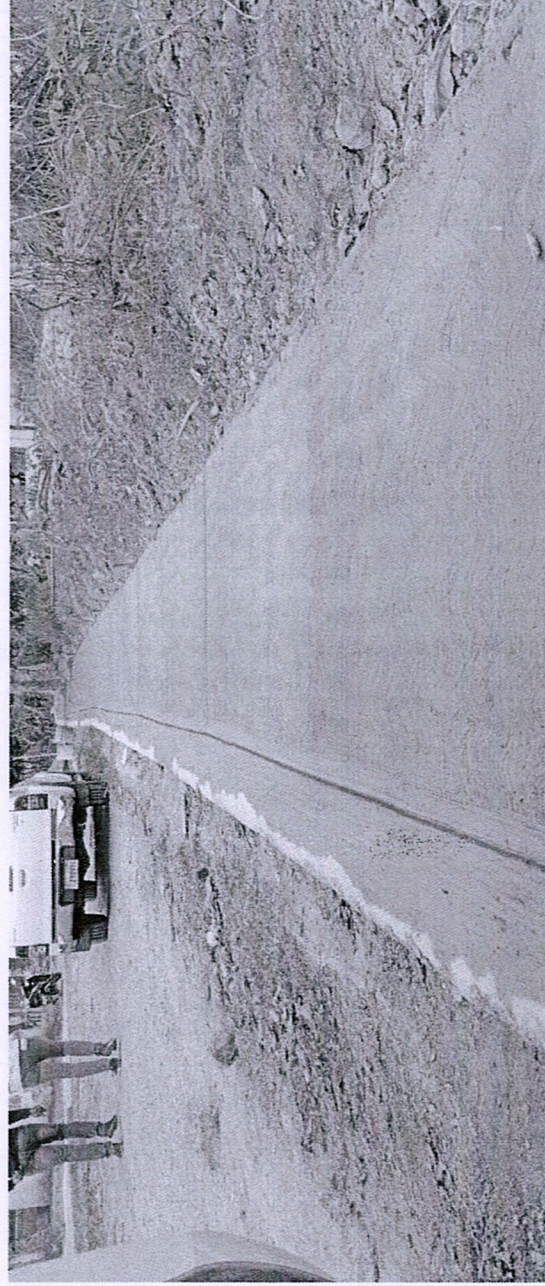



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

Guillermo Mercado
ING. DANILO MERCADO
Técnico

Karelín Mora
ARQ. KELIN MORA
Técnico



**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

REPORTES DE AVANCE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA:

Monte Plata

MUNICIPIO:

Soroca

DISTRITO MUNICIPAL:

BARRIO Y/O SECTOR:

*1) Baby Laro
2) Guasumita*

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local

☐

b. Contratista

☒

Razón Social

AGROSEMI S.R.L.

RNC ó Cédula:

1-31-84141-5

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

a. Reparación de aceras y contenes: ☒

b. Incluye demoliciones de tramos: ☒

c. Incluye badenes: ☐

d. Otros:

Construcción de contenes

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE LAS ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Av. G. Guzmán	18.78840	-69.958285	18.787545	-69.957440	—	—	29.400	—	29.400
Tramo B	Av. G. Guzmán	18.812046	-69.959787	18.811982	-69.955971	—	—	13.000	—	13.000
Tramo C	" "	18.812161	-69.953858	18.812123	-69.956906	—	—	130.600	—	130.600
Tramo D	" "	18.212316	-69.956708	18.812094	-69.954740	—	—	209.10	—	209.10
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

S=763.7

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Ninguna

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Edison E. Hernandez P.

CÉDULA:

001-1022649-5

CODIA:

21125

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

28/01/2024

Valida y aprueba los datos suministrados,



Ramón Bravo

Firma y sello


Junta Distrital ó Alcaldía Municipal







Guesumita

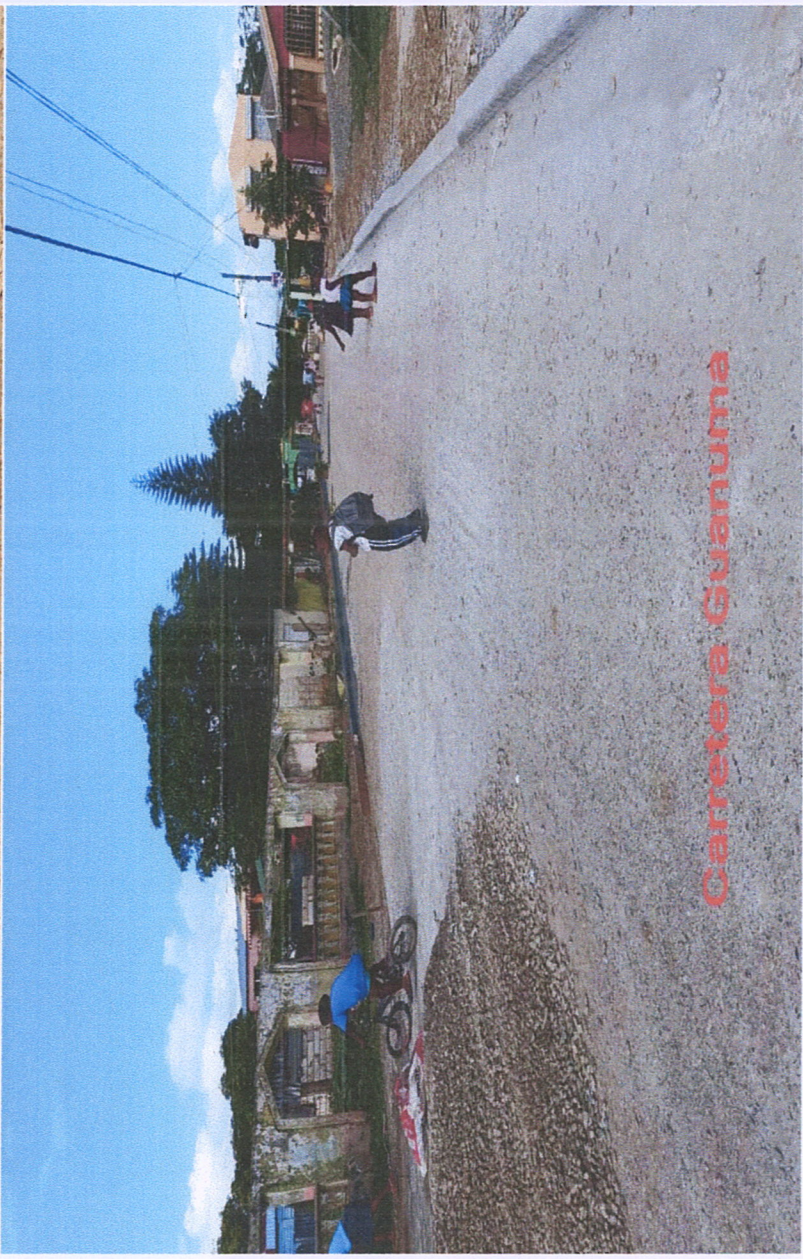

Carretera Guanuma



Guasumita
