

LIGA MUNICIPAL – DOMINICANA –

Santo Domingo, D.N.
19 de junio de 2023

Al:

Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía:

Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto:

Remisión de informe de cierre de ejecución de San Cristóbal

En la visita técnica realizada el 20 de enero 2023 se validó la ejecución de 3,953.26 metros cuadrados de aceras y 4,292.25 metros lineales de contenes, La supervisión designada por el CODIA el 14 de junio del 2023 ha validado la ejecución de 3,464.5 metros cuadrados de aceras y 4,452.5 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.


La supervisión externa ha validado la ejecución de 4,448.89 metros cuadrados de aceras y 7,739.74 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 11,866.65 metros cuadrados de acera y 16,484.49 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100 % o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany E. Castro
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL


INFORME DE AVANCE DE OBRA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 20/01/2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Ramírez
2. Arq. Keilin Mora
3. Ing. Staylin Mendoza
4. Elisabeh Aguilera

CODIGO: 210101
REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL
MUNICIPIO: SAN CRISTÓBAL
DISTRITO MUNICIPAL: -

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Sector Francisco del Rosario Sánchez. Calle Tera.	481.35	1.00	2	502.95	2	962.7	1005.9
TRAMO B	Sector Francisco del Rosario Sánchez. Calle 2da.	21.00	0.93	1	68.90	1	19.53	68.9
TRAMO C	Sector Villa Valdez. Calle Los Maestros.	320.00	1.41	1	320.00	1	451.2	320
TRAMO D	Sector Villa Valdez. Calle Francisco J. Peña.	45.30	1.90	1	45.30	1	86.07	45.3
TRAMO E	Sector Villa Valdez. Calle Presidente Villini.	116.30	1.22	2	116.3	2	283.772	232.6
TRAMO F	Sector Villa Valdez. Calle Pedro Rembille	33.80	1.43	1	55	1	48.334	55
TRAMO G	Sector Villa Valdez. Calle Jesus de Galindo.	171.10	1.40	2	171.1	2	479.08	342.2
TRAMO H	Sector Santa Lucia de Camba. Calle Tera.	622.50	1.03	1	664.1	1	641.175	664.1
TRAMO I	Sector Palmita. Calle Tera	486.40	0.90	1	503.7	1	437.76	503.7
TRAMO J	Sector Palmita. Calle frente a la Plaza Comercial Luis.	451.90	0.80	1	434.1	1	361.52	434.1
TRAMO K	Sector Palmita. Calle frente a la Escuela Básica La Palmita	211.77	0.86	1	140.8	1	182.1222	140.8




LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO L	Sector Santa María. Calle Tera				285.5	1		285.5
TRAMO M	Sector Santa María. Calle 2da				194.45	1		194.45
Total							3953.26	4292.55

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 23,098,920.39
Monto desembolsado RD\$ 23,098,920.39 (100%)
Avance de obra 69.87%



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL

MUNICIPIO: SAN CRISTÓBAL

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 20/01/2023


INFORME DE AVANCE DE OBRA

A la fecha de 20/01/2023 se ha ejecutado 3,953.26 metros cuadrados de aceras y 4,292.55 metros lineales de contén, lo que corresponde al 69.87% del fondo asignado para este territorio.





NOTAS


1. En esta visita técnica se encontró en uno de los sectores las plantillas del contén muy pequeñas precisamente en el sector Santa María, San Cristóbal.
2. En el Sector de Francisco del Rosario Sánchez observamos que toda la construcción se estaba haciendo bien con todo lo relacionado con los agregados y plantillas del contén, relleno en las aceras.
3. En relación a lo observado en nuestra visita de inspección pudimos evidenciar que el sector Villa Valdez, en la calle presidente Billini, la mezcla del hormigón para la ejecución de los contenes se estaba realizando manual.
4. En el sector la Palmita Ingenio Nuevo pudimos observar que los contenes ejecutados no se elaboró los cantos laterales de la batea.
5. Estas obras fueron ejecutadas por contrato.
6. Lo levantado hasta el momento es lo construido en los diferentes sectores visitados hasta la fecha.

IMÁGENES



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

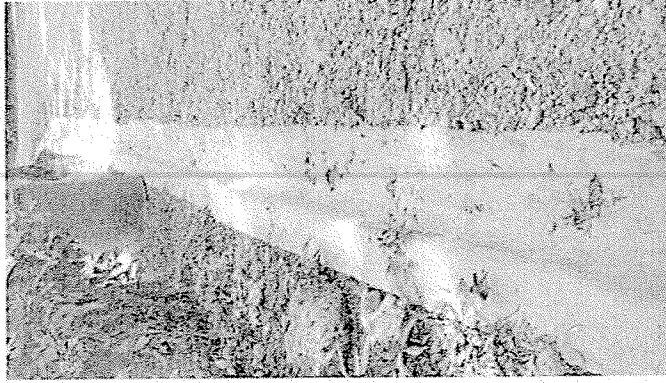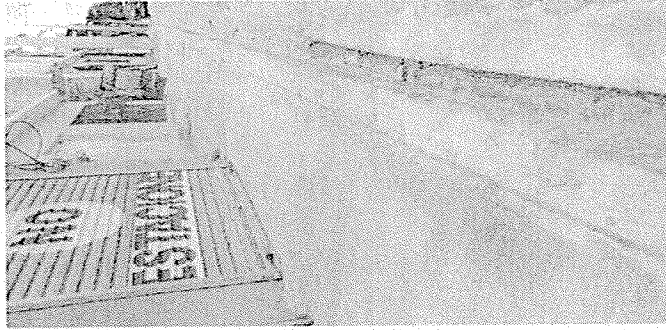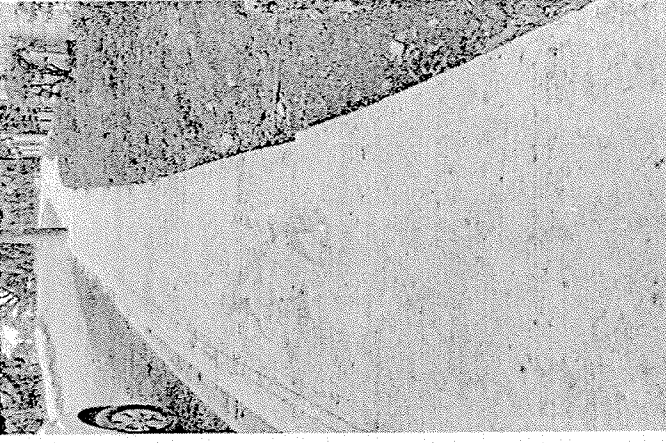



Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ

Técnico


ING. STAYLIN MENDOZA


Técnico


ARQ. KEILIN MORA

Técnico


ELISABETH AGUILERA

Técnico



**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

INFORMES DE CIERRE DE PROYECTO (ACERAS Y CONTENES)

Quien suscribe, VICKY JOSEFINA LEMOS, CODIA No. 42707, me dirijo a ustedes para informarles, que el gobierno local que mencionáremos a continuación, ha ejecutado el 100% o más de los volúmenes según la proyección estimada para el proyecto de Aceras y Contenes, del programa de apoyo municipal de la Liga Municipal Dominicana a los gobiernos locales.

Este reporte de ejecución de cierre se realiza a partir del reporte de levantamiento suministrado.

UBICACIÓN DEL PROYECTO


PROVINCIA:

MUNICIPIO:

DISTRITO MUNICIPAL:


BARRIO Y/O SECTOR:

IMAGENES



BARRIO LAS PALMITAS

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	ANCHO DE LA CALLE (m)	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
Tramo A	CALLE PRINCIPAL	5.50		1.00	680.00	696.80
Tramo B	CONSORCIO	7.40		1.00	265.60	266.00
Tramo C	CALLE PRIMERA	4.80		1.00	85.30	80.00
Tramo D						
Tramo E						
Tramo F						
Tramo G						
Tramo H						
Tramo I						
Tramo J						
Tramo K						
Tramo L						





Willy Jover


Firma del supervisor CODIA:

Fecha de la visita técnica: 14-06-2023

TOTAL 1,030.90 1,042.80

SAN CRISTOBAL, LA PALMITAS

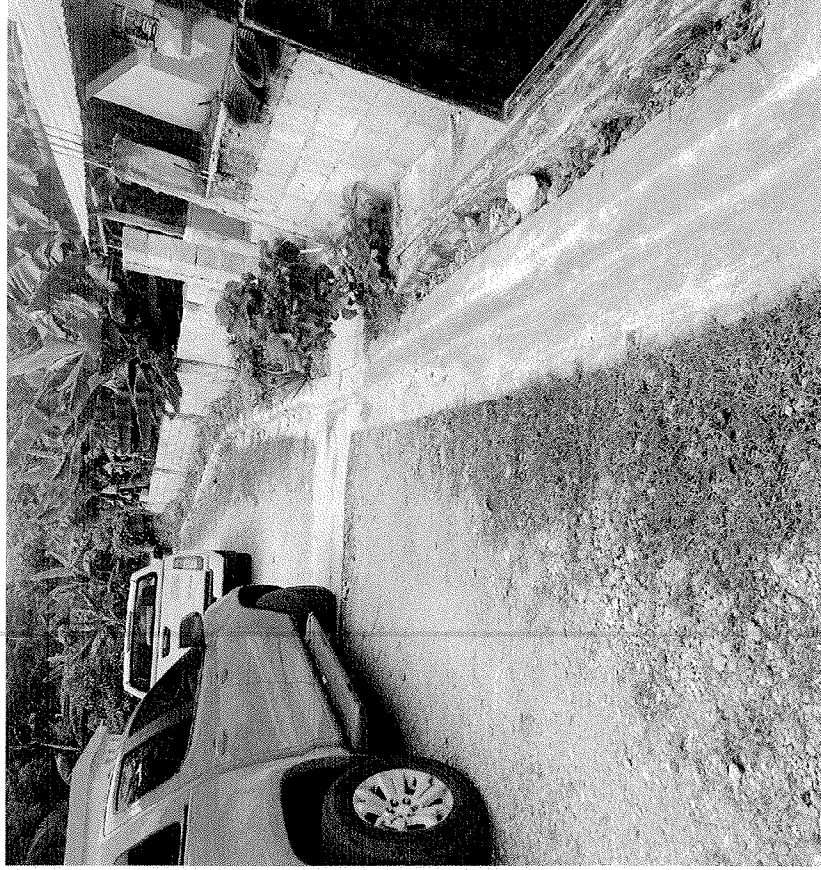

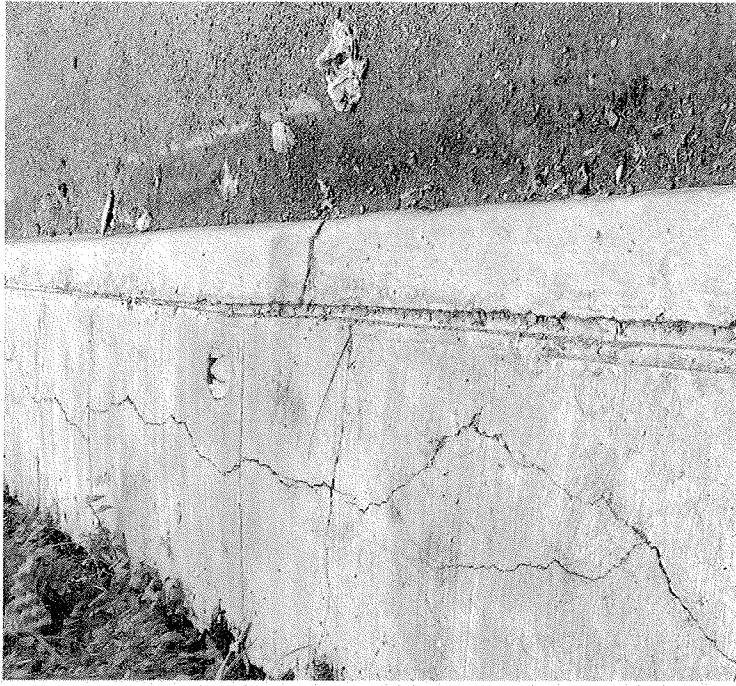

BARRIO LOS NOVAS

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	ANCHO DE LA CALLE (m)	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
Tramo A	JESUS DE GALINDEZ	5.60		1.00	193.00	254.10
Tramo B	PEDRO RENVILLE	6.80		1.10	131.10	131.10
Tramo C	PRESIDENTE BILLINI	5.50		1.00	204.00	244.10
Tramo D	LOS MAESTROS	7.20		1.00	338.80	338.80
Tramo E						
Tramo F						
Tramo G						
Tramo H						
Tramo I						
Tramo J						
Tramo K						
Tramo L						

TOTAL


730.90

968.10

Fecha de la visita técnica:

14-06-2023




Firma del supervisor CODIA:




SAN CRISTOBAL, LOS NOVAS
CALLE JESUS DE GALINDEZ




Calle Pedro Renville

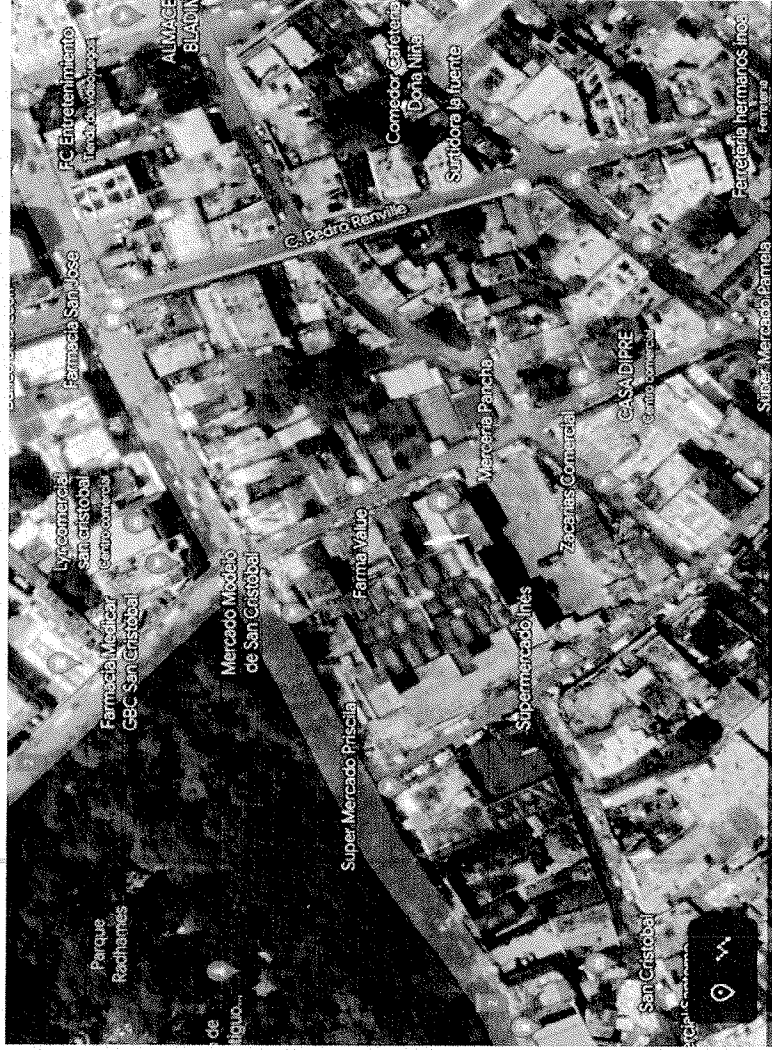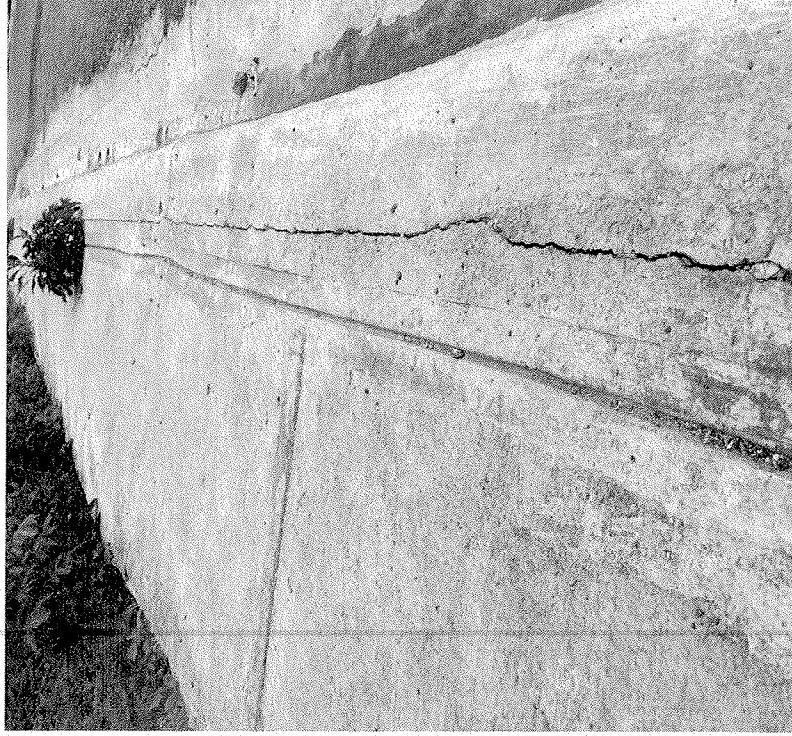



Calle Presidente Billini





Calle Los Maestros




SANTA LUCIA DE CAMBA

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	ANCHO DE LA CALLE (m)	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
Tramo A	CALLE PRIMERA	6.00		1.00	660.00	660.00
Tramo B	SANTA MARIA					
Tramo C	CALLE PRIMERA	3.50				319.90
Tramo D	CALLE EL 15	4.00				376.70
Tramo E	MADRE VIEJA SUR					
Tramo F	CALLE FCO. DEL ROSARIO SANCHEZ	4.00		1.00	1042.70	1085.00
Tramo G						
Tramo H						
Tramo I						
Tramo J						
Tramo K						
Tramo L						
TOTAL						2,441.60


Fecha de la visita técnica: 14-06-2023



Firma del supervisor CODIA:




Acum 3:3464.5
Conten 3:4452.5

SAN CRISTOBAL, SANTA LUCIA DE CAMBA




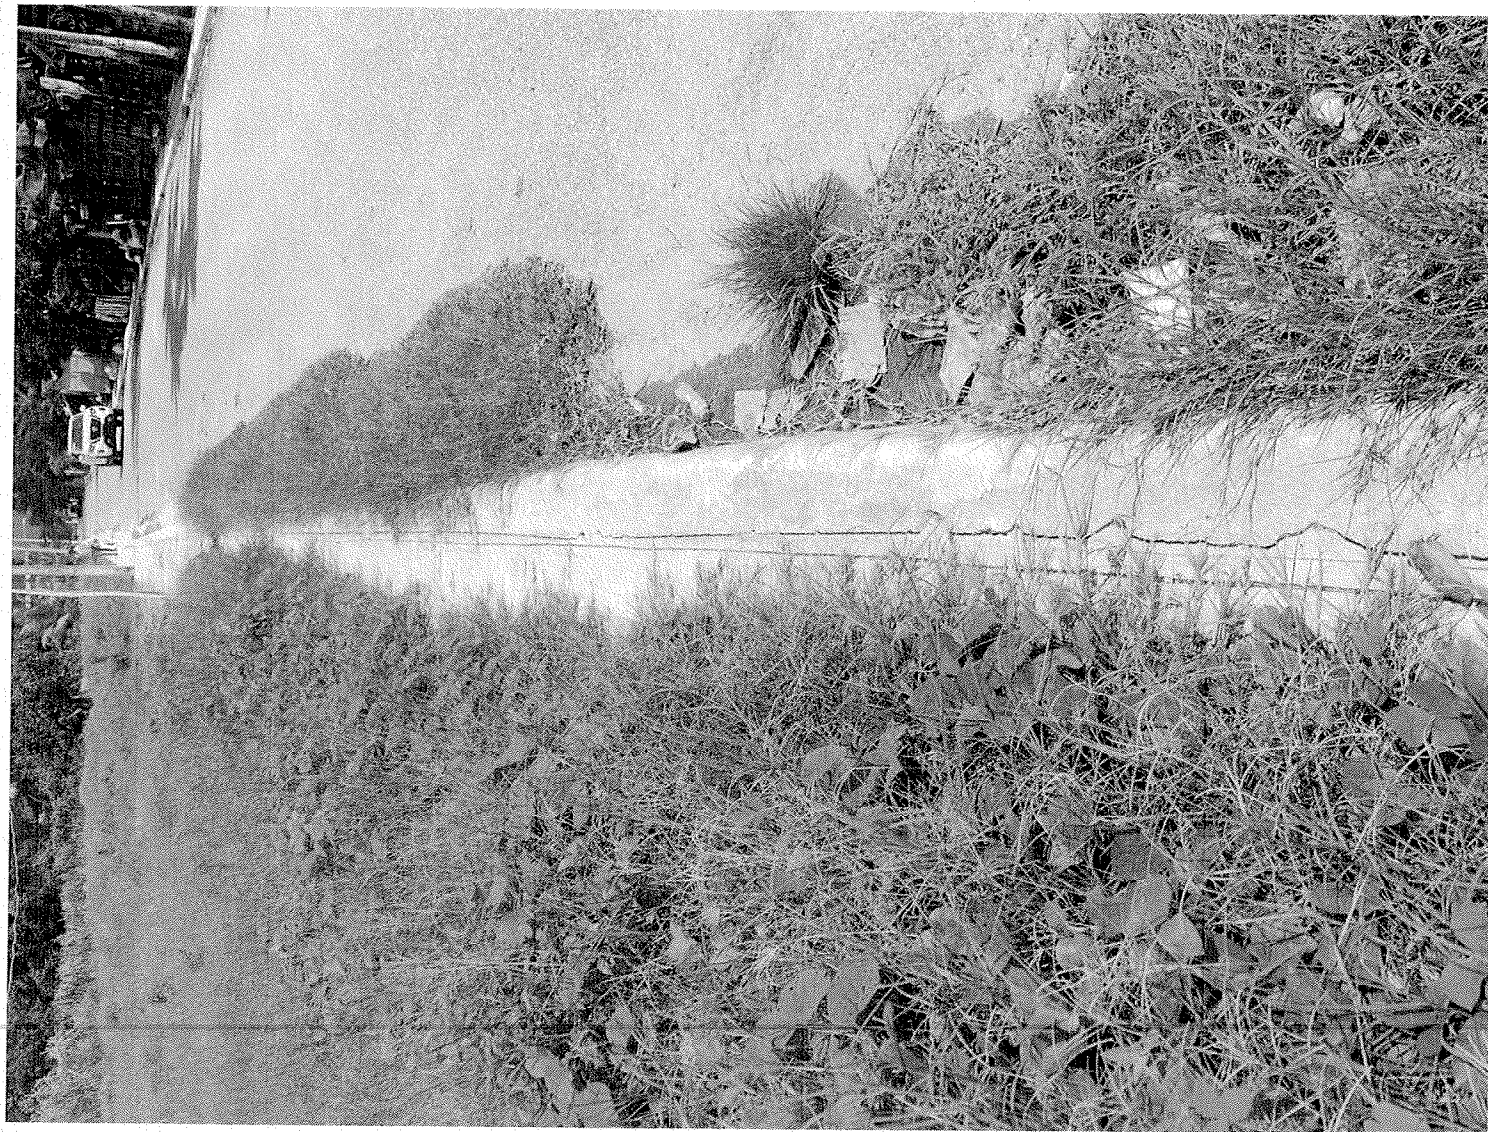


SAN CRISTOBAL, SANTA MARIA

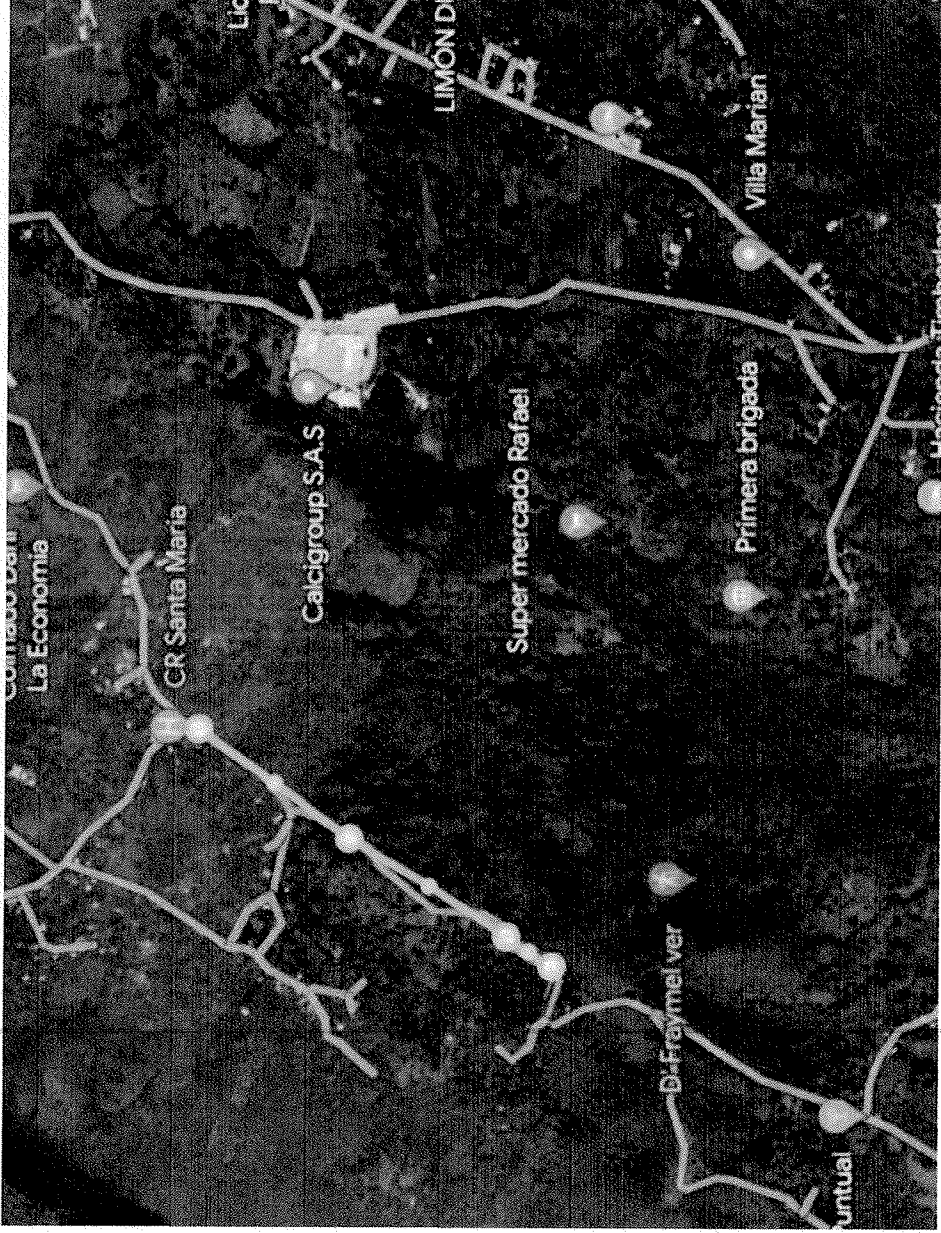

SAN CRISTOBAL, MADRE VIEJA SUR







**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA:

SAN CRISTOBAL

MUNICIPIO:

DISTRITO MUNICIPAL:

MADRE VIEJA SUR

BARRIO Y/O SECTOR:

--

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local

--

b. Contratista

X

Razón Social

K-FOUR SERVICIOS MULTIPLES SRL

RNC ó Cédula:

132081201

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

a. Reparación de aceras y contenes: X

b. Incluye demoliciones de tramos:

c. Incluye badenes:

d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD						
Tramo A	Calle Duarte	18.41522,-	-70.09689	18.41402,-	-70.09677	1.00	133.5	133.5	133.5
Tramo B		18.41474,-	-70.09704	18.41452,-	-70.09694	1.32	31.3	41.31	31.3
Tramo C	Calle C.B	18.41452,-	-70.09694	18.41443,-	-70.09707	1.36	21.00	28.56	21.00
Tramo D	Calle C.B	18.41444,-	-70.09703	18.41444,-	-70.09694	1.50	11.80	17.7	11.80
Tramo E	Calle Duarte	18.41444,-	-70.09694	18.41426,-	-70.09691	1.80	14.90	26.82	14.90
Tramo F	Calle Duarte	18.41426,-	-70.09691	18.41411,-	-70.09689	1.05	17.20	18.06	17.20
Tramo G		18.41249,-	-70.09667	18.41221,-	-70.09662	1.40	42.5	59.5	42.5
Tramo H		18.41204,-	-70.09661	18.40952,-	-70.09625	1.55	282.5	437.8	282.5
Tramo I		18.40937,-	-70.09623	18.40919,-	-70.09627	0.90		19.89	
Tramo J		18.40894,-	-70.09617	18.40891,-	-70.09616	1.57	4.50	7.06	4.50
Tramo K		18.40891,-	-70.09616	18.40883,-	-70.09614	1.18	8.10	9.55	8.10
Tramo L		18.40883,-	-70.09614	18.40879,-	-70.09615	1.14	6.60	7.52	

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		LONGITUD	LATITUD	FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD			LATITUD	LONGITUD					
Tramo M	Calle Héroicos	18.40829	-70.09615	18.40837	-70.09622	6.70	1.08	6.70	7.23	6.70		
Tramo N	Calle Duarte	18.40923	-70.09611	18.41097	-70.09635	205.00	1.00	205.00	205.00	9.60		
Tramo O	Panada de motor (calle Duarte)	18.2454	N 70.0548			3.20	3.00	9.60				
Tramo P												
Tramo Q												
Tramo R												
Tramo S												
Tramo T												
Tramo U												
Tramo V												
Tramo W												
Tramo X												

1,029.10
5,744.00

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- En el tramo (A) se observan de Fomidad en Aceras Por el Alto tránsito de personas en la zona, en la terminación
- Cumple con la calidad y Parámetros Adaptados a la zona y condiciones del lugar
- Cierre de Presupuesto Asignado A contratista

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

ALIS JOEL MERCEDES

CÉDULA:

402-2112386-8


CODIA:

35877

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

11/05/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,



Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Presupuesto administrativo

No. DOPM0025

Monio Total RDS:

2,840,676.61

PRESUPUESTO : Construcción de aceras y contenes

UBICACION : Calle Duarte (SODOCAL)

No	Descripcion	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)
A	Contenes				
1	Preliminares				
1.1	Caseta de Materiales	1.00	P.A	12,000.00	12,000.00
1.2	Replanteo topográfico.	1.00	P.A	18,000.00	18,000.00
1.3	Lebrero Identificación de Obra	1.0	P.A	16,000.00	16,000.00
	SUB-TOTAL 1				46,000.00
2	Movimiento de Tierra:				
2.1	Excavacion a Mano material no clasificado	176.00	M³	450.00	79,200.00
2.2	Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado C/masquilo	17.60	M³	1,200.00	21,120.00
2.3	Telford (tipo III), a base de H.S y Piedras	6.00	M³	1,500.00	9,000.00
2.4	Bote producto de Excavacion	212.96	M³	450.00	95,832.00
2.5	Demolicion	17.60	M³	450.00	7,920.00
	SUB-TOTAL 2				213,072.00
3	Hormigon Simple en:				
3.1	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) $P_c = 180$ kg/cm², C/ligadora.	880.00	Ml	950.00	836,000.00
3.2	Construcción de acera en hormigon 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts, a = 1.0 m	1,140.00	Mts	936.00	1,067,040.00
	SUB-TOTAL 3				1,903,040.00
8	Limpieza Final y Bote	1.00	P.A	8,000.00	8,000.00
	SUB-TOTAL 4				8,000.00
	SUB - TOTAL GENERAL RDS				2,170,112.00
	GASTOS INDIRECTOS				
	Dirección Técnica	10.00%			217,011.20
	Gastos Administrativos	3.00%			65,103.36
	Seguros, Poliza y Fianzas	4.00%			86,804.48
	Transporte de Materiales y Equipos	1.00%			21,701.12
	Ley 6/86	1.00%			21,701.12
	Codia	0.10%			2,170.11
	Supervision	5.00%			108,505.60
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18.00%			39,062.02
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				562,059.01
	TOTAL GENERAL				2,732,171.01
	Imprevistos	5.00%			108,505.60
	TOTAL A CONTRATAR RDS				2,840,676.61

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.


Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde).

Volumetría realizada por:

Revisada Por:

Ing. Andres Yander Santana
Ing. De Presupuesto, AMSC

Arq. Eniila Sarmiento Minier
Directora de Obras Públicas Municipales, AMSC



San cristobal (madre vieja SUR)

SECUENCIA DE TRAMO

- 📍 A INICIO
- 📍 FINAL A
- 📍 Punto 9
- 📍 TRAMO B
- 📍 B FINAL- INICIO C
- 📍 TRAMO A
- 📍 TRAMO C
- 📍 FINAL C
- 📍 INICIO D
- 📍 TRAMO D
- 📍 FINAL D - INICIO E
- 📍 TRAMO E
- 📍 FINAL E - INICIO F
- 📍 TRAMO F
- 📍 FINAL F
- 📍 INICIO G
- 📍 TRAMO G
- 📍 FINAL TRAMO G
- 📍 INICIO H
- 📍 TRAMO H
- 📍 FINAL H
- 📍 INICIO I
- 📍 TRAMO I
- 📍 FINAL I
- 📍 INICIO J
- 📍 TRAMO J
- 📍 FINAL J - INICIO K
- 📍 TRAMO K
- 📍 FINAL K - INICIO L
- 📍 FINAL L - INICIO M
- 📍 FINAL M
- 📍 INICIO TRAMO N
- 📍 TRAMO N
- 📍 FINAL TRAMO N





San cristobal (madre vieja SUR)

3 vistas

El último cambio se hizo hace unos segundos

➕ Añadir capa ➕ Comparar

📍 Obtener una vista previa

✕ 18.4110407,-70.0963463

📍 18.4110407,-70.0963463

✓ DIEGO PROYECTO SODOCAL

Estilos individuales


- 📍 A INICIO
- TRAMO A
- 📍 FINAL A
- Punto 9
- TRAMO B
- 📍 B FINAL- INICIO C
- TRAMO C
- 📍 FINAL C
- TRAMO D
- 📍 FINAL D- INICIO E
- TRAMO E
- 📍 FINAL E- INICIO F
- TRAMO F
- 📍 FINAL F
- 📍 INICIO G




PROCESO DE LIMPIEZ













VISTA GENERAL Y PROYECTO LIMPIO

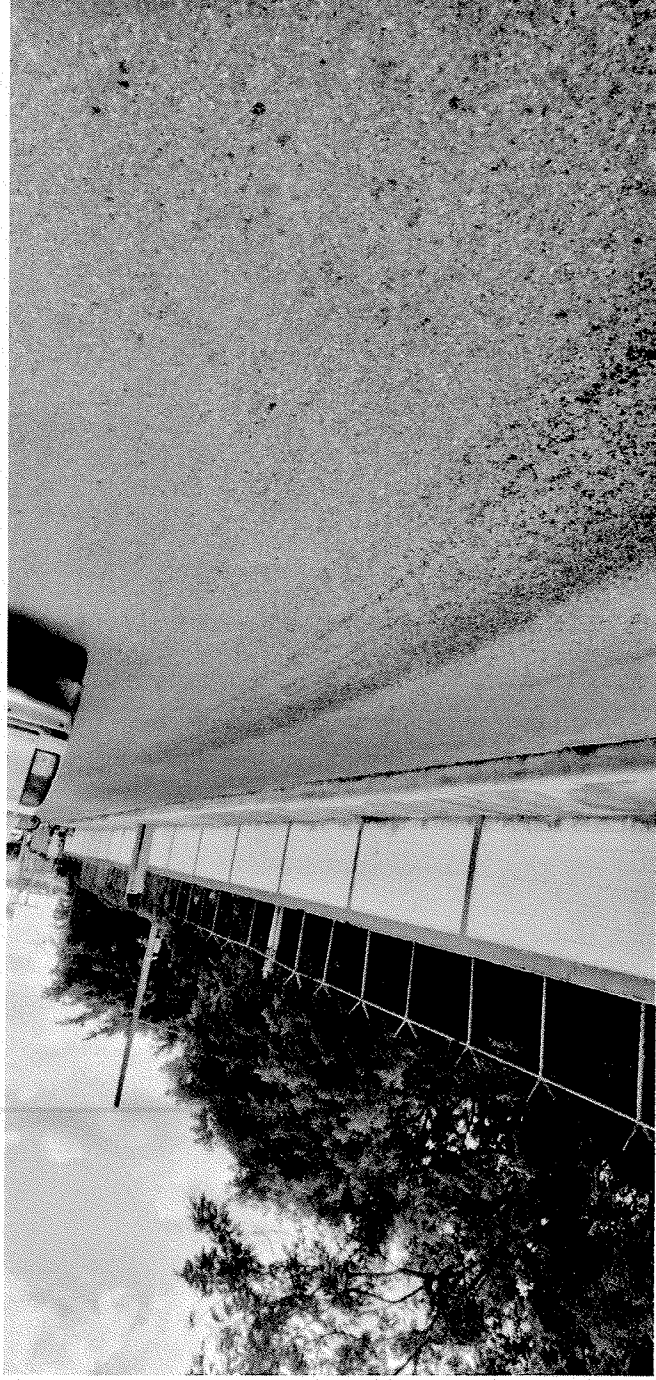

VISTA GENERAL

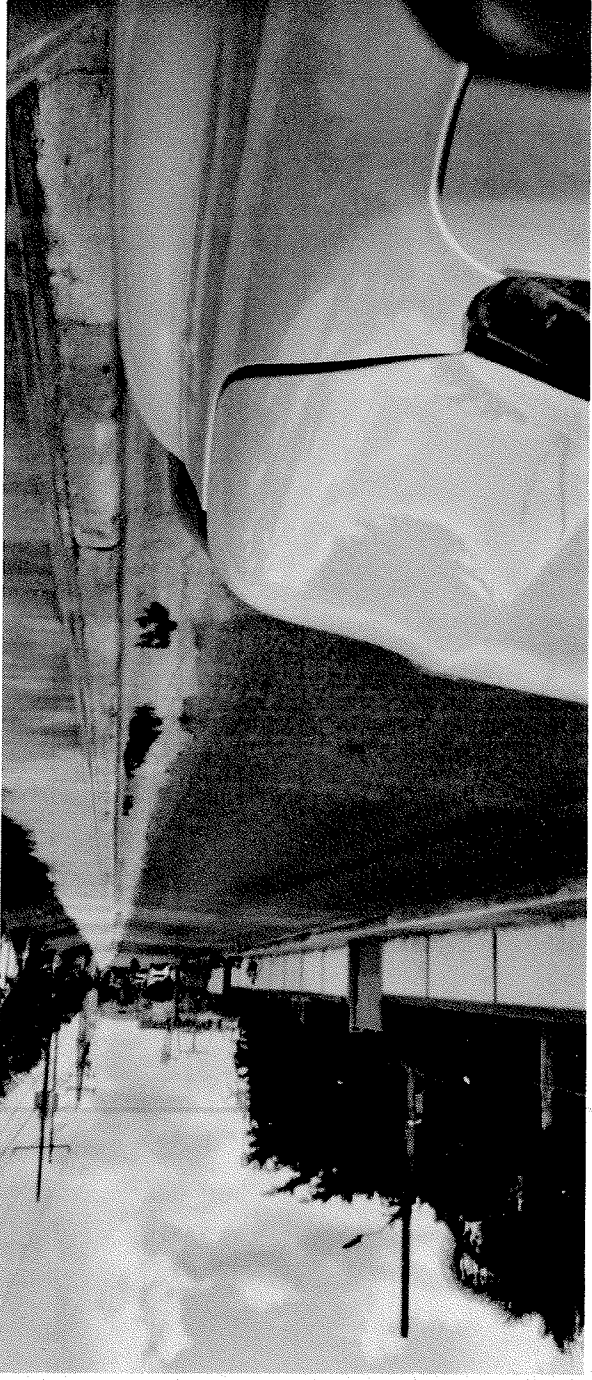

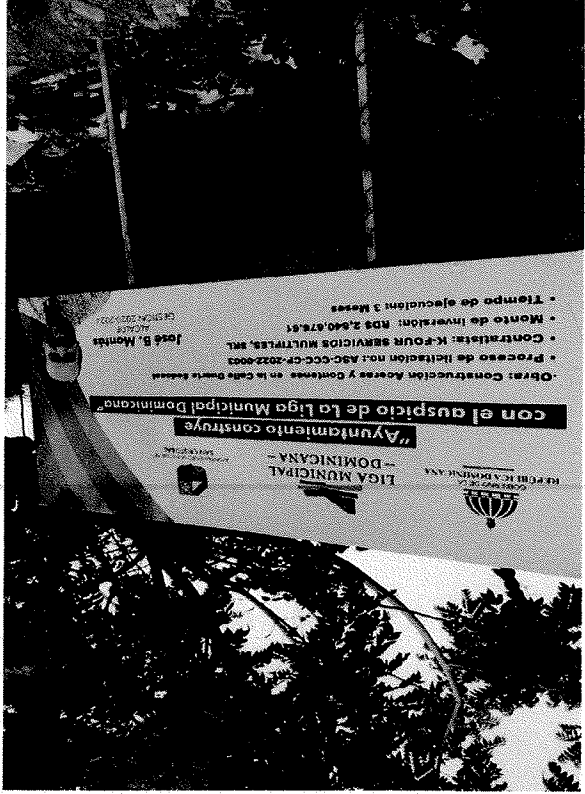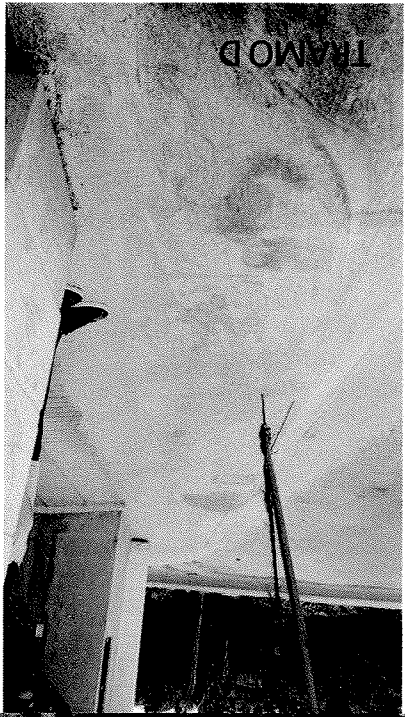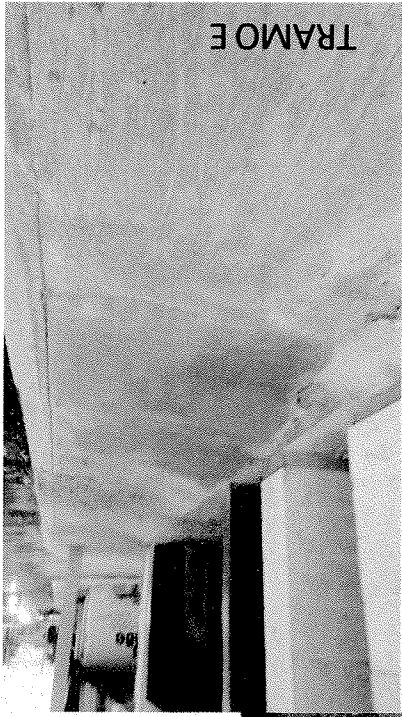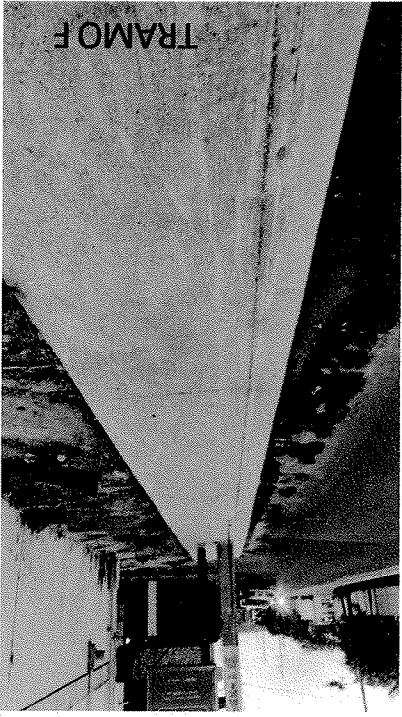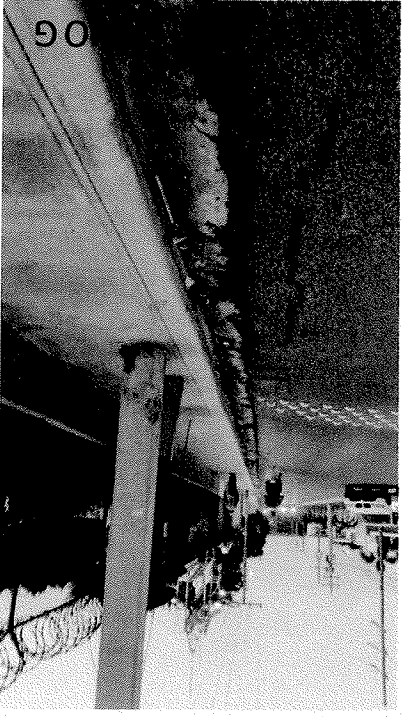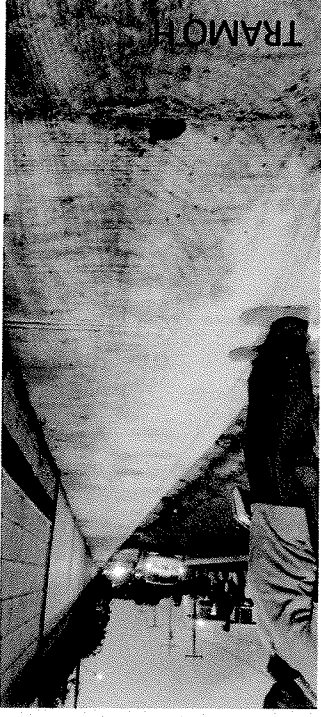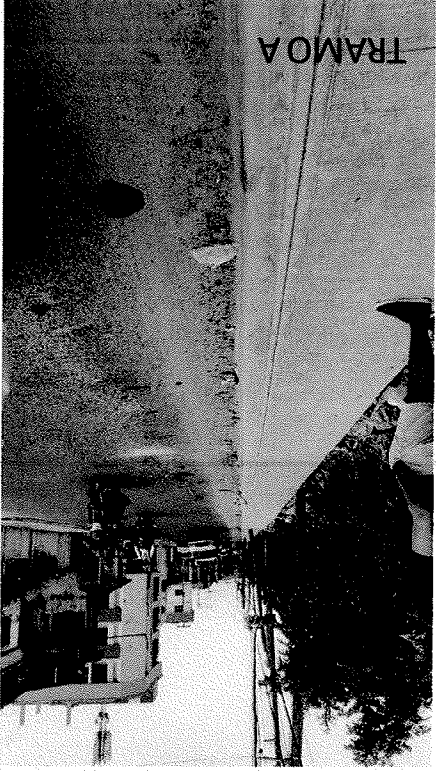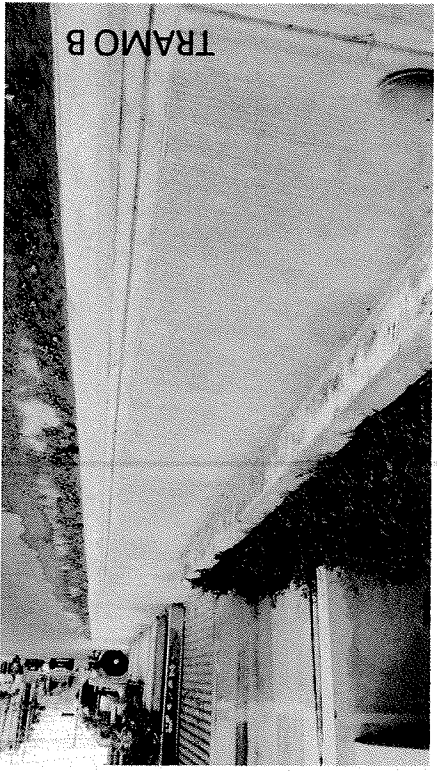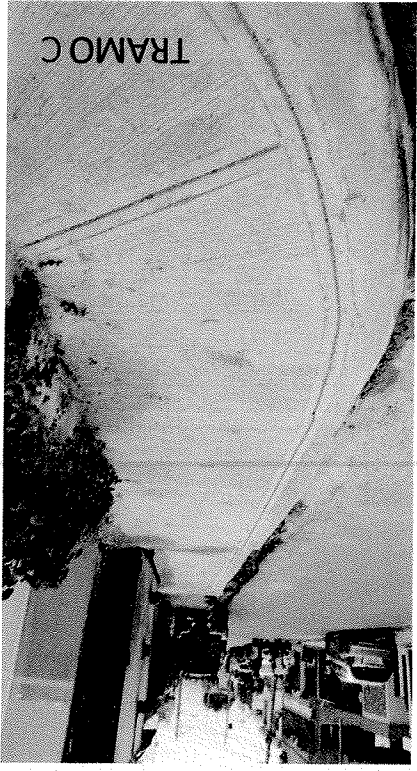



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA:

SAN CRISTOBAL

MUNICIPIO:

VILLA VALDEZ

DISTRITO MUNICIPAL:

BARRIO Y/O SECTOR:

PROYECTO UBICADO CERCA DEL HOSPITAL

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local

☐

b. Contratista

☒

Razón Social

JULIAN DARIO TRINIDAD MENDEZ

RNC ó Cédula:

07700030948

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

a. Reparación de aceras y contenes: X

b. Incluye demoliciones de tramos:

c. Incluye badenes:

d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		LONGITUD	LATITUD	LONGITUD	LATITUD	FINAL	LONGITUD DE ACERAS	ANCHO DE LA ACERA	LONGITUD DE CONTENES	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
Tramo A	Calle Pedro Revilla	18.41528	-70.11529	18.41531	-70.11525	5.20	1.50	5.20	7.80	5.20	7.80	5.20	7.80
Tramo B		18.41591	-70.11548	18.41644	-70.11537	66.7	1.55	66.70	103.38	66.70	103.38	66.70	66.70
Tramo C	C. Francisco J. Reyundo	18.41623	-70.115	18.41609	-70.11521	27.40	1.42	27.40	38.90	27.40	38.90	27.40	27.40
Tramo D	C. Francisco J. Reyundo	18.41614	-70.11497	18.41608	-70.11507	11.20	1.20		13.44				
Tramo E	C. Pedro Revilla	18.41687	-70.11551	18.41711	-70.11579	47.6	1.48	47.60	70.45	47.60	70.45	47.60	47.60
Tramo F	C. Plé Billo	18.41777	-70.11484	18.4179	-70.11466	24.8	1.40	24.80	34.72	24.80	34.72	24.80	24.80
Tramo G	C. Prodigiosa María Montez	18.4179	-70.11466	18.41778	-70.11457	16.9	1.40	16.60	23.66	16.60	23.66	16.60	16.60
Tramo H													
Tramo I													
Tramo J	Bader 1 C. los maestros	18.41578	-70.1157	18.41575	-70.11575	8.05	2.80		22.54				
Tramo K	Bader 2 (C. Juan Tomas Dias)	18.41821	-70.11539	18.41819	-70.11546	10.30	2.18		22.45				
Tramo L	Bader 3 C. Pedro Revilla	18.41762	-70.11611	18.41769	-70.11618	11.80	2.40		28.32				

- ① Total Aceras mts² [292.35] mts²
- ② Total Contenes mlt [188.30] mlt
- ③ Total Bader mts² [70.71] mts²

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- (1) Cumple con los parámetros de construcción y terminación
- (2) Se observó en tramo (5) levantamiento de la terminación y fue informado al contratista para que sea arreglado
- Avance de presupuesto asignado

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte al Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Adis Joel MERCEDAS

CÉDULA:

402-2112386-8


CODIA:

35877

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

12/05/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL**



Presupuesto

JDM


PRESUPUESTO : Construcción de 3 badenes
UBICACION : Sector Villa Valdez

Monto Total RD\$: 602,878.87

Fecha 20-11-2022				P.U. (RD\$)	Unidad	Cantidad	Descripción de Partida	No.
1 Preliminares.								
1.0	Caseta de materiales.							
2.0	Letrero identificación de la obra	1	Pa	30,000.00				
SUB-TOTAL 2				15,000.00	PA	3		
SUB-TOTAL 2								75,000.00
2 Construcción de Badenes.								
1 Baden no. 1 C/ Presidente Billini / Pedro Renville (8.00 mts. x 2.00 mts.), h=0.60 m.								
1	Replanteo	1	PA	5,000.00				
2	Corte de asfalto.	16	ml	200.00				5,000.00
3	Demolición badén existente.	9.6	M3	910.00				3,200.00
4	Excavación de material inservible.	3.2	m3	460.00				8,736.00
5	Bote de materiales demolidos. Esp. 1.3	12.48	m3	450.00				1,472.00
6	Bote de materiales de excavación esp. 1.21	3.872	m3	450.00				5,616.00
7	Hormigon 180 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas), e=0.20 m @ a =(0.20x 0.20).	3.2	m3	14,160.00				1,742.40
8	Terford para badenes, e=0.40 m	6.4	m3	2,920.00				45,312.00
SUB-TOTAL 1								89,766.40
2 Baden no. 2 C/ Pedro Renville/ Gaston Ferrnando Dengne (11.70 mts. x 2.50 mts.), h=0.30 m.								
1	Replanteo	1	PA	5,000.00				
2	Corte de asfalto.	23.4	ml	200.00				5,000.00
3	Repiqueo de Hormigón existente.	29.25	m2	50.00				4,680.00
4	Bote de materiales demolidos. Esp. 1.3	38.025	m3	450.00				1,462.50
5	Hormigón 180 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas), e=0.20 m @ a =(0.20x 0.20).	4.3	m3	14,160.00				17,111.25
6	Terford para badenes, e=0.40 m	8.3	m3	2,920.00				60,888.00
SUB-TOTAL 2								113,377.75
3 Baden no. 3 C/ Francisco J. Reynaud/ C/ Los Maestros. (11.00 mts. x 2.50 mts.), h=0.60 m.								
1	Replanteo	1	PA	5,000.00				
2	Corte de asfalto.	22	ml	200.00				5,000.00
3	Demolición badén existente.	16.5	M3	910.00				4,400.00
4	Excavación de material inservible.	5.5	Pa	460.00				15,015.00
5	Bote de materiales demolidos. Esp. 1.3	21.45	m3	450.00				2,530.00
6	Bote de materiales de excavación esp. 1.21	6.655	m3	450.00				9,652.50
SUB-TOTAL 3								2,994.75

JDTM

7	Hormigón 180 kg/cm ² , (Con ligadura de 2 rundas), e=0.20 m @ a = 0.20 x 0.20	5.5	m ³	14,160.00	77,880.00
8	Terford para badenes, e=0.40 m	11	m ³	2,920.00	32,120.00
	SUB-TOTAL 3				149,592.25
4	Limpieza final				
	SUB-TOTAL 4	1	PA	28316.3	28,316.30
	SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS				456,052.70
	GASTOS INDIRECTOS				
	Dirección Técnica	10.0%			45,605.27
	Gastos Administrativos	3.0%			13,681.58
	Seguros, Póliza y Fianzas	4.0%			18,242.11
	Transporte de Materiales y Equipos	1.0%			4,560.53
	Ley 6/86	1.0%			4,560.53
	Supervisión	5.0%			22,802.64
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18.0%			8,200
	Codia.	0.10%			456.05
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS				118,115.5
	SUB-TOTAL GENERAL				574,170.35
	IMPREVISTOS:				
	Imprevistos		5.0%		28,708.52
	TOTAL GENERAL				602,878.87

Preparado por:

 Ing. Julian Dario Trinidad Mendez





SAN CRISTOBAL VILLA VALDEZ

Capa sin título

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|---------|---------------|---------|---------|-------------|----------------|---------|--------------------------------|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|---------|---------|----------------|---------------|---------|
| INICIO A | TRAMO A | FINAL A | FNAL TRAMO B | TRAMO B | INICIO TRAMO B | INICIO TRAMO C | TRAMO C | FINAL TRAMO C | TRAMO D | TRAMO D | FINAL TRAMO D | TRAMO E | TRAMO E | FINAL TAMOE | INICIO TRAMO F | TRAMO F | FINAL TRAMO F - INICIO TRAMO G | FINAL TRAMO G | TRAMO G | INICIO BADEN 1 | BADEN 1 | FINAL BADEN 1 | BADEN 2 | BADEN 2 | BADEN 2 | INICIO BADEN 1 | FINAL BADEN 3 | BADEN 3 |
|----------|---------|---------|--------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|---------|---------------|---------|---------|-------------|----------------|---------|--------------------------------|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|---------|---------|----------------|---------------|---------|

**SUPERVISION DE ACERA Y
CONTENES Y BADEN**

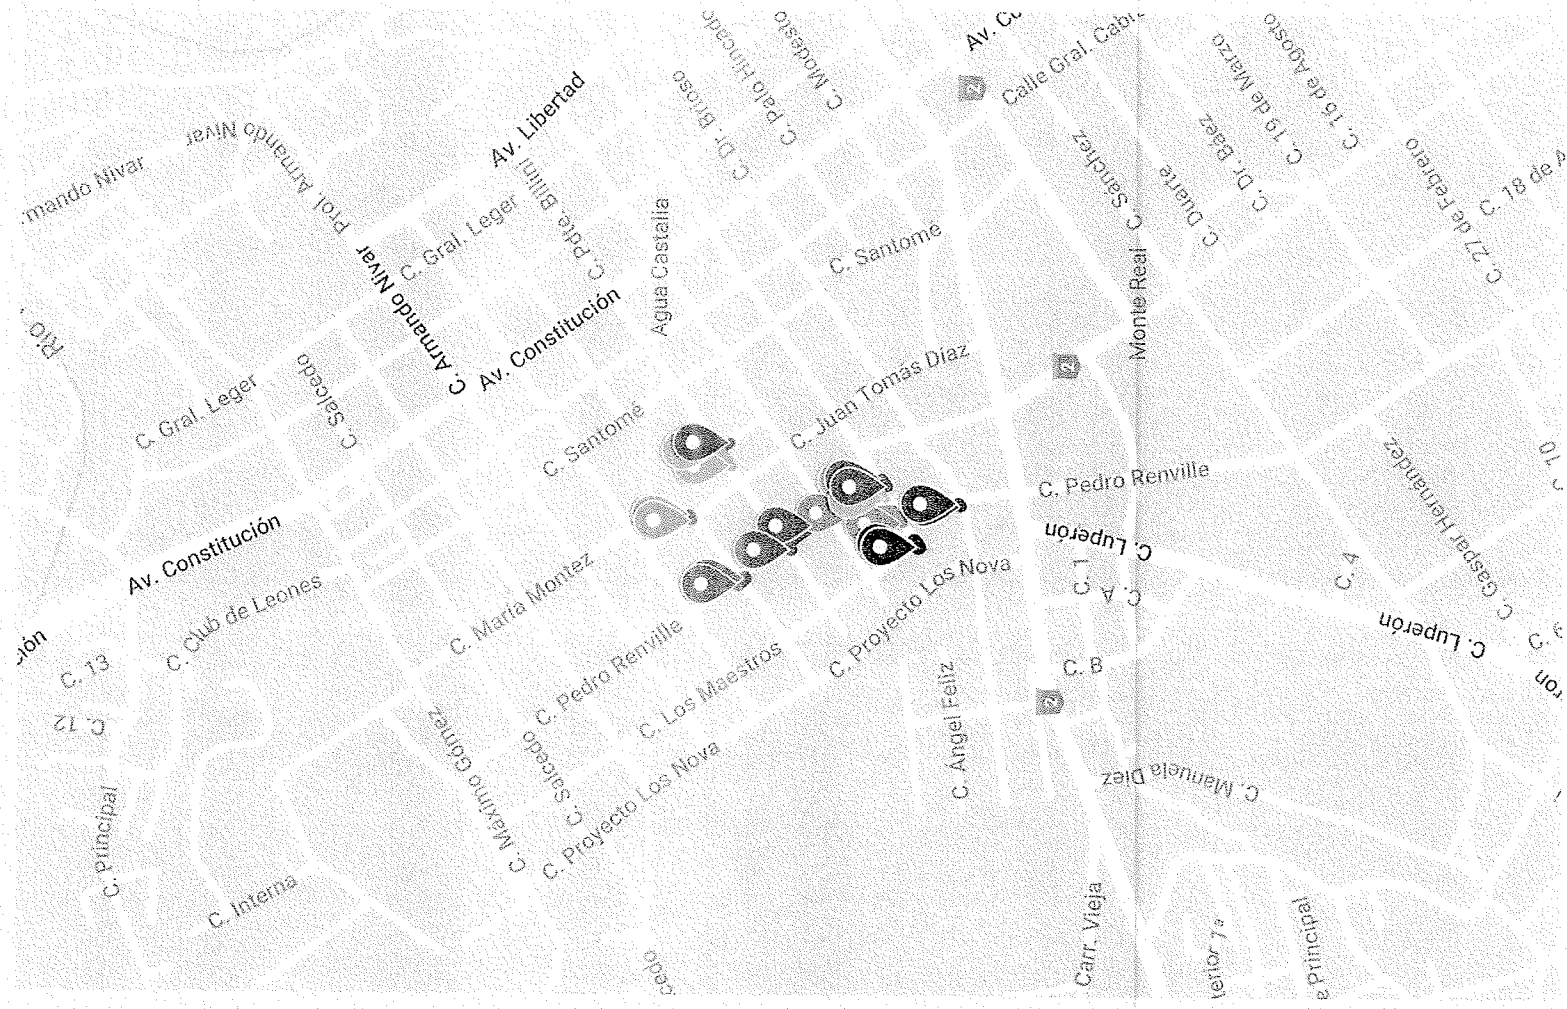



PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: SAN CRISTOBAL

MUNICIPIO: _____

DISTRITO MUNICIPAL: MADRE VIEJA

BARRIO Y/O SECTOR: _____

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local ☐
- b. Contratista ☒

Razón Social JULIAN DARIO TRINIDAD MENDEZ

RNC ó Cédula: 07700030948

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes: **X**
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO			FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD	FINAL					
Tramo A	Cavatero Sancho Hdez	18.41791	-70.10514	18.41783	-70.10515			25.00			25.00
Tramo B		18.41798	-70.10506	18.41815	-70.10469		44.5	44.5		58.74	44.5
Tramo C		18.41815	-70.10469	18.41819	-70.10446		10.6	1.80	10.6	19.08	10.60
Tramo D		18.41827	-70.10442	18.41834	-70.10428		19.00	2.95	19.00	56.05	19.00
Tramo E		18.41834	-70.10428	18.41846	-70.10405		27.00	2.15	27.00	58.05	27.00
Tramo F		18.41846	-70.10405	18.41854	-70.10393		17.80	1.88	17.80	32.57	17.80
Tramo G		18.41854	-70.10393	18.4186	-70.10382		12.90	1.80	12.90	23.22	12.90
Tramo H		18.4186	-70.10382	18.41871	-70.10363		23.10	4.20	23.10	97.02	23.10
Tramo I		18.41871	-70.10363	18.41878	-70.1035		18.50	1.40	18.50	25.90	18.50
Tramo J		18.41878	-70.1035	18.4188	-70.10346		5.10	2.85	5.10	14.53	5.10
Tramo K		18.4188	-70.10346	18.41886	-70.10333		17.80	1.70	17.80	30.26	17.80
Tramo L		18.41886	-70.10327	18.41895	-70.10317		14.20	1.70	14.20	24.14	14.20

① - total gopher / ML content + [891.10] ML
 ② - total gopher / m² ACERA [4,563.72] m²

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO			FINAL		ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE ACERAS (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD				
Tramo M		18.419,	-70.10306	18.41909,	-70.10286	25.30	3.00	25.30	75.90	25.30
Tramo N		18.41909,	-70.10286	18.41937,	-70.10233	60.30	1.50	60.30	90.45	60.30
Tramo O		18.41937,	-70.10233	18.41934,	-70.10219	15.00	1.17	15.00	17.15	15.00
Tramo P		18.41947,	-70.10222	18.41991,	-70.10138	99.80	2.95	99.80	194.61	99.30
Tramo Q		18.41991,	-70.10138	18.42018,	-70.10084	63.90	1.50	63.90	95.85	63.90
Tramo R		18.42018,	-70.10084	18.42023,	-70.10075			11.40		11.40
Tramo S		18.42023,	-70.10075	18.42057,	-70.1001	77.30	1.60	77.30	123.68	77.30
Tramo T		18.42057,	-70.1001	18.42049,	-70.10002	16.20	0.95	16.70	15.39	16.70
Tramo U		18.42052,	-70.09999	18.42059,	-70.10002			10.00		10.00
Tramo V		18.42064,	-70.09997	18.4213,	-70.09868	156.80	1.50	156.80	235.20	156.80
Tramo W		18.4213,	-70.09868	18.42142,	-70.09844	29.1	1.80	29.1	52.38	29.10
Tramo X		18.42142,	-70.09844	18.42153,	-70.09823	25.8	1.22	25.8	31.47	25.80
Y		18.42153,	-70.09823	18.42164,	-70.09799	29.60	2.85	29.60	84.36	29.60
Z		18.42164,	-70.09799	18.42164,	-70.09793	11.60	4.90	11.60	56.84	11.60
Z1		18.42164,	-70.09793	18.42158,	-70.09788	23.5	1.20	23.5	28.20	23.85
						4.10	2.20	4.10	9.02	4.10
						5.70	1.68	5.70	9.57	5.70
						4.10	0.90	4.10	3.69	4.10

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Cumple con todos los parámetros de construcción.
- también la terminación cumple con el estándar
- cierre de presupuesto asignado
o completo

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Alis Joel mercedes

CÉDULA:

1402-212386-8


CODIA:

35877

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

12/05/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,



Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTÓBAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto administrativo

PRESUPUESTO : Aceras, contenes
UBICACION : Carretera Sanchez entrada principal

Monio Total RDS: 6,784,749.80

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)
1	Preliminares				
1.1	Caseta de Materiales	1.00	P.A	15,000.00	15,000.00
1.2	Replanteo topográfico.	1.00	P.A	20,000.00	20,000.00
1.3	Letrero identificación de Obra	1.0	P.A	20,000.00	20,000.00
	SUB-TOTAL 1				55,000.00
2	Movimiento de Tierra:				
2.1	Excavación a Mano material no clasificado	101.70	M³	400.00	40,680.00
2.2	Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado C/macuito	101.70	M³	1,390.00	141,363.00
2.3	Telford (tipo III), a base de H.S y Piedras	25.00	M³	1,781.25	44,531.25
2.4	Bote producto de Excavacion	123.06	M³	450.00	55,375.65
2.5	Demolición	1.00	P.A	100,000.00	100,000.00
	SUB-TOTAL 2				381,949.90
3	Hormigón Simple en:				
3.1	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm², C/ligadora.	1,463.50	M1	1,908.50	2,793,089.75
3.2	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts, a = 1.0 m	1,463.50	M2	1,079.53	1,579,892.16
	SUB-TOTAL 3				4,372,981.91
4	Limpieza Final y Bote	1.00	P.A	20,000.00	20,000.00
	SUB-TOTAL 4				20,000.00
5	Muro Jersey				
	Muro Jersey División de carriles 2.40Mx0.85M	25	Und	19,950.00	498,750.00
	SUB-TOTAL				498,750.00
5	Iluminación				
	Lampara Led tipo cobra (Solar)	8	Und	4,875.00	39,000.00
	SUB-TOTAL				39,000.00
	SUB - TOTAL GENERAL RDS				5,367,681.81
	GASTOS INDIRECTOS				
	Dirección Técnica	10.00%			536,768.18
	Gastos Administrativos	3.00%			161,030.45
	Seguros, Póliza y Fianzas	4.00%			214,707.27
	Transporte de Materiales y Equipos	1.00%			53,676.82
	Ley 6/86	1.00%			53,676.82
	Codia	0.10%			5,367.68
	Supervision	5.00%			26,838.41
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18.00%			96,618.27
	Letrero identificación de Obra	1.00	P.A		
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				1,148,683.91
	TOTAL GENERAL				6,516,365.71
	Imprevistos	5.00%			268,384.09
	TOTAL A CONTRATAR RDS				6,784,749.80

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde).

Volumetria realizada por:

Revisada Por:

Ing. Andres Vander Santana
Ing. De Presupuesto, AMSC


Arq. Emilia Sarmiento Minier
Directora de Obras Publicas Municipales, AMSC

SAN CRISTOBAL (CARRETERA SANCHEZ)

entrada principal

Capa sin nombre

- 📍 INICIO A
- 📍 FINAL A
- 📍 TRAMO A
- 📍 INICIO B
- 📍 TRAMO B
- 📍 FINAL B - INICIO C
- 📍 FINAL C
- 📍 TRAMO C
- 📍 INICIO D
- 📍 TRAMO D
- 📍 FINAL D - INICIO E
- 📍 TRAMO E
- 📍 FINAL E - INICIO F
- 📍 TRAMO F
- 📍 FINAL F - INICIO G
- 📍 TRAMO G
- 📍 FINAL G - INICIO H
- 📍 TRAMO H
- 📍 FINAL H - INICIO I
- 📍 TRAMO I
- 📍 FINAL I - INICIO J
- 📍 TRAMO J
- 📍 FINAL J - INICIO K
- 📍 TRAMO K
- 📍 FINAL K
- 📍 INICIO L
- 📍 TRAMO L
- 📍 FINAL L
- 📍 INICIO M
- 📍 TRAMO M
- 📍 FINAL M - INICIO TRAMO N
- 📍 TRAMO N
- 📍 FINAL N - INICIO O

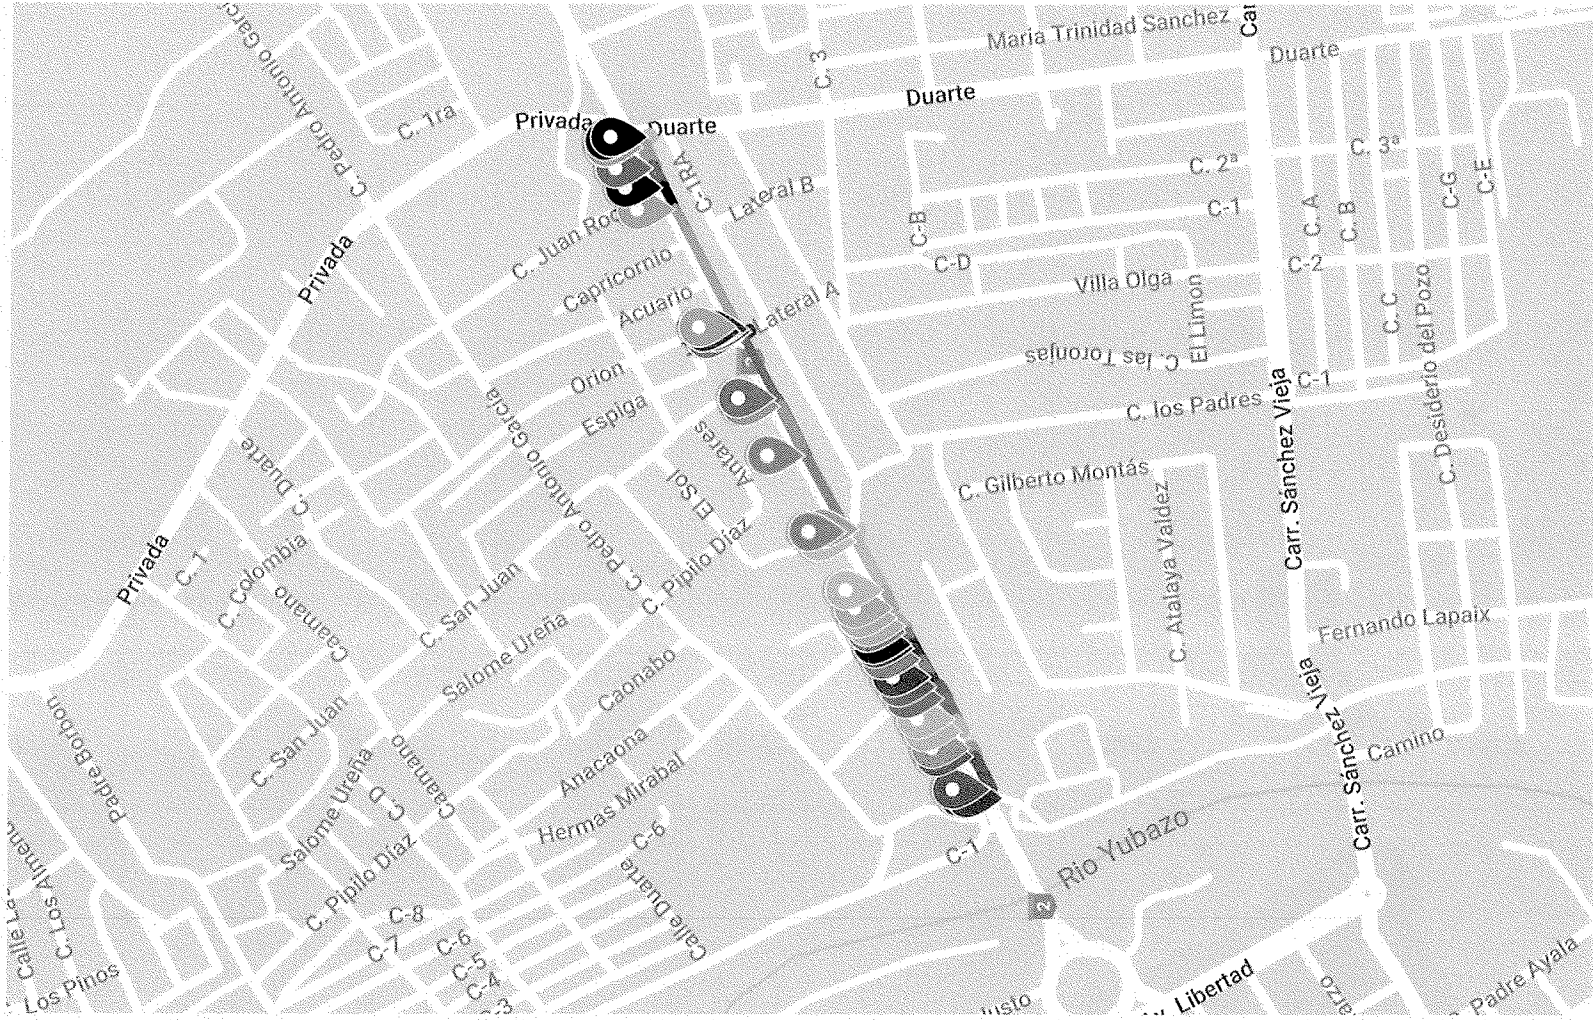

- 📍 FINAL TRAMO O
- 📍 TRAMO O
- 📍 INICIO P
- 📍 TRAMO P
- 📍 FINAL P - INICIO Q
- 📍 TRAMO Q
- 📍 FINAL Q - INICIO R
- 📍 TRAMO R
- 📍 FINAL R - INICIO S
- 📍 TRAMO S
- 📍 FINAL S - INICIO T
- 📍 TRAMO T
- 📍 FINAL T
- 📍 INICIO U
- 📍 TRAMO U
- 📍 FINAL U
- 📍 INICIO V
- 📍 TRAMO V
- 📍 FINAL V-INICIO W
- 📍 TRAMO W
- 📍 FINAL W - INICIO X
- 📍 TRAMO X
- 📍 FINAL X - INICIO Y
- 📍 TRAMO Y
- 📍 FINAL Y - INICIO Z
- 📍 FINAL Z
- 📍 TRAMO Z
- 📍 Línea 71
- 📍 FINAL Z 1

19 vistas
La última modificación se realizó hace 1 hora

19 visits

La última modificación se realizó hace 1 hora

 Agregar capa Compartir

 [Obtener vista previa](#)

☒ Capa sin nombre

Estilos individuales

9 INICIO A

TRANO A.

FINAL A

 INICIO B

2. TRAMO B

FINAL B- INICIO C

 FINAL C

TRAMO C

TRAMO D

FINAL D - INICO E

TRAMO E

FINAL E- INICIO F

TRANS F

FINAL F - INICIO G

2. TRAMO G



FINAL G - INICIO H




2. TRAMO H







FINAL H - INICIO I

1990

Google My Maps

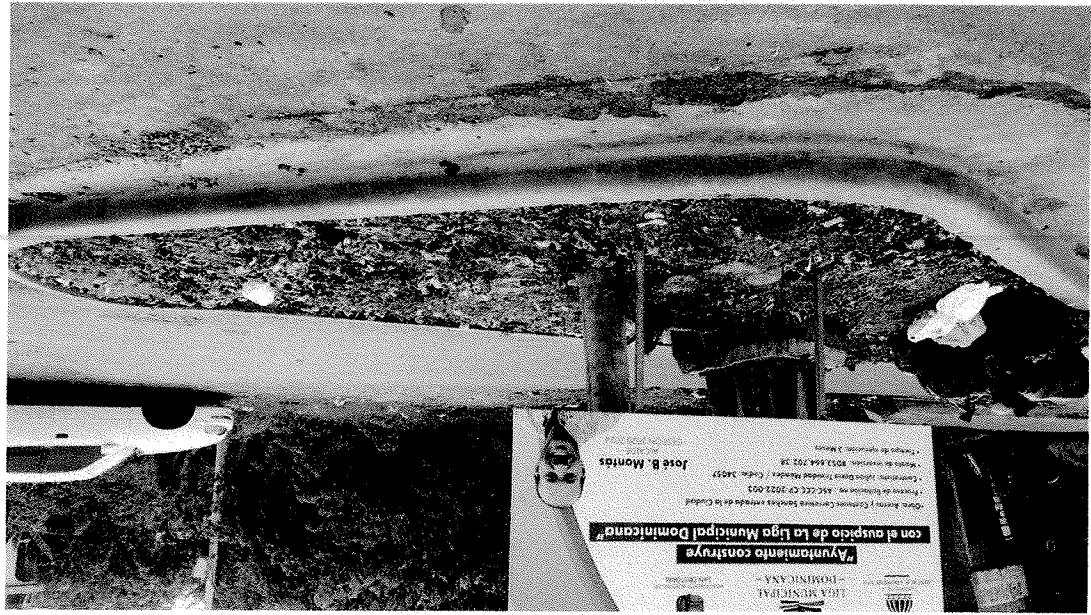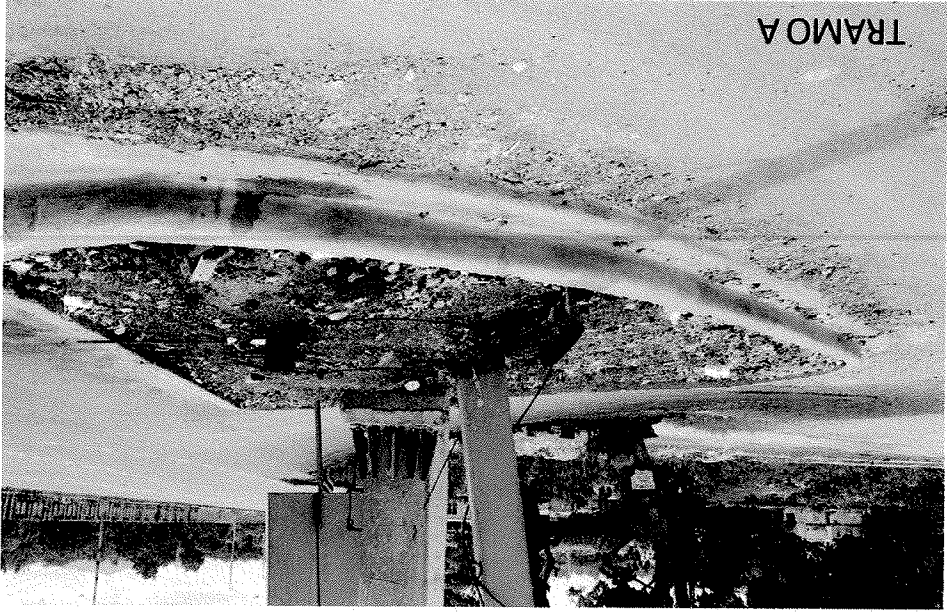


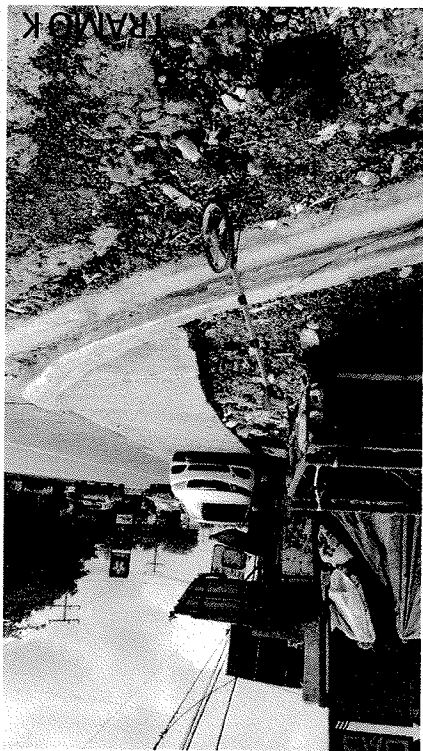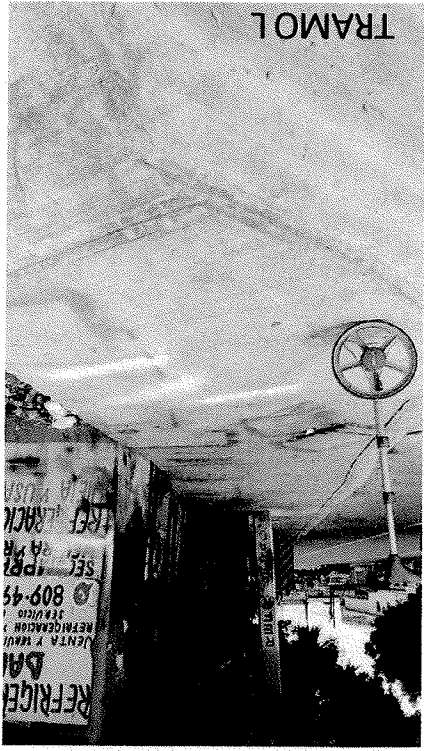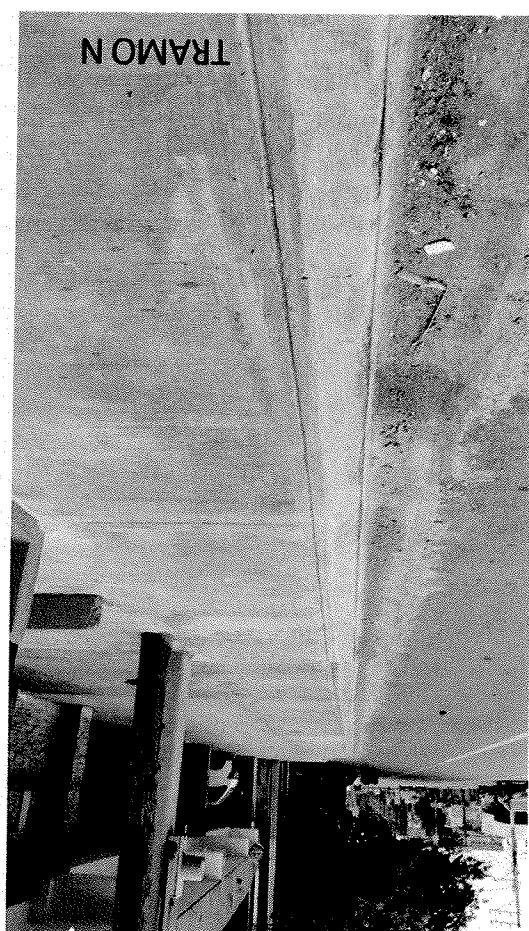

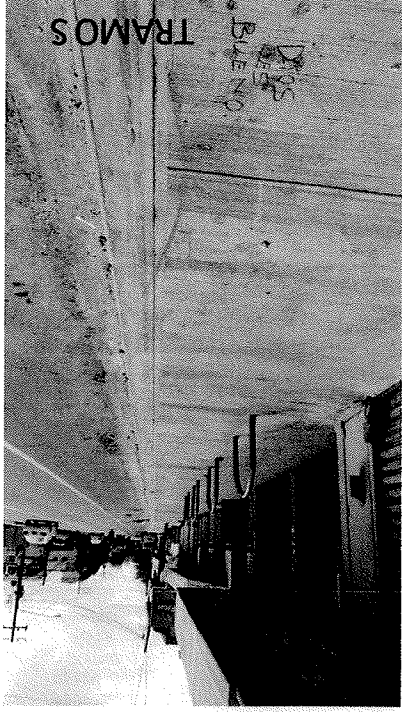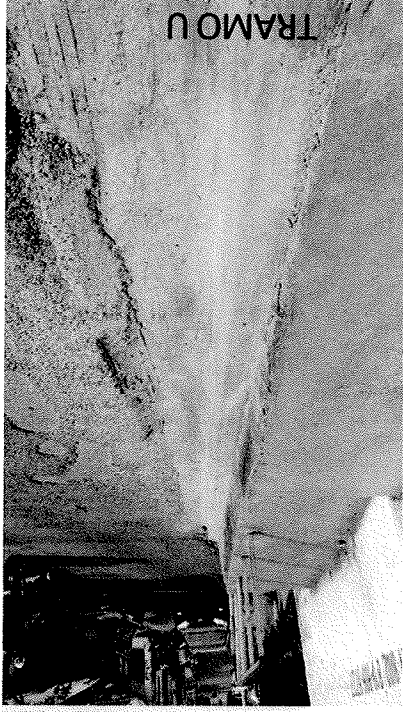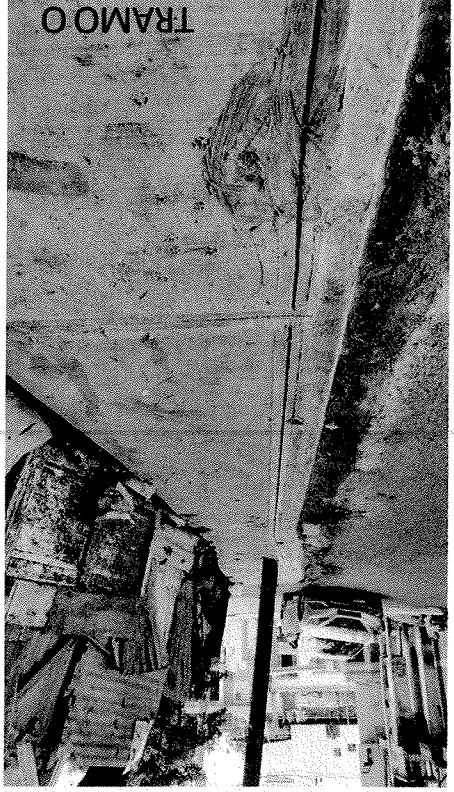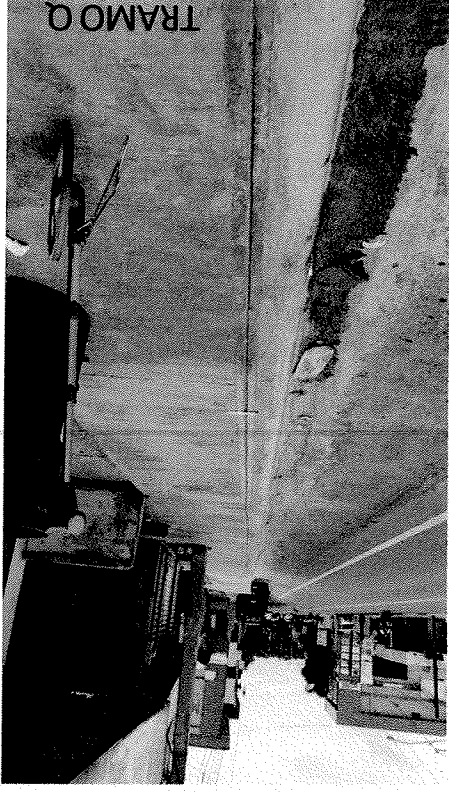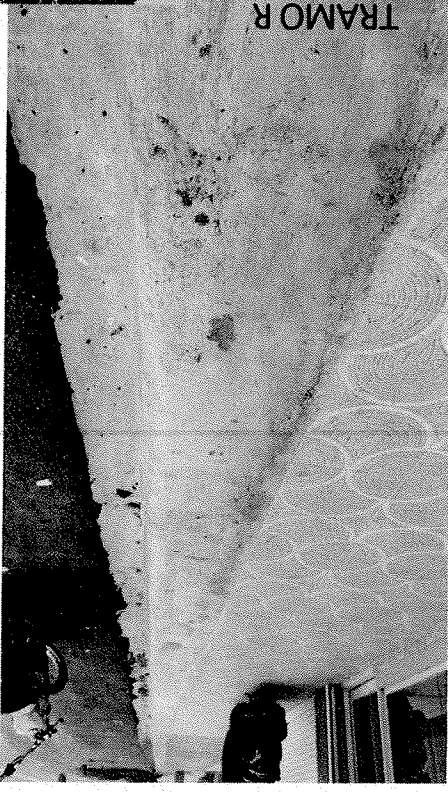



TRAMO Y

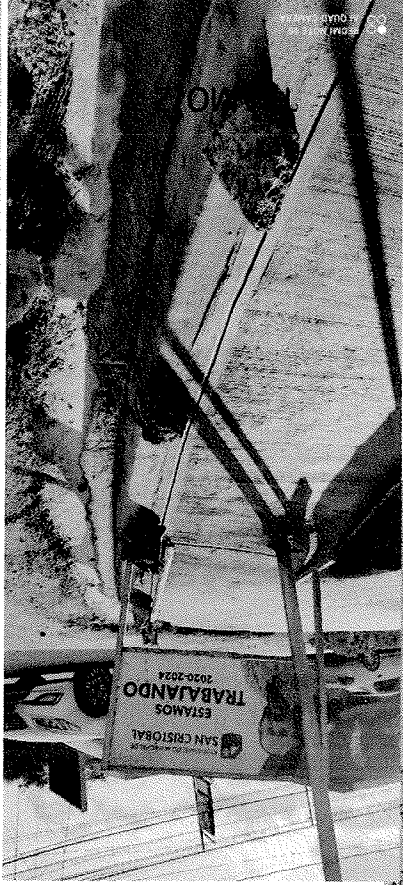

TRAMO Z



TRAMO Y



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA:	SAN CRISTOBAL
MUNICIPIO:	
DISTRITO MUNICIPAL:	CAÑADA HONDA
BARRIO Y/O SECTOR:	

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local	☐
b. Contratista	☒

Razón Social	K-FOUR SERVICIOS MULTIPLES SRL
RNC ó Cédula:	

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes: X
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros:

CONSTRUCCION DE CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		LATITUD	LONGITUD	FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD			LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Calle dos m6pdez (cortavias)	18.39875	-70.11479	18.39895	-70.11512					48.6		48.60
Tramo B		18.399	-70.11525	18.39906	-70.11608					105.60		105.60
Tramo C		18.39911	-70.11613	18.39922	-70.11638					43.60		43.60
Tramo D		18.39919	-70.1164	18.39886	-70.11654					74.60		74.60
Tramo E		18.39897	-70.1167	18.39878	-70.11657					26.70		26.70
Tramo F		18.39853	-70.11682	18.39863	-70.11607					156.20		156.30
Tramo G		18.3986	-70.11607	18.39851	-70.1153					143.00		143
Tramo H		18.39852	-70.11525	18.39874	-70.11487					111.6		111.6
Tramo I	Eucacl 6	18.39897	-70.11519	18.39895	-70.11531				15.70	2.00		710.00mL
Tramo J												
Tramo K												
Tramo L												

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto Participativo**



**PRESUPUESTO : Construcción de Contenes.
UBICACION : Sector Cañada Honda.**

Monto Total RDS: 2.169.468,01

		Fecha 31-10-2022		
No.	Descripción de Partida	Cantidad	Unidad	Valor (RD\$)
1	Preliminares.			
1.1	Replanteo con equipos topograficos	1	PA	22.000,0
1.2	Caseta de materiales.	1	PA	12.000
1.3	Letrero identificación de la obra	1	PA	20.000
1.4	Demonte de palisada existentes	1	PA	20.000
	SUB-TOTAL 1			74.000,00
2	Movimiento de Tierra:			
2.1	Excavacion a Mano material no clasificado	69,08	M³	450,00
2.2	Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado C/maquito	69,08	M³	1.382,00
2.3	Telford (tipo III), a base de H.S y Piedras	18,00	M³	1.780,00
2.4	Bote producto de Excavacion	94,08	M³	450,00
2.5	Demolicion	25,00	M3	500,00
	SUB-TOTAL 2			213.420,84
3	Hormigon Simple en:			
3.1	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f _c = 180 kg/cm², C/ligadora.	690,76	Ml	1.900,00
	SUB-TOTAL 3			1.312.439,07
4	Encache 2.5x17 Mtrs			
4.1	Colocación de piedra de roca, tipo encache de 0.20 a 0.30M	22,51	M2	1.176,47
	SUB-TOTAL 4			26.487,70
5	Limpieza final			
	SUB-TOTAL 5	1	PA	31000
	IMPREVISTOS			31.000,00
1.0	Colocación de piedra de roca, tipo encache de 0.20 a 0.30M	19,99	M2	1.176,47
2.0	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f _c = 180 kg/cm², C/ligadora.	20,39	Ml	1.900,00
3.0	Telford (tipo III), a base de H.S y Piedras	2,00	M³	1.780,00
				3.560,00
	SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS		RDS	1.723.167,60

GASTOS INDIRECTOS			
Dirección Técnica	10,0%		172.316,76
Gastos Administrativos	3,0%		51.695,03
Seguros, Póliza y Fianzas	4,0%		68.926,70
Transporte de Materiales y Equipos	1,0%		17.231,68
Ley 6/86	1,0%		17.231,68
Supervisión	5,0%		86.158,38
ITBIS en base a Dirección Técnica	18,0%		31.017,02
Codia.	0,10%		1.723,17
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		RDS	446.300,41
SUB-TOTAL GENERAL		RDS	2.169.468,01
IMPREVISTOS:			
Imprevistos			
TOTAL GENERAL			2.169.468,01

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde).

Volumetría realizada por:

Revisada Por:

Ing. Andres Yander Santana
Ing. De Presupuesto, AMSC

Arq. Emilia Sarmiento Minier
Directora de Obras Públicas Municipales, AMSC

SAN CRISTOBAL CAÑADA HONDA

SECUENCIA DE TRAMOS

- | INICIO A | TRAMO A | FINAL A | INICIO B | TRAMO B | FINAL B | INICIO C | TRAMO C | FINAL C | INICIO D | TRAMO D | FINAL D | FINALE | INICIO E | INICIO F | TRAMO F | FINAL F | TRAMO E | INICIO G | TRAMO G | FINAL G | INICIO H | FINAL H | TRAMO H |
|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|
|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|



C. Teo Cruz



Helados
Helado




TRAMO C



TRAMO D

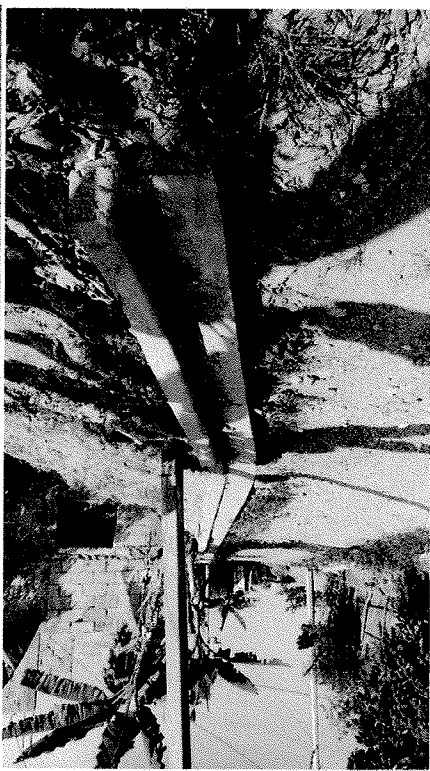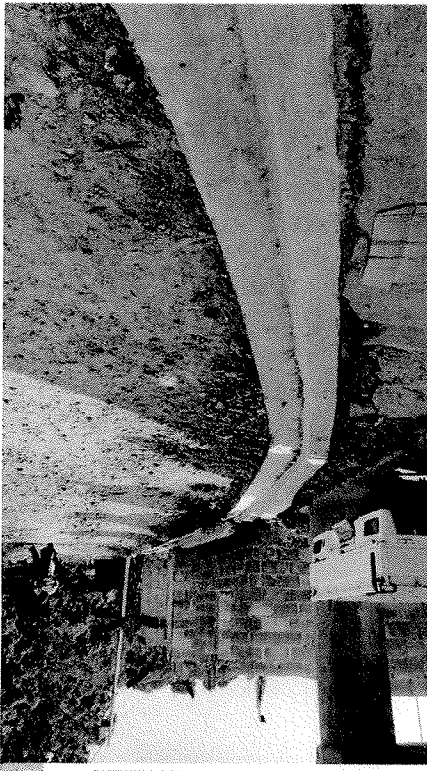

TRAMO E

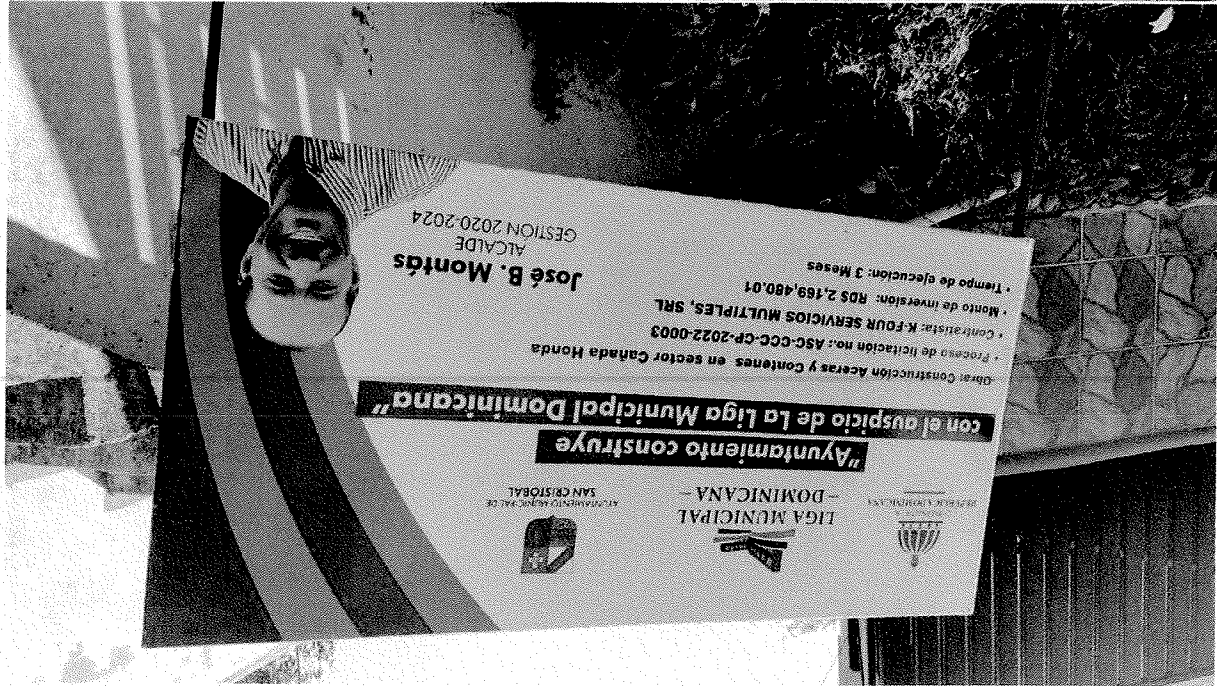


TRAMO A





ENCACHE DE PIEDRA





TRAMO F

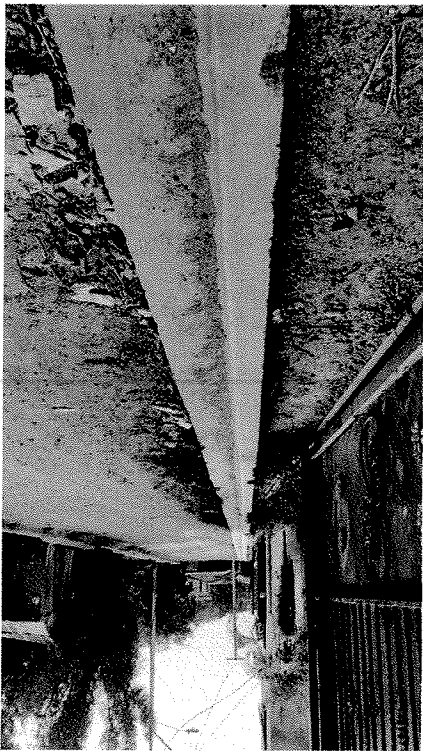

TRAMO G

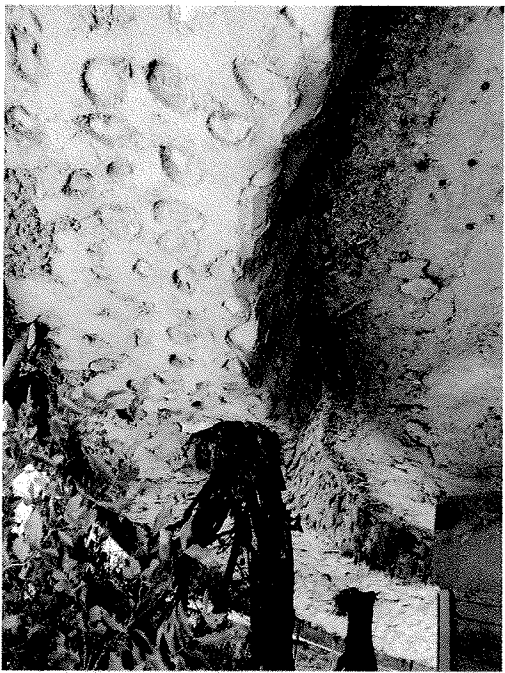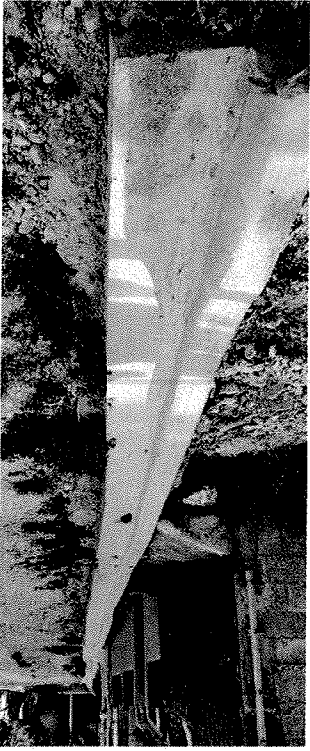

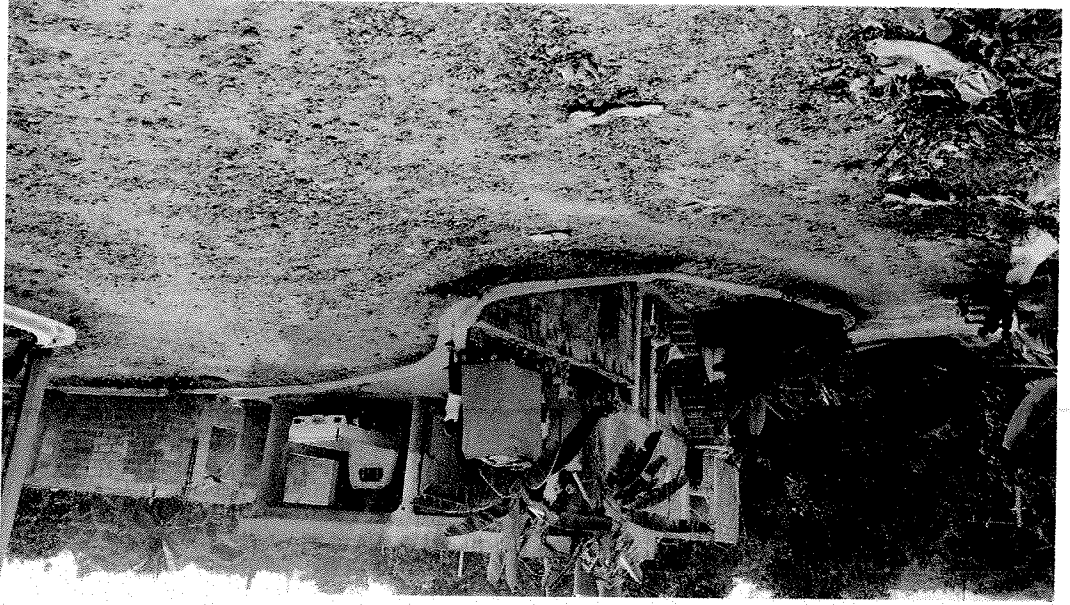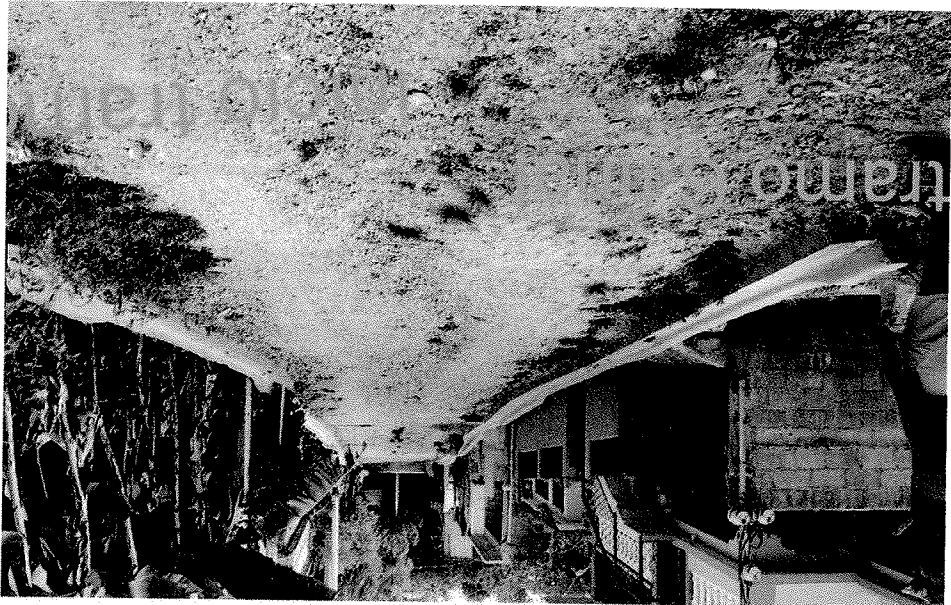

VISTA GENERAL



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA:	SAN CRISTOBAL
MUNICIPIO:	
DISTRITO MUNICIPAL:	CALLE O AVENIDA LIBERTAD
BARRIO Y/O SECTOR:	

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local	☐
b. Contratista	☒

Razón Social	ANNICHELMÍ CONSTRUCTORA
RNC ó Cédula:	

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes: X
- b. Incluye demoliciones de tramos: X
- c. Incluye badenes: X
- d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		LATITUD	LONGITUD	FINAL		LONGITUD DE LA ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
Tramo A	Calle Libertad	18.41407	-70.10651	18.41408	-70.10641			10.80	5.35	15.00	53.37	15.00
Tramo B		18.41408	-70.10641	18.41427	-70.10649	27.60	4.20	27.60	11.50	27.60	107.1	27.60
Tramo C		18.41461	-70.107	18.41475	-70.10677	29.60	3.50	29.60	11.50	29.60	103.60	29.60
Tramo D		18.41475	-70.10677	18.41519	-70.10704	57.00	5.05	57.00	11.50	59.00	294.62	59.00
Tramo E		18.41526	-70.10713	18.41569	-70.10733	50.00	4.30	54.00	11.50	54.00	193.00	54.00
Tramo F		18.41569	-70.10733	18.41578	-70.10738	22.16	7.60	14.00	11.50	84.81	14.00	14.00
Tramo G		18.41578	-70.10738	18.41578	-70.10745	5.30	3.20	7.00	11.50	16.96	7.00	7.00
Tramo H		18.41578	-70.10754	18.41587	-70.10743	14.40	2.92	18.00	11.50	42.04	18.00	18.00
Tramo I		18.41587	-70.10743	18.41597	-70.10749	15.30	5.10	19.30	11.50	69.23	19.30	19.30
Tramo J		18.4162	-70.1076	18.41633	-70.10767	16.2	5.00	26.00	11.50	72.20	26.00	26.00
Tramo K	Calle Suñiz Hdz	18.41636	-70.10773	18.41639	-70.1077	5.00	1.60	5.00	11.50	8.00	8.00	5.00
Tramo L	Calle Libertad	18.41639	-70.1077	18.41681	-70.10795	52.7	5.40	57.00	11.50	271.38	57.00	57.00

-Agregar ancho kerb frame F

Detalle Jardineras (2.10x2.10x0.50 m altura)

Jardinería faja 10 → (5) 2.90 x 3.40

total Areas
3.701.34 m²

- (4) total construcion jardinerias → 52 unidades
(5) total Repanado y Pinta jardinerias → 5 unidades
(6) total m² Bader
(7) total copetes [m²] → 783.60 m²
(8) total Areas Pajada → 1,113.44 m²
(9) total Areas lisa → 2,588.90 m²

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		LONGITUD	LATITUD	FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m ²)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LONGITUD	LATITUD			LONGITUD	LATITUD					
Tramo M	11	18.41692	-70.10806	18.41729	-70.10829							
Tramo N	11	18.41749	-70.10842	18.41785	-70.10862							
Tramo O	11	18.41809	-70.10875	18.41836	-70.10893							
Tramo P	11	18.41846	-70.10872	18.41745	-70.10813							
Tramo Q	11	18.41745	-70.10813	18.41732	-70.10806							
Tramo R	11	18.41732	-70.10806	18.41725	-70.10795							
Tramo S	11	18.41592	-70.10723	18.41567	-70.10708							
Tramo T	11	18.41567	-70.10708	18.41534	-70.10688							
Tramo U	11	18.41534	-70.10688	18.41477	-70.10654							
Tramo V	11	18.41477	-70.10654	18.41433	-70.10625							
Tramo W	11	18.41433	-70.10625	18.41407	-70.10603							
Tramo X	(Bader)											

Ya calculada no
fomar en la
Solo para desear



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto administrativo

PRESUPUESTO : Aceras, contenes
UBICACION : Avenida Libertad

Monto Total RD\$: 13,512,098.90

Fecha 31-10-2022					
No	Descripcion	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)
1	Preliminares				
1.1	Caseta de Materiales	1.00	P.A	15,000.00	15,000.00
1.2	Replanteo topográfico.	1.00	P.A	20,000.00	20,000.00
1.3	Letrero Identificación de Obra.	1.00	P.A	45,000.00	45,000.00
1.4	Letrero (pequeño) Identificación de Obra	2.00	P.A	10,000.00	20,000.00
	SUB-TOTAL 1				100,000.00
2	Movimiento de Tierra:				
2.1	Excavacion a Mano material no clasificado	91.00	M³	400.00	36,400.00
2.2	Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado C/maquilo	91.00	M³	1,390.00	126,490.00
2.3	Telford (tipo III), a base de H.S y Piedras	60.00	M³	1,781.25	106,875.00
2.4	Bote producto de Excavacion	1,035.61	M³	450.00	466,024.50
2.5	Demolicion	944.61	M3	500.00	472,305.00
2.6	Demolicion de jardinera	54.00	M3	1,100.00	59,400.00
2.7	Bote de material demolido en jardinera	65.34	M3	450.00	29,403.00
	SUB-TOTAL 2				1,296,897.50
3	Hormigon Simple en:				
3.1	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm², C/ligadora.	910.00	M1	1,908.50	1,736,735.00
3.2	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts, a = 1.0 m	2,188.90	M2	1,079.53	2,362,983.22
3.2	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts, a = 1.0 m (Ranurada)	3,186.04	M2	1,179.00	3,756,335.95
	SUB-TOTAL 3				7,856,054.16
4	Limpieza Final y Bote				
	SUB-TOTAL 4	1.00	P.A	20,000.00	20,000.00
5	Construccion de jardinera cuadrada (2mx2m)				
5.1		52.00	M3	23,000.00	1,196,000.00
	SUB-TOTAL 5				1,196,000.00
6	Retiro de valla sobre acera				
6.1	Retiro de valla sobre acera	1.00	PA	6,000.00	6,000.00
	SUB-TOTAL 6				6,000.00
7	Reparacion y materiales de averia de aguas potables y aguas negras				
7.1	Reparacion y materiales de averia de aguas potables y aguas negras	1.00	PA	80,000.00	80,000.00
	SUB-TOTAL 7				80,000.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**
Presupuesto administrativo



PRESUPUESTO : Aceras, contenes

UBICACION : Avenida Libertad

Monto Total RDS: 13,512,098.90

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)	Fecha 31-10-2022
8	colocación de franja de asfalto					
8.1	colocación de franja de asfalto	1.00	PA	60,000.00	60,000.00	
	SUB-TOTAL 8				60,000.00	
9	Resanamiento y pintura de bancos en las aceras					
9.1	Resanamiento y pintura de bancos en las aceras	1.00	PA	75,000.00	75,000.00	
	SUB-TOTAL 9				75,000.00	
	SUB-TOTAL GENERAL RDS				10,689,951.66	
	GASTOS INDIRECTOS					
	Dirección Técnica					
	Gastos Administrativos	10.00%			1,068,995.17	
	Seguros, Poliza y Fianzas	3.00%			320,698.55	
	Transporte de Materiales y Equipos	4.00%			427,598.07	
	Ley 6786	1.00%			106,899.52	
	Codia	1.00%			106,899.52	
	Supervision	0.10%			10,689.95	
	ITBIS en base a Dirección Técnica	5.00%			53,449.76	
		18.00%			192,419.13	
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				2,287,649.66	
	TOTAL GENERAL				12,977,601.32	
	Imprevistos	5.00%			534,497.58	
	TOTAL A CONTRATAR RDS				13,512,098.90	

Nota 1: La Partida Seguros, Polizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.
Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde).

Volumetría realizada por:

Revisada Por:

Ing. Andres Yander Santana
Ing. De Presupuesto, AMSC

Arq. Emilia Sarmiento Minier
Directora de Obras Públicas Municipales, AMSC

[illegible]

INICIO A	TRAMO A	FINAL A - INICIO B	FINAL B	TRAMO B	INICIO C	TRAMO C	FINAL C - INICIO D	FINAL D	TRAMO D	INICIO E	TRAMO E	FINAL E - INICIO F	FINAL F - INICIO G	TRAMO F	TRAMO G	FINAL G	INICIO H	TRAMO H	FINAL H - INICIO I	FINAL I	TRAMO I	INICIO J	TRAMO J	FINAL TRAMO J	INICIO K	TRAMO K	FINAL K - INICIO L	FINAL L	TRAMO L
----------	---------	--------------------	---------	---------	----------	---------	--------------------	---------	---------	----------	---------	--------------------	--------------------	---------	---------	---------	----------	---------	--------------------	---------	---------	----------	---------	---------------	----------	---------	--------------------	---------	---------

JARDINERO SOLO PINTURA
JARDINERA SOLO PINTURA
JARDINERA SOLO PINTURA
JARDINERA SOLO PINTURA
JARDINERA SOLO PINTURA

JARDINERA CONSTRUCCION

JARDINERA CONSTRUCCION

JARDINERA CONSTRUCCION

JARDINERA CONSTRUCCION

JARDINERA CONSTRUCCION

INICIO O

FINAL TRAMO O

TRAMO O

INICIO P

TRAMO P

FINAL P - INICIO Q

TRAMO Q

FINA Q - INICIO R

TRAMO R

FINAL R

INICIO S

TRAMO S

FINAL S - INICIO T

TRAMO T

FINAL T - INICIO U

TRAMO U


FINAL U - INICIO V

TRAMO V

FINAL V - INICIO W

FINAL W- INICIO X

TRAMO W

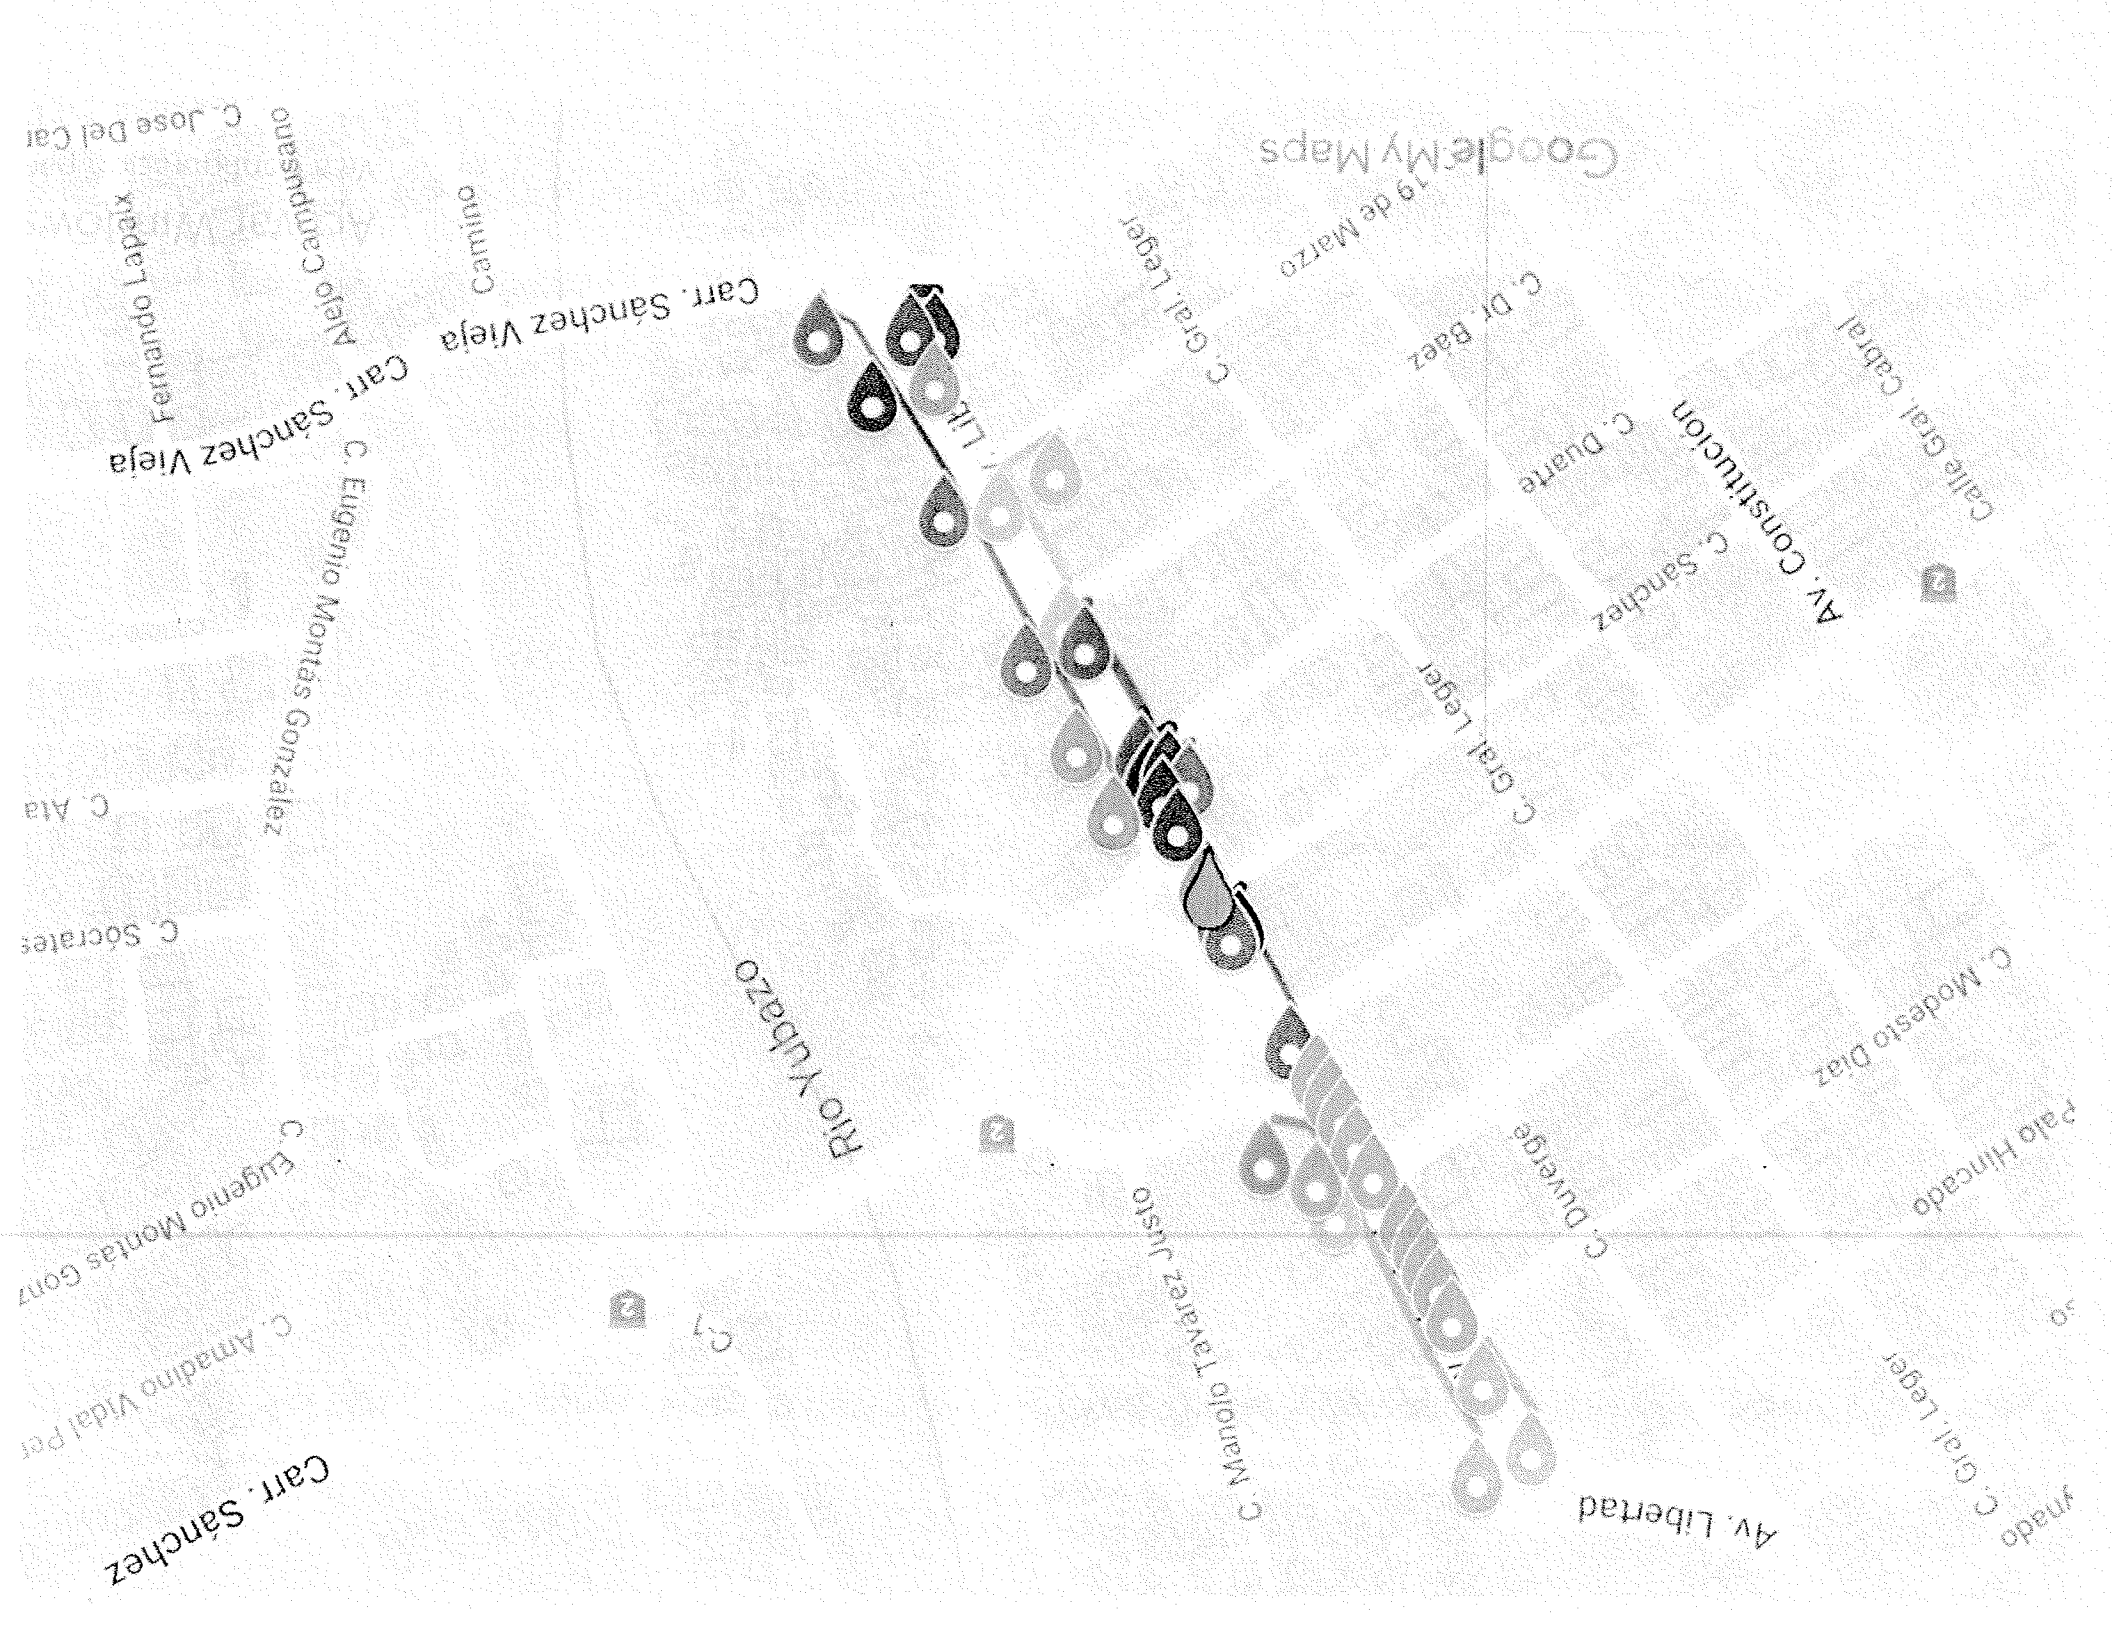



REPUBLICA DOMINICANA

LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SAN CRISTÓBAL


**"Ayuntamiento construye
con el auspicio de la Liga Municipal Dominicana"**

obra: Rescontrucciones aceras y cortenos avenida libertad, S.C.
ocoso de Licitación no.: Código ayuntamiento- ASC-CCC-CP-2023-0001
ntralista: Annchelmi Constructora
nto de inversión: \$13,491,785.55
mpo de ejecución: 90 días


José Montás
ALCALDE
GESTIÓN 2020-2024






TRAMO A

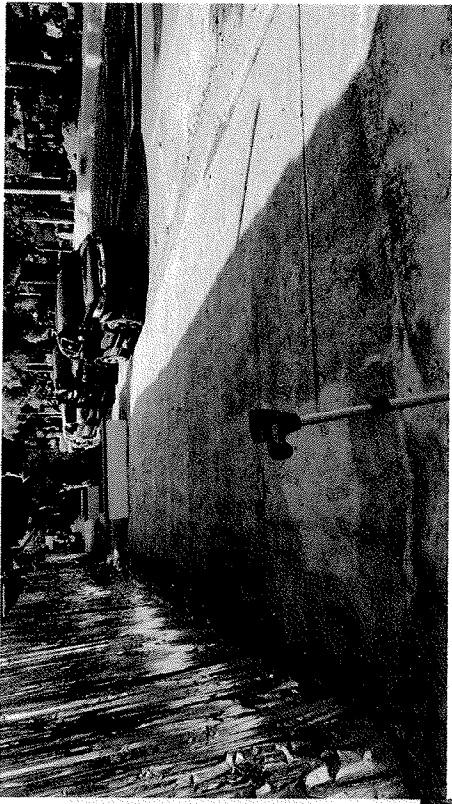


TRAMO B

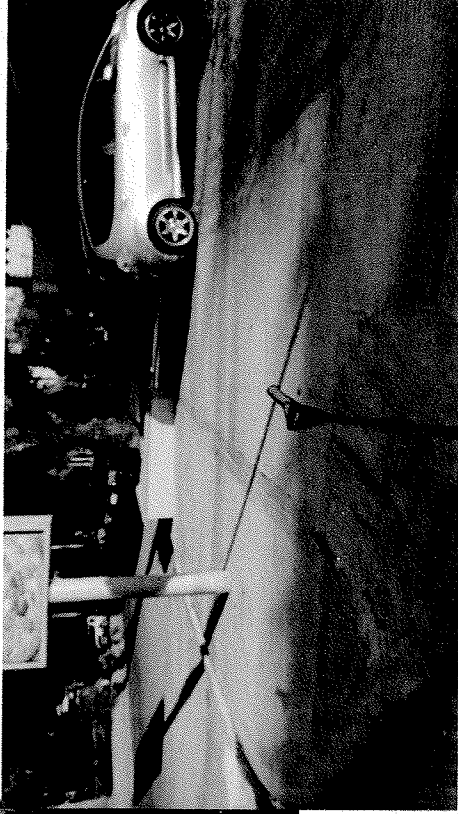

FINAL TRAMO D

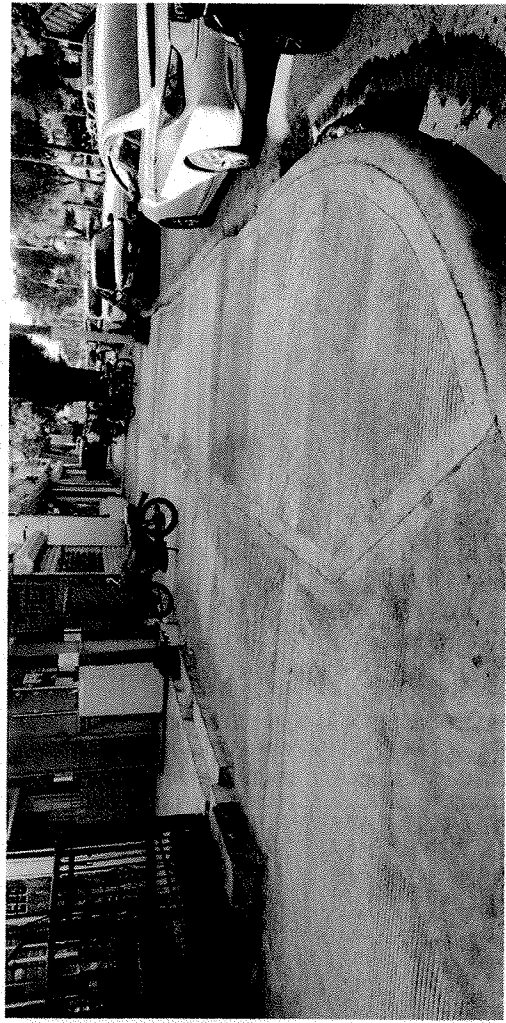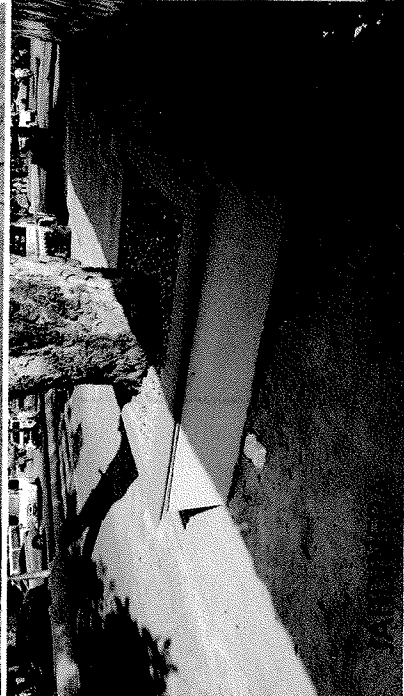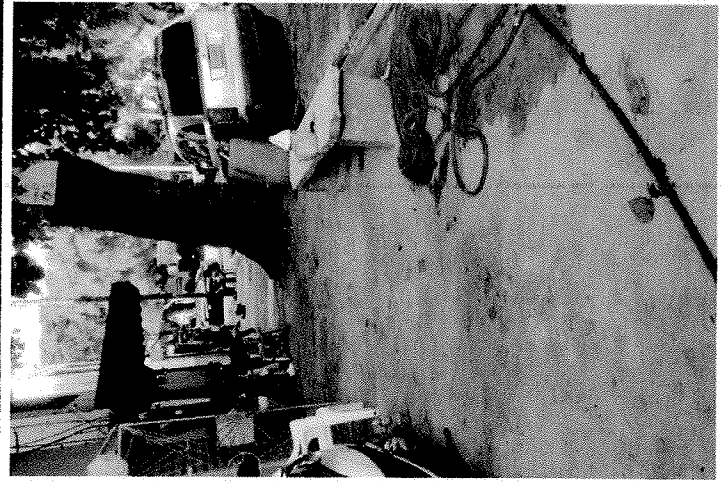


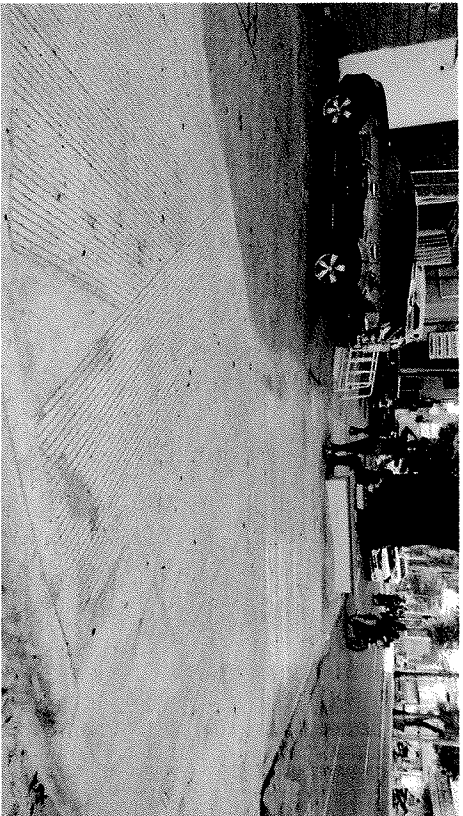




TRAMOE




TRAMOF

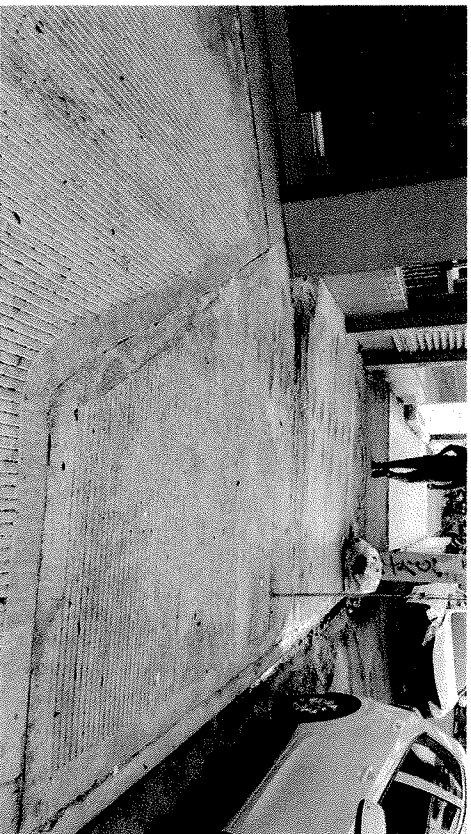


TRAMOG

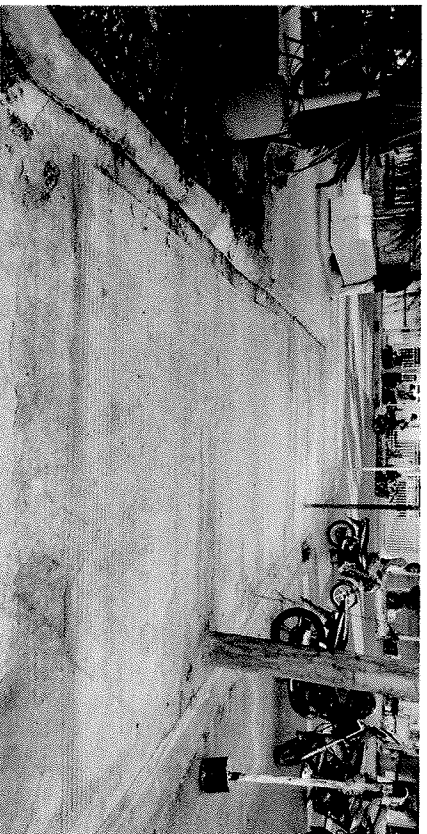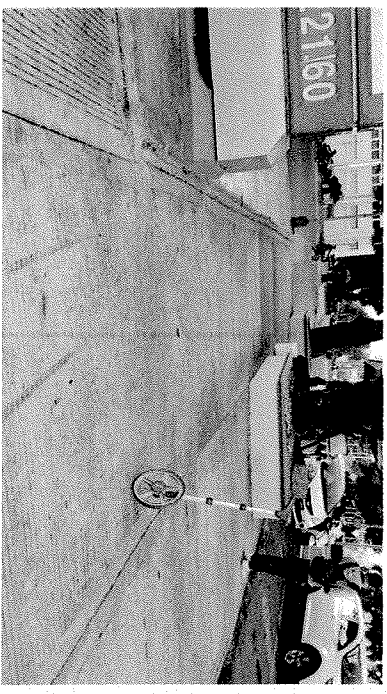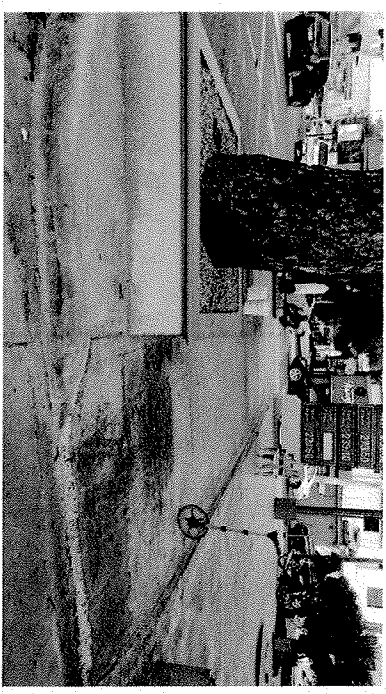

FINALG

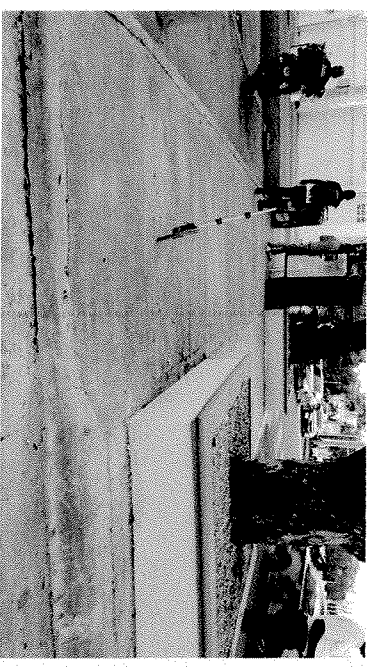


FINALJ

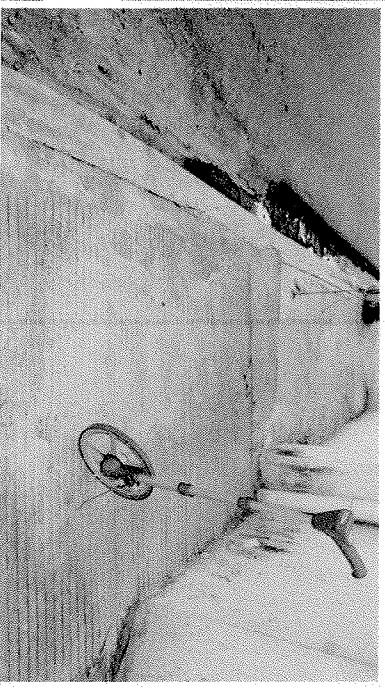


FINALK




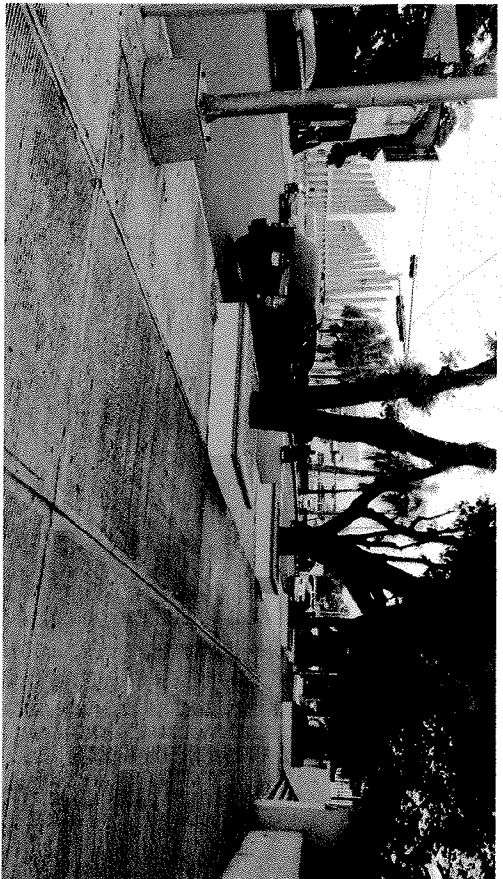

TRAMO M

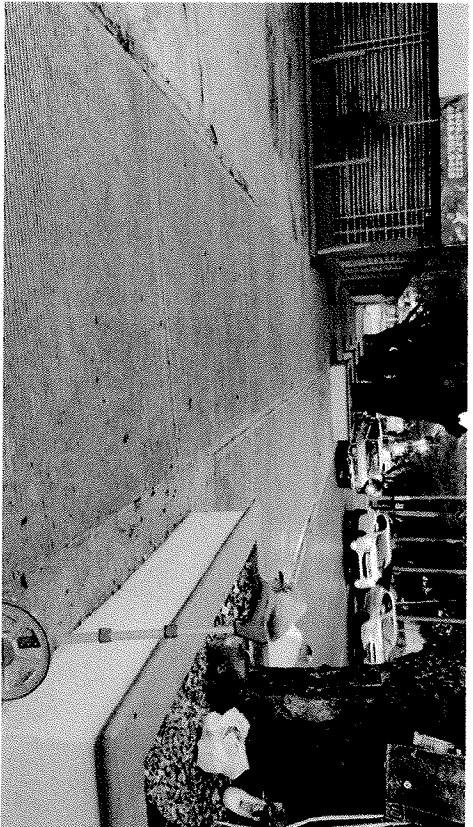


TRAMO N

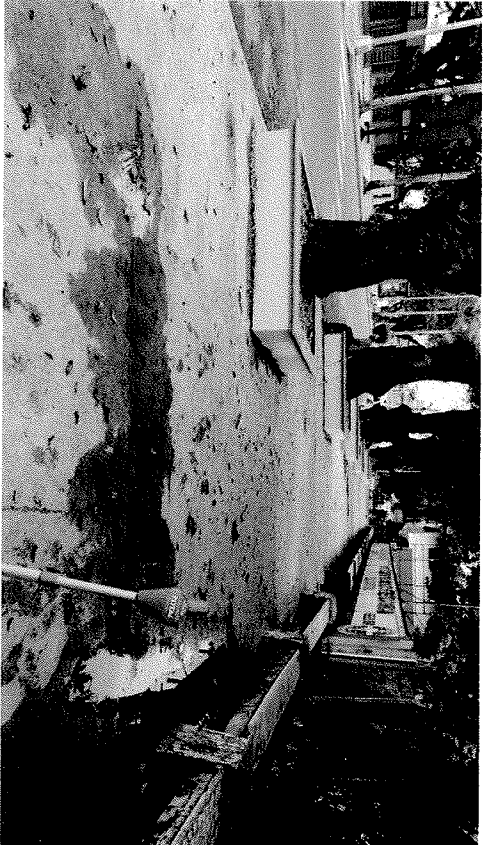

FINAL TRAMO P INICO Q



TRAMO O

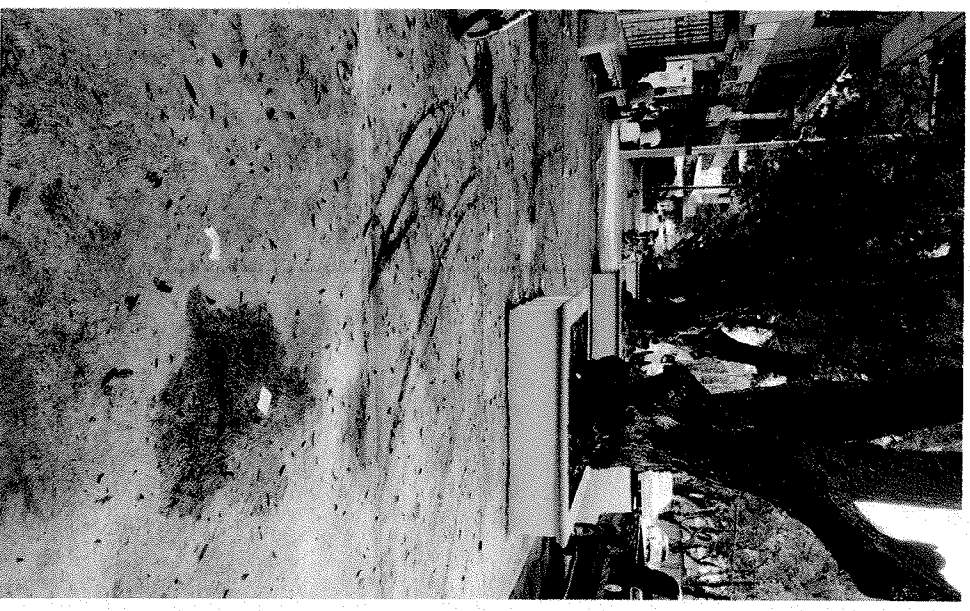

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- ①- Se observa irregularidad en Aguas Terminaciones por razón de el alto tránsito en la zona.
 - ②- Comple con el espesor y calidad de construcción
 - ③- Este presupuesto esta devaluado por cambio de diseño en Aguas Areas que el presupuesto estaba lista y se construyeron gran parte del presupuesto con Acera rayada.
- 6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR**
- Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Alis Mercedes Lopez

CÉDULA:

4108-2112386-8


CODIA:

35877

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

15/05/2022

Valida y aprueba los datos suministrados,



Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal
