



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 210102
REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL
MUNICIPIO: SAN CRISTÓBAL
DISTRITO MUNICIPAL: HATO DAMAS

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 20 de junio de 2023
1. Ing. Ana Indhira Ramírez
2. Ing. Staylin Mendoza

TÉCNICOS:

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Carretera principal hato damas	529.90	1.10	1.00	551.10	1.00	582.89	551.10
TRAMO B	SE. BORUGA (CARRETERA MEDINA HASTA EL PUENTE NIGUA)	532.00	1.35	1.00	532.00	1.00	718.20	532.00
Total							1,301.09	1,083.10

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,330,344.79
Monto desembolsado RD\$ 4,330,344.80 (100%)
Avance de obra 103.08%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 20 de junio de 2023

PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL

MUNICIPIO: SAN CRISTÓBAL

DISTRITO MUNICIPAL: HATO DAMAS


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,301.09 metros cuadrados de aceras y 1,083.10 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. Los trabajos están siendo ejecutados por contrato
2. Las aceras y contenes tiene buena terminación
3. Cumplen con los parametros de la LMD

IMÁGENES

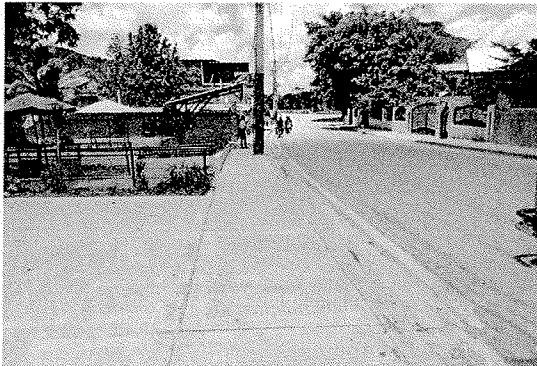





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

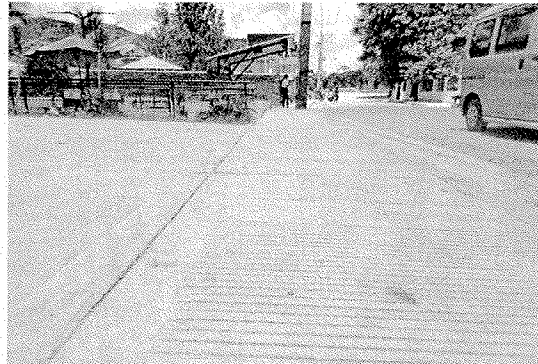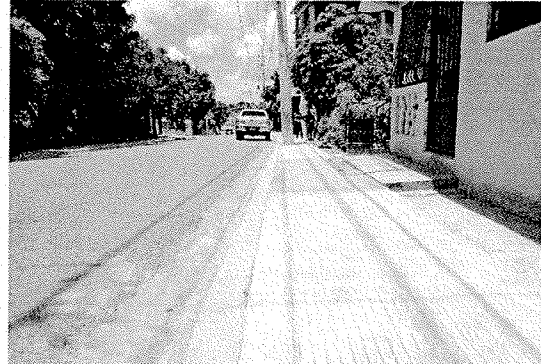

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico


ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico
