



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 220201
REGIÓN: EL VALLE
PROVINCIA: SAN JUAN
MUNICIPIO: BOHECHÍO
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 20 de junio de 2023
TÉCNICOS: 1. Arq. Keilin Mora
2. Ing. Danilo Mercado

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CARR. PADRE LAS CASAS-BOHECHIO	7.90	2.90	1.00			22.91	
TRAMO B	CARR. PADRE LAS CASAS-BOHECHIO	14.20	3.75	1.00			53.25	
TRAMO C	CARR. PADRE LAS CASAS-BOHECHIO	8.30	2.30	1.00			19.09	
TRAMO D	CARR. PADRE LAS CASAS-BOHECHIO	45.70	2.25	1.00	270.30	1.00	102.83	270.30
TRAMO E	CARR. PADRE LAS CASAS-BOHECHIO	22.30	1.20	1.00			26.76	
TRAMO F	CARR. BOHECHIO-ARROYO CANO				129.30	1.00		129.30
TRAMO G	CARR. BOHECHIO-ARROYO CANO				83.80	1.00		83.80
TRAMO H	CARR. BOHECHIO-ARROYO CANO	280.50	1.20	1.00	310.90	1.00	336.60	310.90
TRAMO I	CARR. BOHECHIO-ARROYO CANO	134.60	1.14	1.00	134.60	1.00	153.44	134.60
TRAMO J	CARR. PADRE LAS CASAS-BOHECHIO	11.50	1.95	1.00			22.43	



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO K	CARR. PADRE LAS CASAS-BOHECHIO	24.20	0.40	1.00			9.68	
TRAMO L	CARR. PADRE LAS CASAS-BOHECHIO	35.30	1.43	1.00			50.60	
TRAMO M	CARR. PADRE LAS CASAS-BOHECHIO	120.80	0.50	1.00			60.40	
TRAMO N	CARR. PADRE LAS CASAS-BOHECHIO	7.00	1.73	1.00			12.08	
TRAMO O	CARR. PADRE LAS CASAS-BOHECHIO	104.76	0.82	1.00			85.90	
Total							955.96	928.90

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,866,210.44
 Monto desembolsado RD\$ 1,433,105.22 (50%)
 Avance de obra 122.32%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 2 de marzo de 2023

PROVINCIA: SAN JUAN

MUNICIPIO: BOHECHÍO

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 955.96 metros cuadrados de aceras y 928.90 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. La obra realizó por Contrato.
2. El proyecto cumple con los estándares de calidad recomendados por el programa.
3. Realizaron obras complementarias como: paso peatonal, reparación de cunetas, pavimentación en mampostería en bordes de calles hacia un arroyo.

IMÁGENES

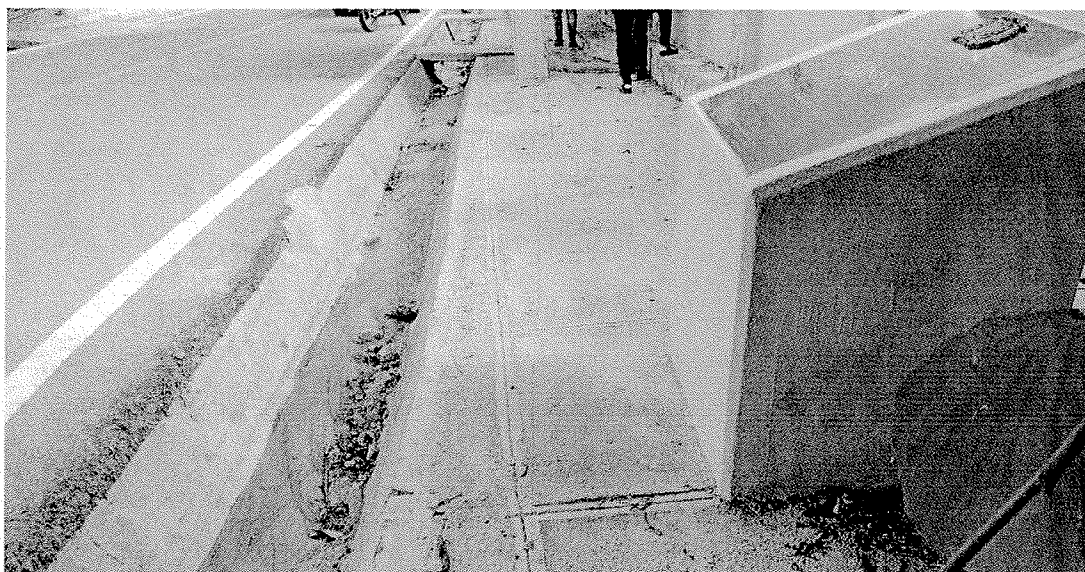




LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

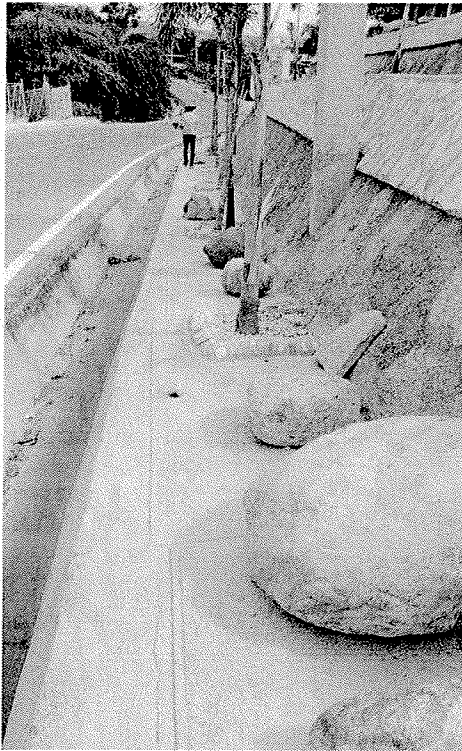

Suministra los datos de este reporte,


ARQ. KEILIN MORA
Técnico


ING. DANILO MERCADO
Técnico
