

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

Santo Domingo, D.N.
01 de junio de 2023

Al:

Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía:

Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto:

Remisión de informe de cierre de ejecución San José de las Matas (Sajoma)

En la visita técnica realizada el 23 de marzo del 2023 se validó la ejecución de 1,475.54 metros cuadrados de aceras y 1,958.83 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 1091.25 metros cuadrados de aceras y 546.00 metros lineales de contenes y en una segunda visita válido la ejecución de 694.36 metros cuadrados de aceras y 841.58 metros lineales de contenes con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 3,261.15 metros cuadrados de acera y 3,346.41 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 250501

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: SANTIAGO

MUNICIPIO: SAN JOSÉ DE LAS MATAS

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 23 de marzo de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Staylin Mendoza
2. Arq. Zunilda Del Rosario

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CARRETERA INOA (REF. JUNQUITO GAS)	36.10	0.90	1	36.10	1	32.49	36.1
TRAMO B	CARRETERA INOA	263.40	1.00	1	271.90	1	263.4	271.9
TRAMO C	CARRETERA INOA			1	32.65	1	0	32.65
TRAMO D	CARRETERA INOA			1	54.58	1	0	54.58
TRAMO E	CARRETERA INOA			1	183	1	0	183
TRAMO F	AV. EL VERDUN INT. MARIA JOSEFA				12	1		12
TRAMO G	AV. EL VERDUN INT. MARIA JOSEFA				27	1		27
TRAMO H	AV. EL VERDUN INT. MARIA JOSEFA				101.9	1		101.9
TRAMO I	AV. EL VERDUN INT. MARIA JOSEFA				134.4	1		134.4
TRAMO J	BOTONCITO (CRUCE DE GUAJACA, LADO DERECHO)	144.4	1.00	1				
TRAMO K	BOTONCITO (CRUCE DE GUAJACA, LADO DERECHO)	46.00	0.92	1	46	1	42.32	46
TRAMO L	BOTONCITO (CRUCE DE GUAJACA, LADO DERECHO)	50.20	1.00	1	50.2	1	50.2	50.2
TRAMO M	BOTONCITO (CRUCE DE GUAJACA, LADO DERECHO)	36.50	1.00	1	48.1	1	36.5	48.1
TRAMO N	BOTONCITO (CRUCE DE GUAJACA, LADO DERECHO)	44.30	1.15	1	44.3	1	50.945	44.3
TRAMO O	BOTONCITO (CRUCE DE GUAJACA, LADO DERECHO)	156.10	1.00	1	127	1	156.1	127



LIGA MUNICIPAL – DOMINICANA –

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO P	GUAJACA	67.00	1.00	1	8.7	1	67	8.7
TRAMO Q	CARRECTERA INOA	304.60	1.03	1	340.6	1	312.215	340.6
TRAMO R	CARRECTERA INOA	411.50	1.08	1	411.5	1	442.3625	411.5
TRAMO S	ENTRADA LA QUEBRADITA	14.45	0.76	2	14.45	2	22.0025	28.9
Total							1475.54	1958.83

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 5,193,207.97
Monto desembolsado RD\$ 5,193,207.98 (100%)
Avance de obra 130.54%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 23 de marzo de 2023

PROVINCIA: SANTIAGO

MUNICIPIO: SAN JOSÉ DE LAS MATAS

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,475.54 metros cuadrados de aceras y 1,958.83 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.


NOTAS

1. En esta visita se fue a completar el metraje del programa.
2. Tanto las aceras como los contenes presentan muy buena terminación.
3. El relleno en las aceras fueron de 0.15 cm de espesor.




IMÁGENES

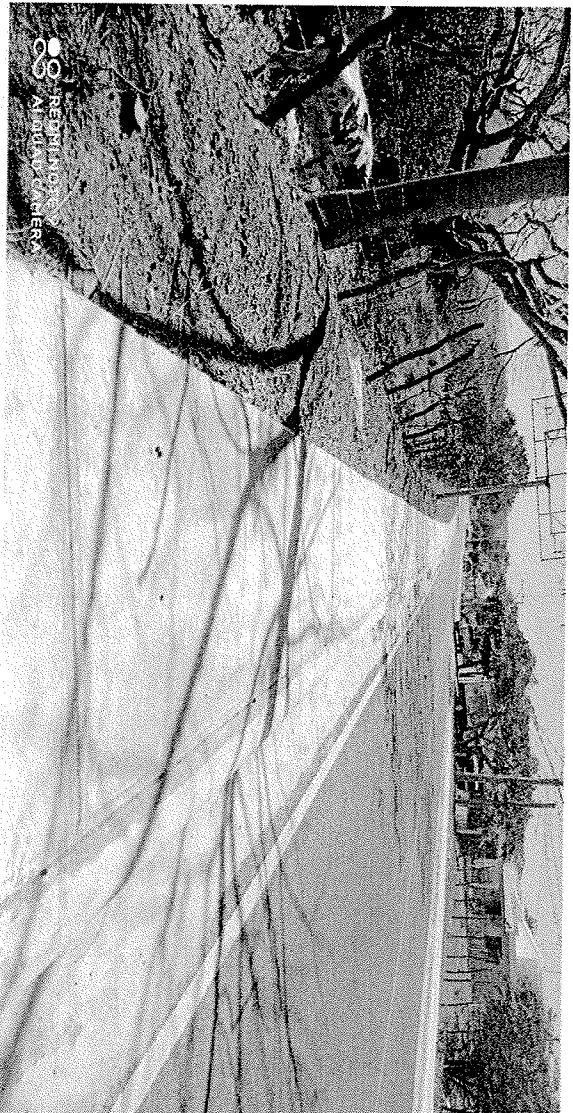


REGISTRADO
ALFARO CÁMERA




LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

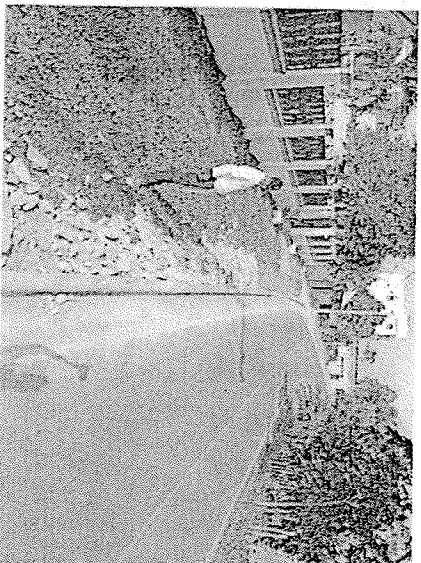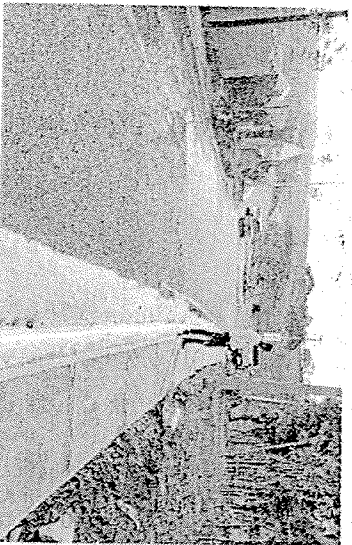



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

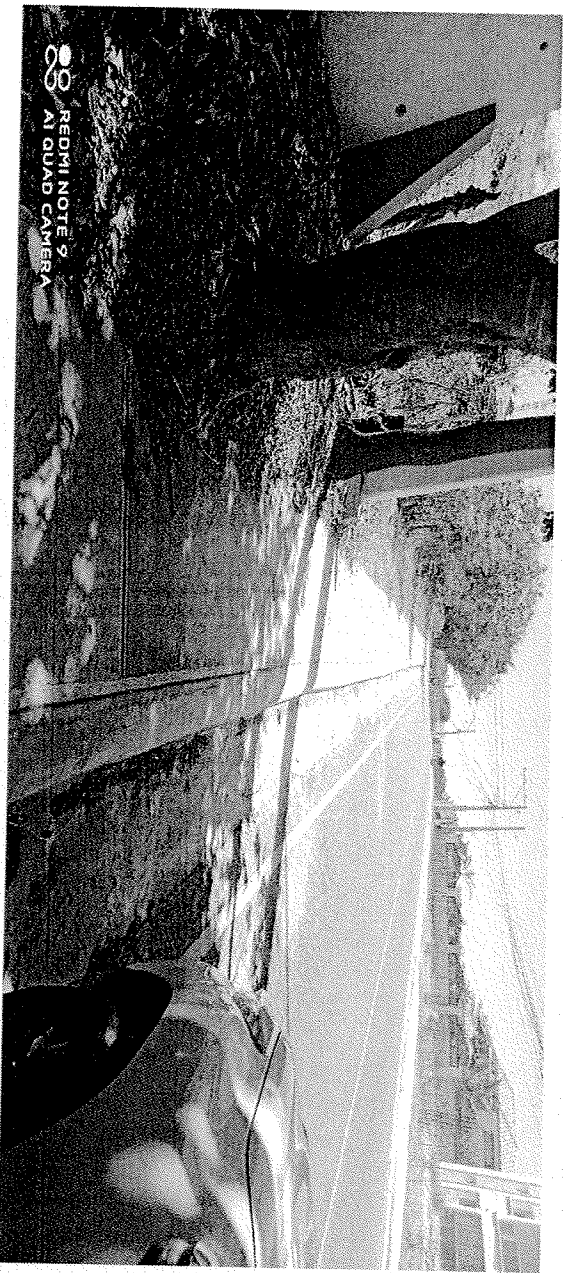


Suministra los datos de este reporte,

Ing. Staylin M.
ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico

Arq. Zunilda Del Rosario
ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO
Técnico





**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA:	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
MUNICIPIO:	SAN JOSE DE LAS MATAS (SAJOMA)
DISTRITO MUNICIPAL:	
BARRIO Y/O SECTOR:	INOA

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local	☒
b. Contratista	☐

Razón Social	SALOMON PEREZ RAMIREZ
RNC ó Cédula:	080-0001305-5

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes: ☒
- d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES NUEVOS
--

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.


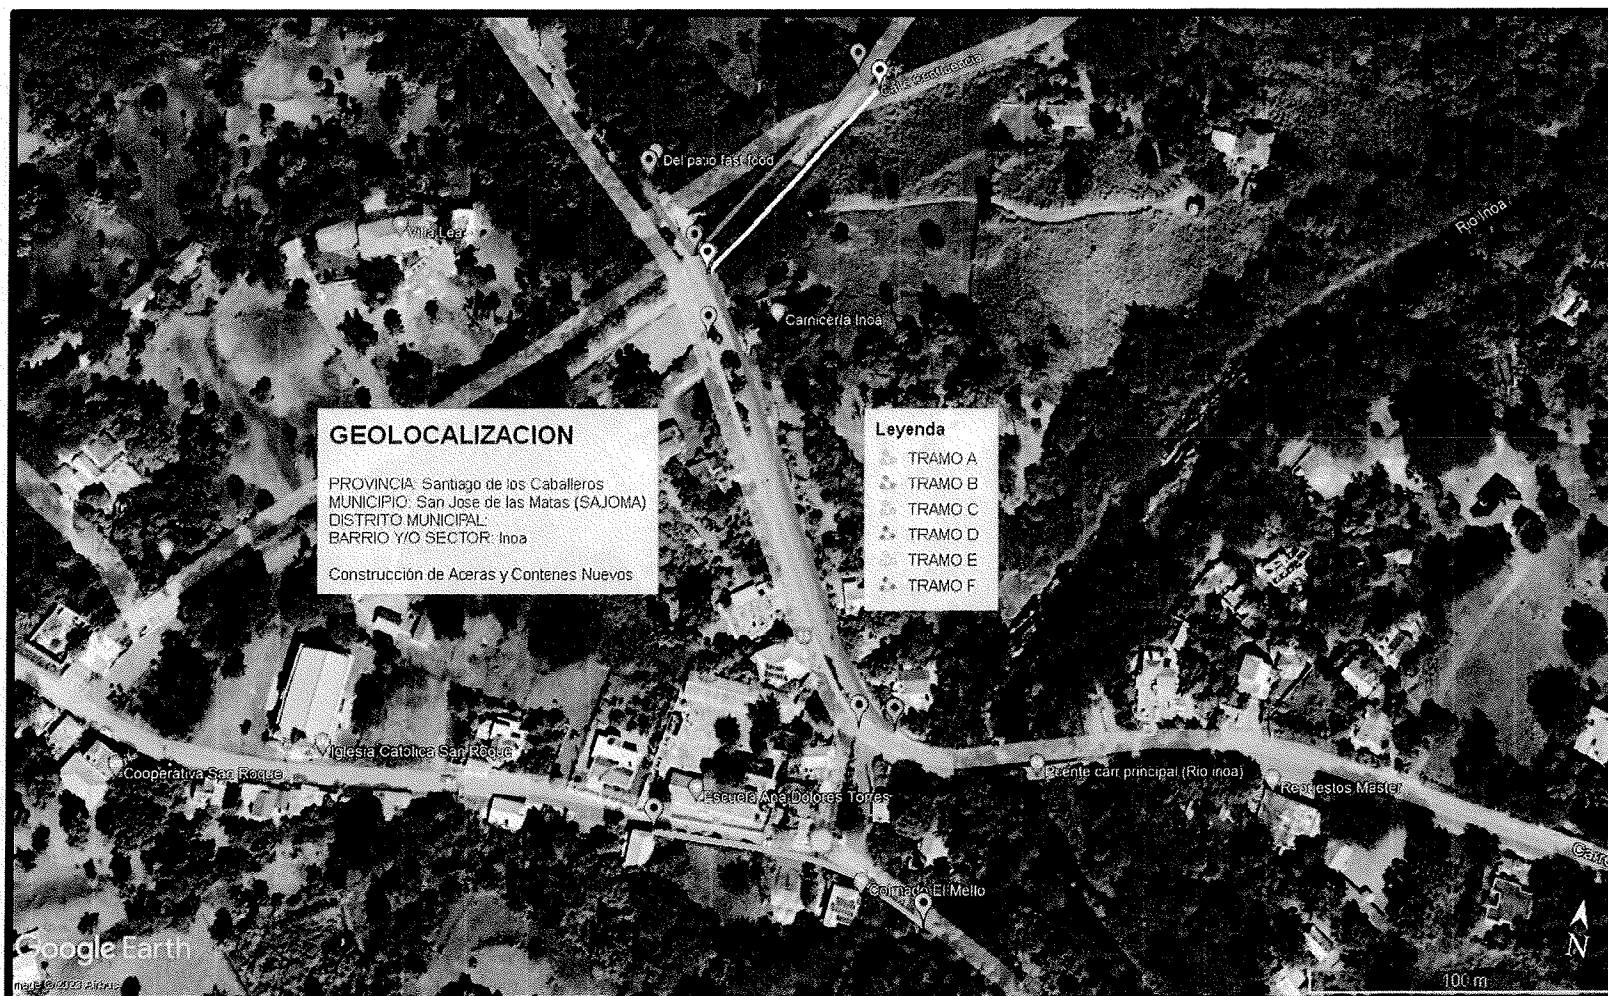


Imagen No. 1: Localización en Google Earth de los puntos de aceras y contenes



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Calle desde Puente a Escuela Ana Dolores Torres (Lado Izquierdo)	19°20'40.72"N	70°59'8.40"O	19°20'41.16"N	70°59'11.67"O	-----	-----	78.50	-----	78.50
Tramo B	Calle principal el Rubio (Lado Derecho)	19°20'42.68"N	70°59'9.56"O	19°20'46.74"N	70°59'12.26"O	148.6	1.30	154.10	193.12	154.10
Tramo C	Calle principal el Rubio (Lado Izquierdo)	19°20'42.72"N	70°59'9.14"O	19°20'47.51"N	70°59'12.41"O	117.10	1.36	130.70	159.20	130.70
Tramo D	Calle Confluencia - Entrada a Campo Verde (Lado Izquierdo)	19°20'47.50"N	70°59'12.44"O	19°20'50.14"N	70°59'10.79"O	70.50	1.19	74.60	83.90	74.60
Tramo E	Calle Confluencia - Entrada a Campo Verde (Lado Derecho)	19°20'47.70"N	70°59'12.63"O	19°20'50.31"N	70°59'11.10"O	69.80	0.43	72.50	30.14	72.50
Tramo F	Calle principal el Rubio (Lado Derecho)	19°20'47.68"N	70°59'12.65"O	19°20'50.31"N	70°59'11.10"O	31.60	1.20	35.60	37.90	35.60
	Área adicional generada en plantilla de contenes					-----	-----		484.69	
	Área de entradas a viviendas								102.30	
								TOTALES	1091.25	546.00






Imagen No. 2: Contenes en calle desde Puente a Escuela Ana Dolores Torres (Lado Izquierdo)



Imagen No. 3: Contenes en calle desde Puente a Escuela Ana Dolores Torres (Lado Izquierdo)



Imagen No. 4: Aceras y contenes Calle principal el Rubio (Lado Izquierdo y derecho)







Imagen No. 5: Aceras para entrada a vivienda Calle principal el Rubio (Lado Izquierdo)



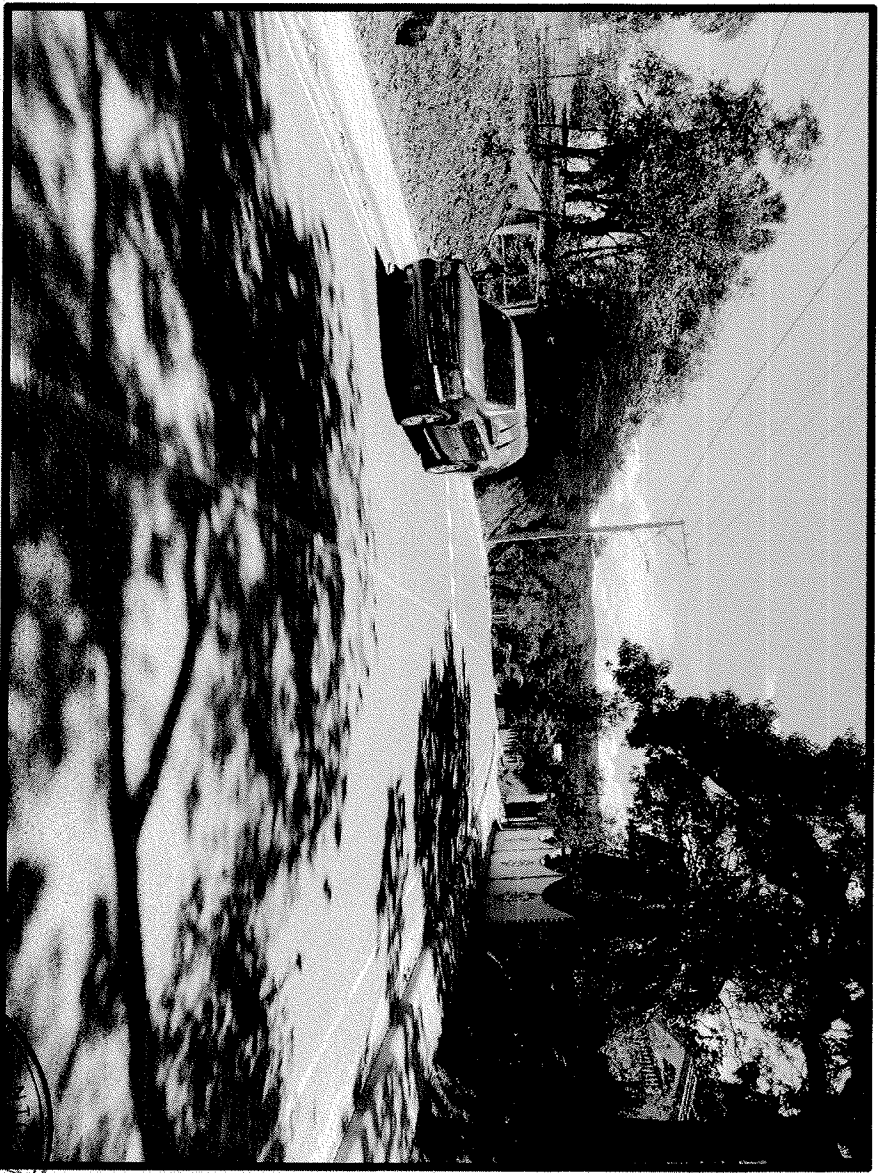


Imagen No. 6: Aceras y contenes Calle principal el Rubio (Lado Izquierdo y derecho)







Imagen No. 7: Aceras y contenes en calle Confluencia - Entrada a Campo Verde (Lado Derecho e Izquierdo)






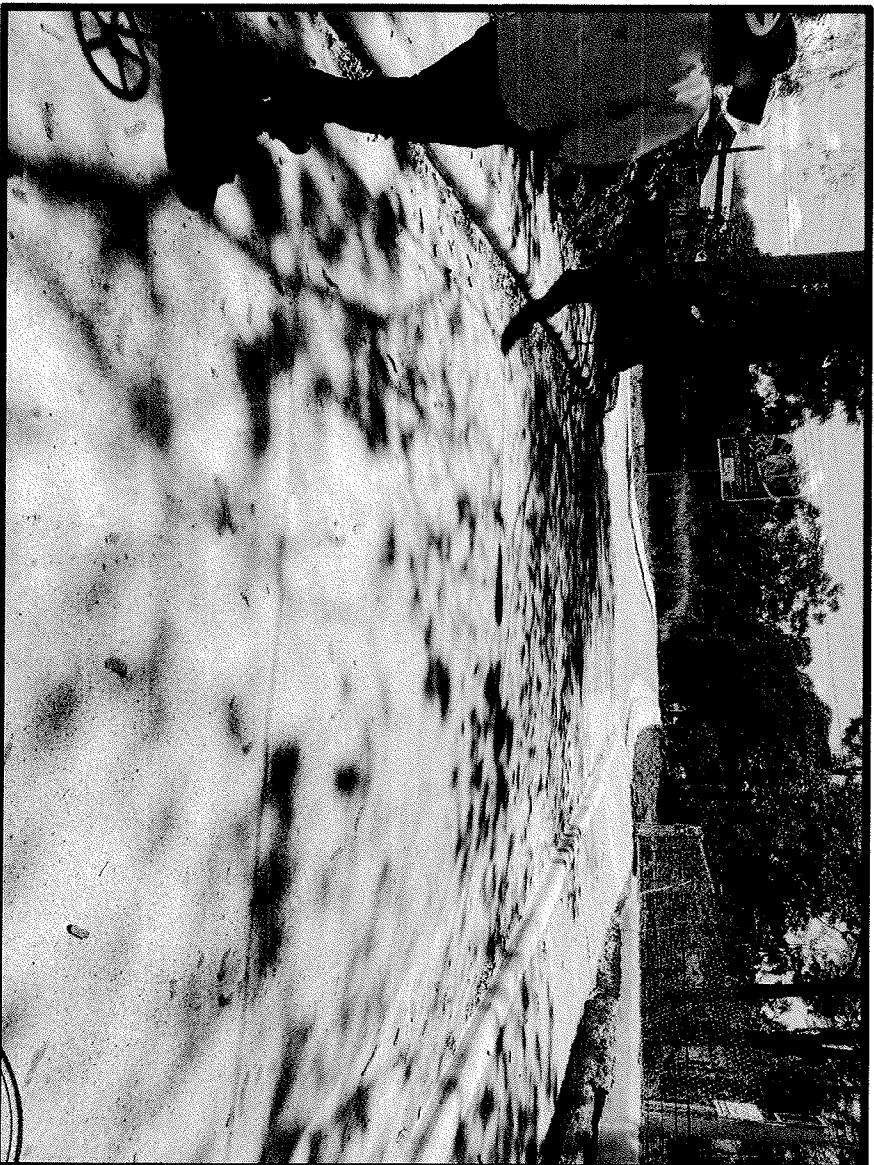


Imagen No. 8: Aceras y contenes en calle Confluencia - Entrada a Campo Verde (Lado Derecho e Izquierdo)





**Imagen No. 8: Aceras para entrada a vivienda calle Confluencia - Entrada a Campo Verde
(Lado Derecho)**

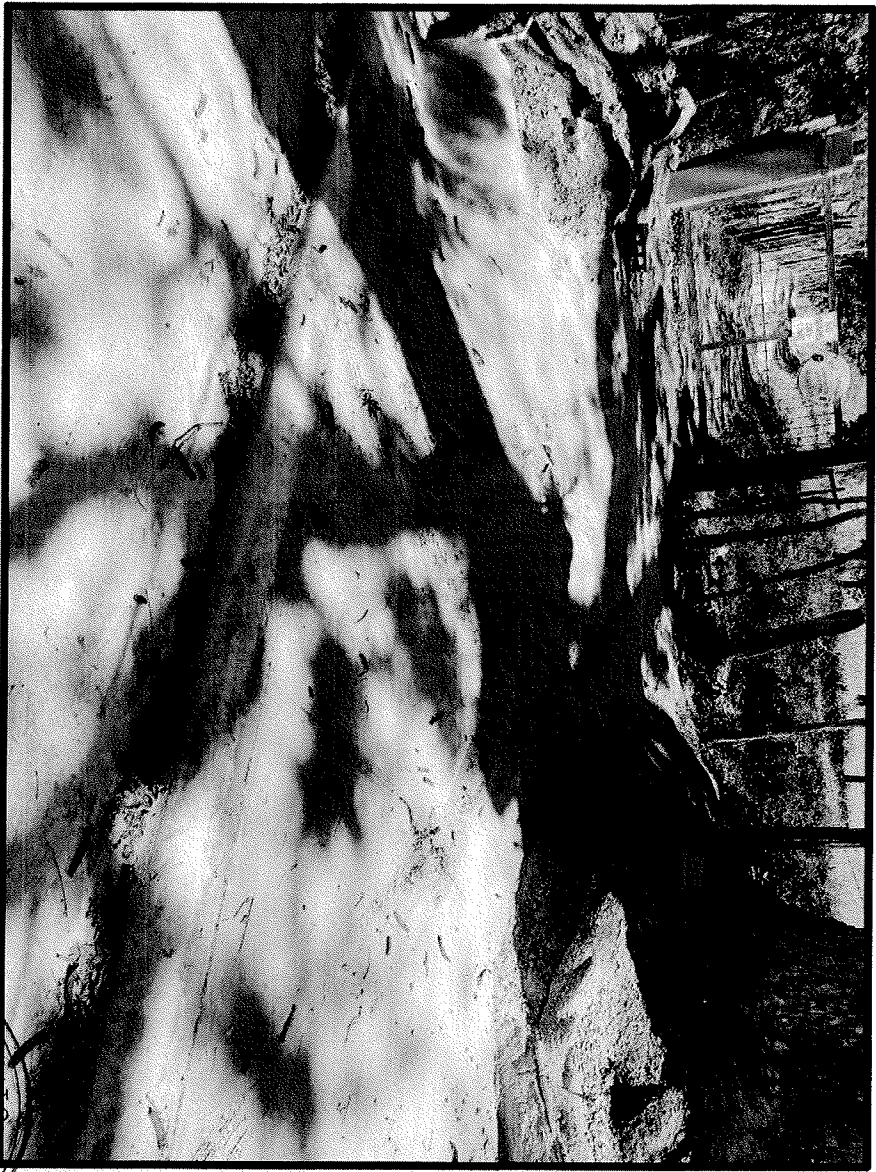

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1. En algunos puntos de los congentes a evaluar se realizaron anchos mayores al que tiene la plantilla para la realización de dichos contenes; por lo que el contratista en autorización del Alcalde octaron por completar dicha sección a las medidas en el terreno. La Alcaldía procedio a pagar esta area adicional (Ver Fila - Área adicional generada en plantilla de contenes en la tabla de cubicaciones).

2. Se realizarón areas de aceras en entradas de algunas vivienda (Ver Fila- Área de entradas a viviendas en la tabla de cubicaciones).


6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:	DIEGO RAFAEL JIMENEZ SANTOS
CÉDULA:	094-0022394-8
CODIA:	36914
FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:	31 DE MARZO DE 2023

Valida y aprueba los datos suministrados,


Firma y sello


Junta Distrital ó Alcaldía Municipal.



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

MUNICIPIO: SAN JOSE DE LAS MATAS (SAJOMA)

DISTRITO MUNICIPAL: _____

BARRIO Y/O SECTOR: INOA

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local ☒

b. Contratista ☐

Razón Social	SALOMON PEREZ RAMIREZ
RNC ó Cédula:	080-0001305-5



3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes: ☒
- d. Otros:


CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES NUEVOS


4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO


Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.

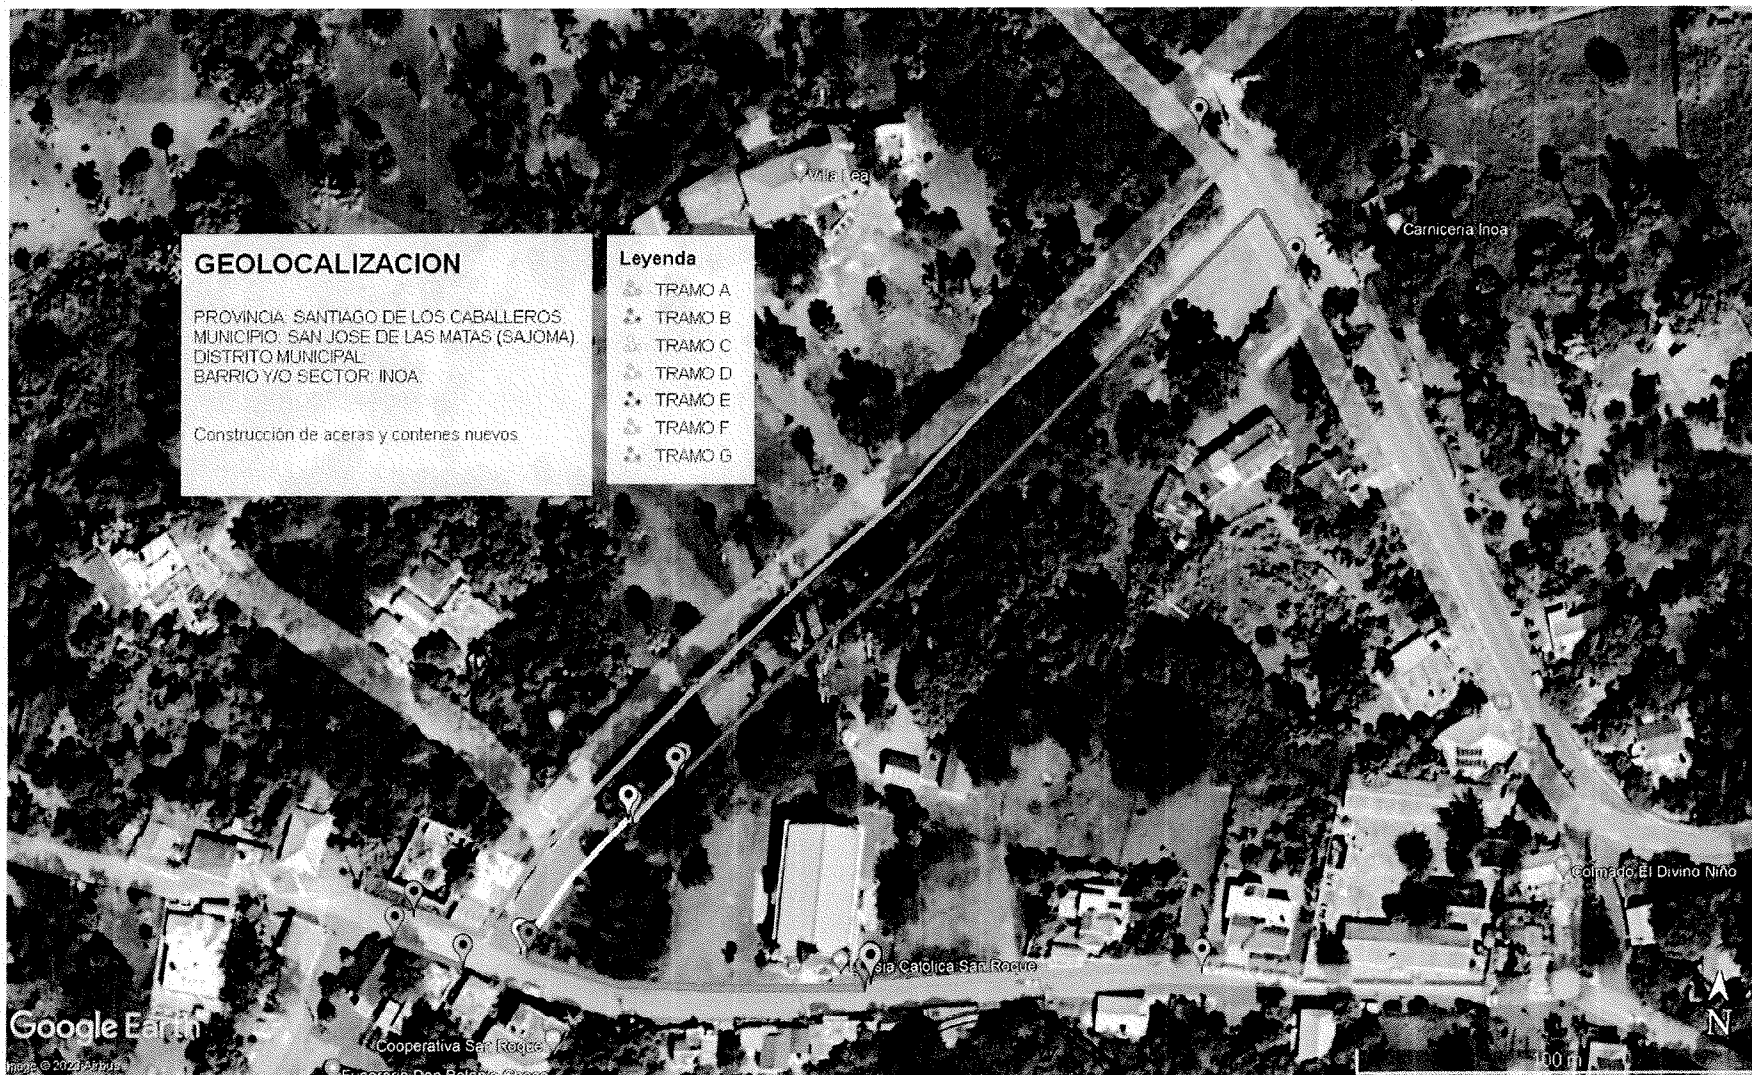



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Iglesia católica San Roque	19°20'41.39"N	70°59'12.74"O	19°20'41.19"N	70°59'15.41"O	-----	-----	78.54	-----	
Tramo B	Iglesia San Roque @ Frente Coop. San Roque	19°20'41.19"N	70°59'15.41"O	19°20'41.33"N	70°59'18.11"O	83.30	1.15	83.30	95.38	
Tramo C	Frente Coop. San Roque @ Frente Colmado Lay Estévez	19°20'41.33"N	70°59'18.11"O	19°20'42.38"N	70°59'17.39"O	35.57	1.07	35.57	38.06	
Tramo D	Frente Colmado Lay Estévez	19°20'42.38"N	70°59'17.39"O	19°20'42.67"N	70°59'17.04"O	-----	-----	2.40	-----	
Tramo E	Frente Colmado Lay Estévez @ Carretera Principal El Rubio	19°20'42.67"N	70°59'17.04"O	19°20'46.72"N	70°59'12.27"O	315.37	1.026	315.37	323.60	
Tramo F	Carretera Principal @ Frente Policlínica	19°20'47.75"N	70°59'13.09"O	19°20'41.60"N	70°59'19.03"O	312.7		312.7	237.32	
Tramo G	Policlínica	19°20'41.41"N	70°59'19.17"O	19°20'41.22"N	70°59'18.62"O	-----	-----	13.70	-----	
Tramo H								TOTALES	694.36	841.58
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										
















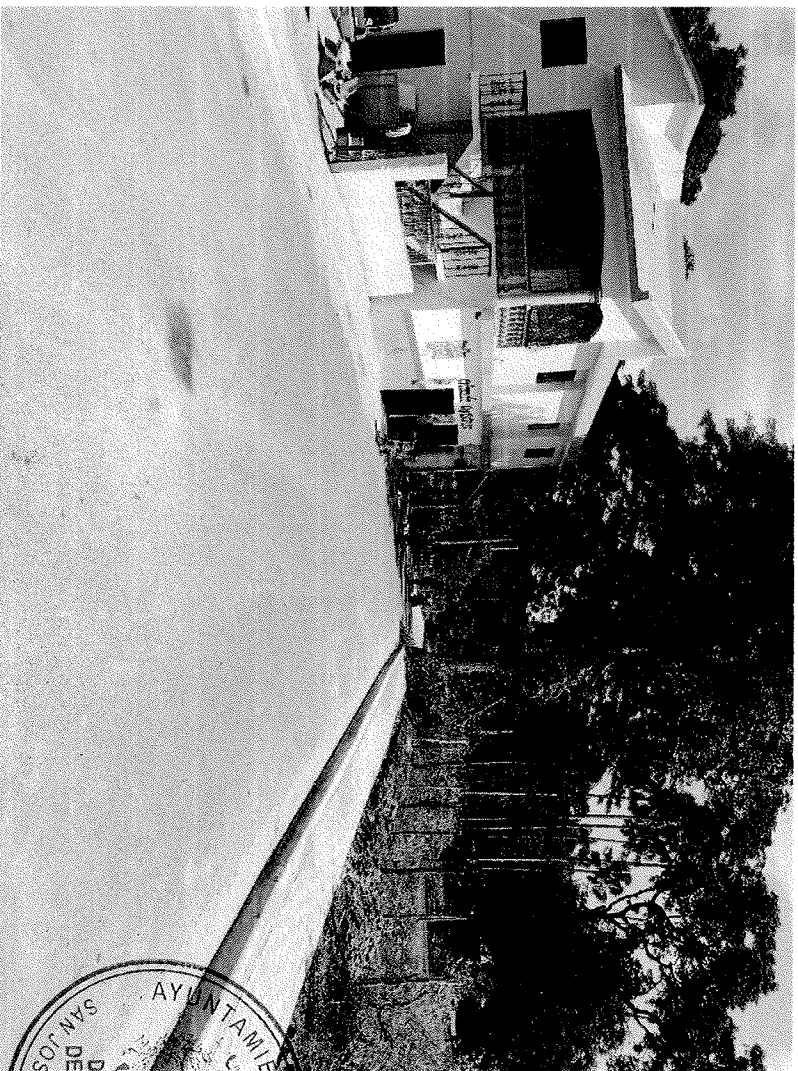





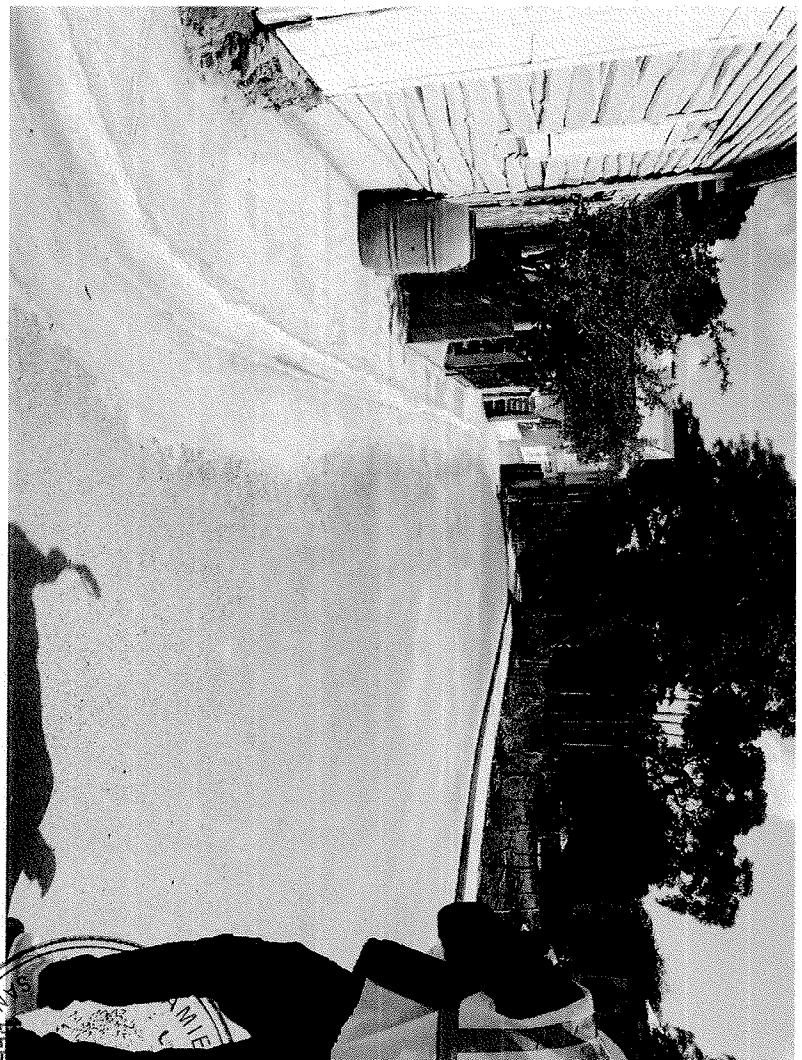

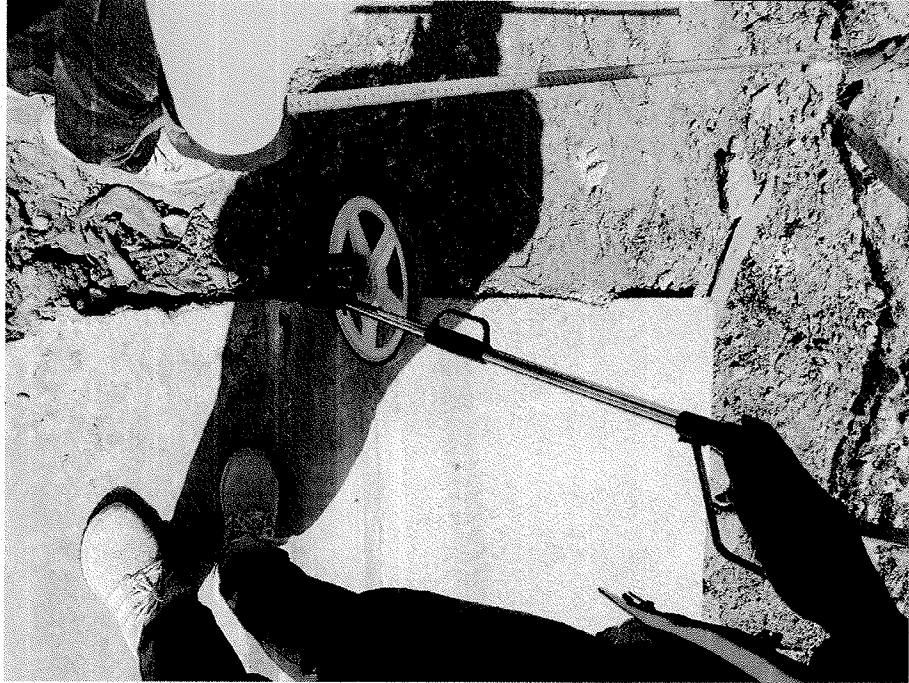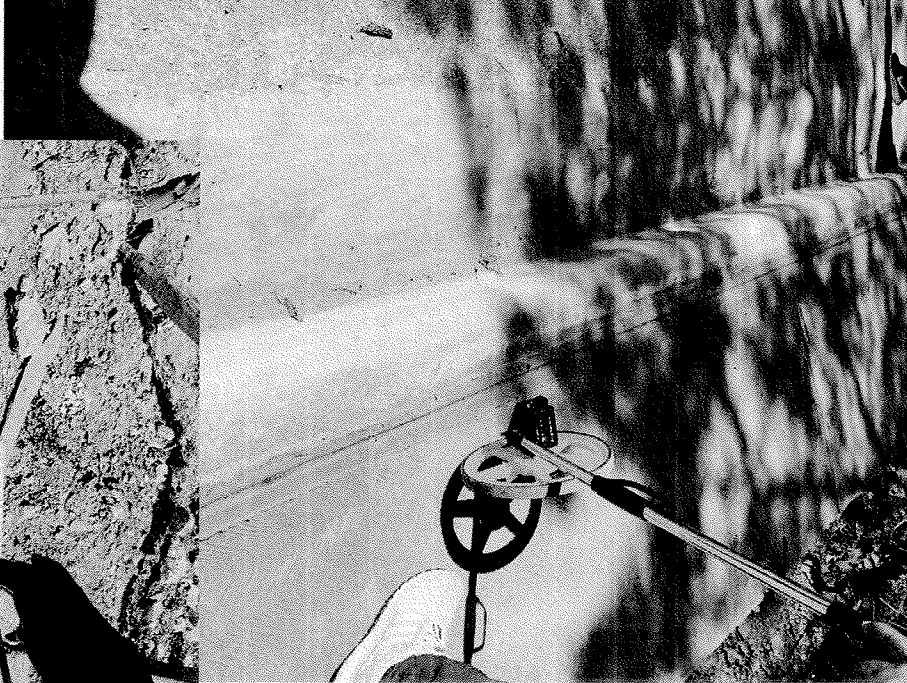

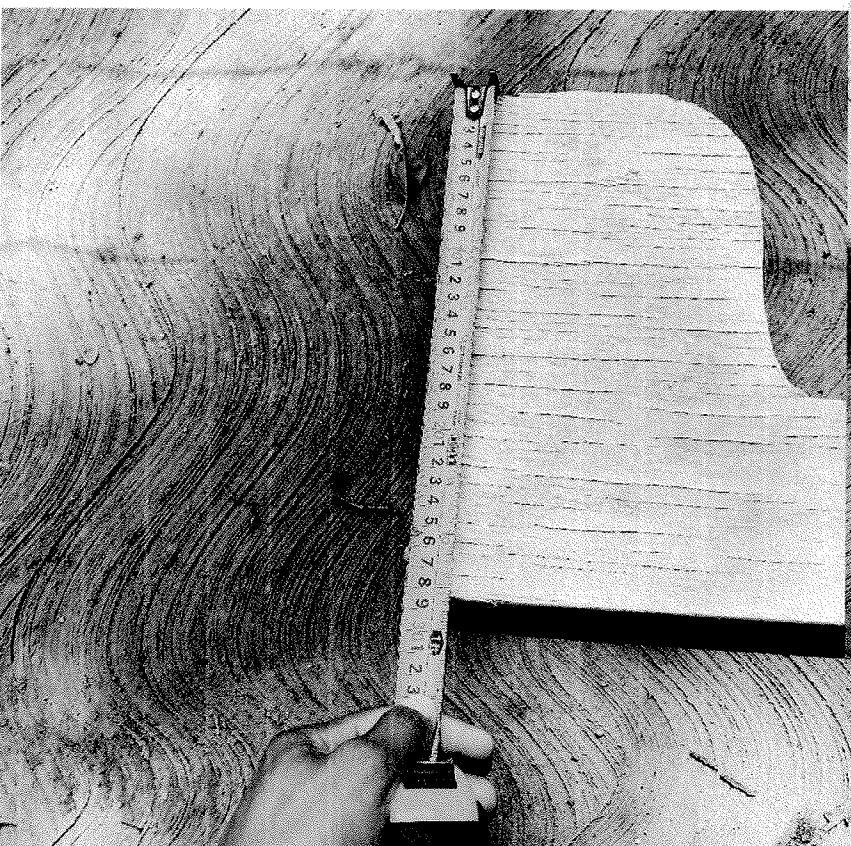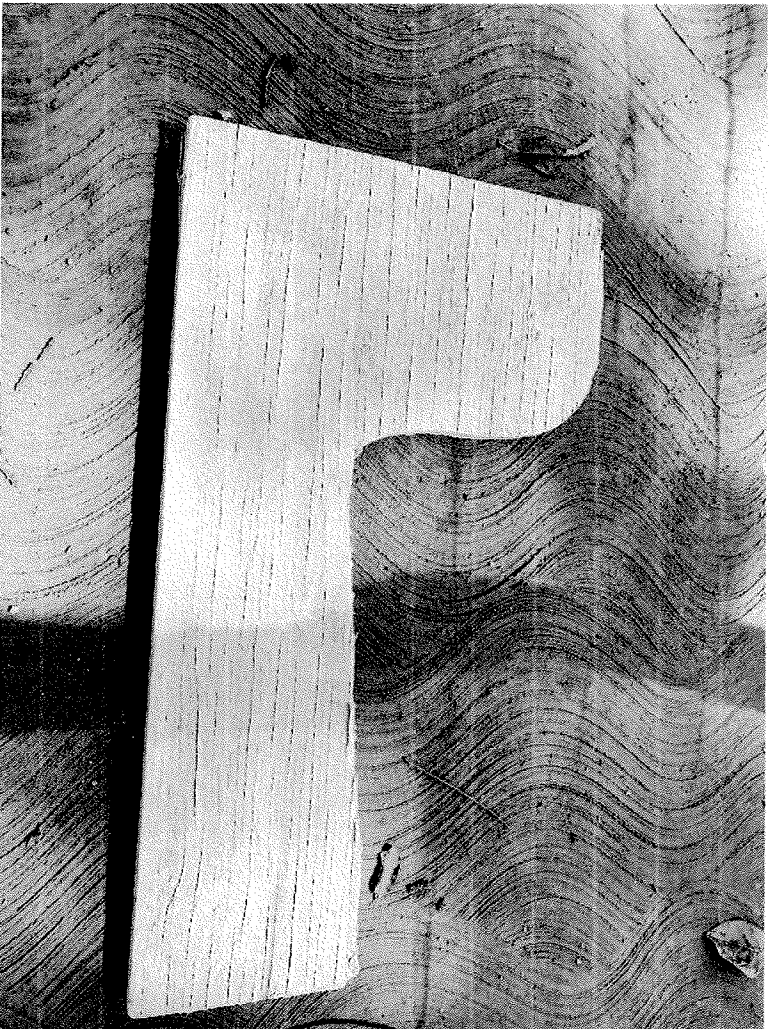

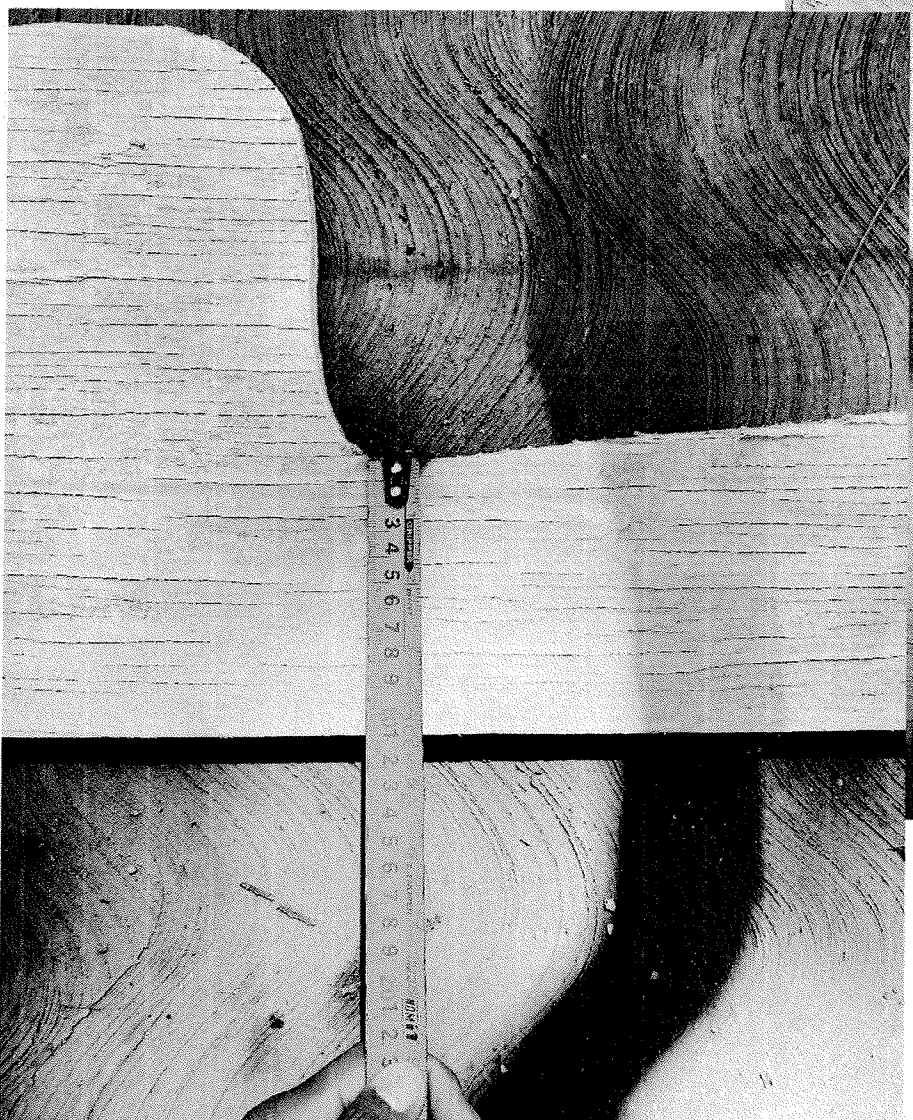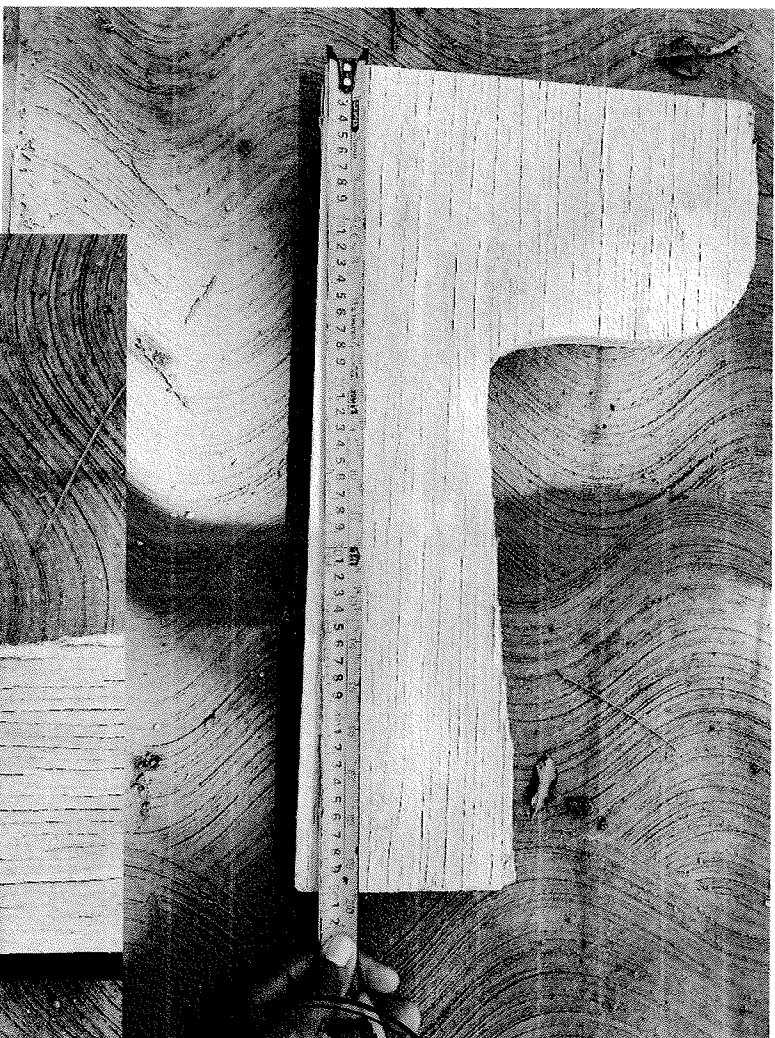

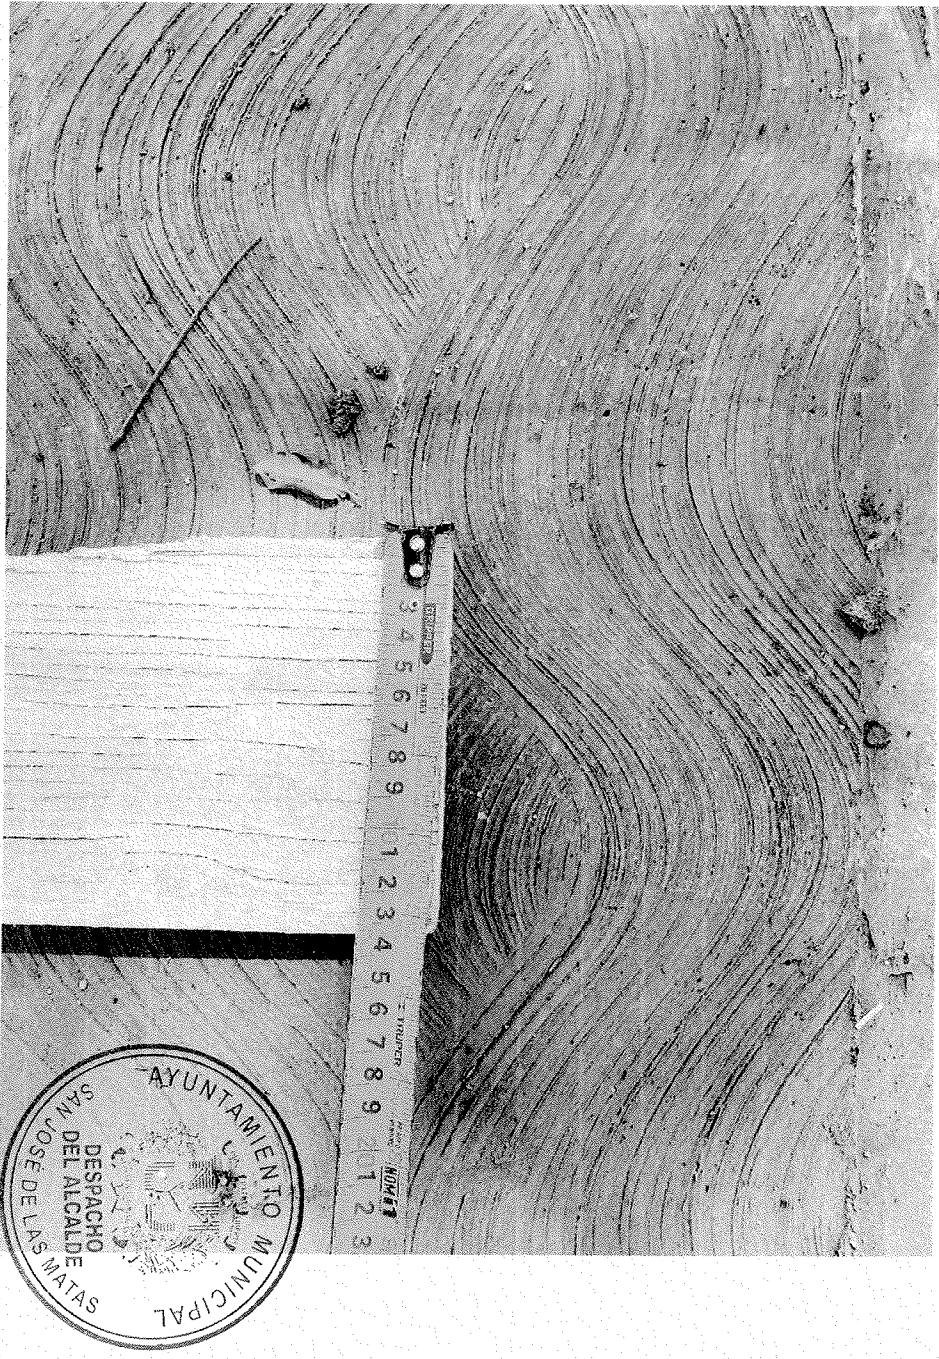

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES


6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:	DIEGO RAFAEL JIMENEZ SANTOS
CÉDULA:	094-0022394-8
CODIA:	36914
FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:	06 DE MARZO DE 2023

Valida y aprueba los datos suministrados,



Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anejar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Diego Rafael Simónez Santos

CECULA:

094-0022394-8


CODIA:

36914

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

06 de marzo de 2023

Valida y aprueba los datos suministrados,


Firma y sello
Junta Distrital o Alcaldía Municipal
