

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 260301

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

PROVINCIA: SANTIAGO RODRÍGUEZ

MUNICIPIO: MONCIÓN

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 7 de marzo de 2023

1. Ing. Ana Indhira Rámirez

TÉCNICOS: 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ escuela Prof. Juan Bosch	255.90	1.15	1.00	255.90	1.00	294.29	255.90
TRAMO B	Loma del Tanque	384.90	1.00	1.00	1,338.70	1.00	384.90	1,338.70
TRAMO C	EL VALLE				315.00	2.00		630.00
Total							679.19	2,224.60

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,881,235.14

Monto desembolsado RD\$ 3,881,235.14 (100%)

Avance de obra 166.25%

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 7 de marzo de 2023

REGIÓN: CIBAO NOROESTE
PROVINCIA: SANTIAGO RODRÍGUEZ
MUNICIPIO: MONCIÓN
DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 679.19 metros cuadrados de aceras y 2,224.60 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Estas aceras y contenes fueron realizados con la calidad recomendado por la LMD.
2. La obra se está ejecutando vía Administración.
3. En dicho levantamiento estuvo presente el alcalde.

IMÁGENES



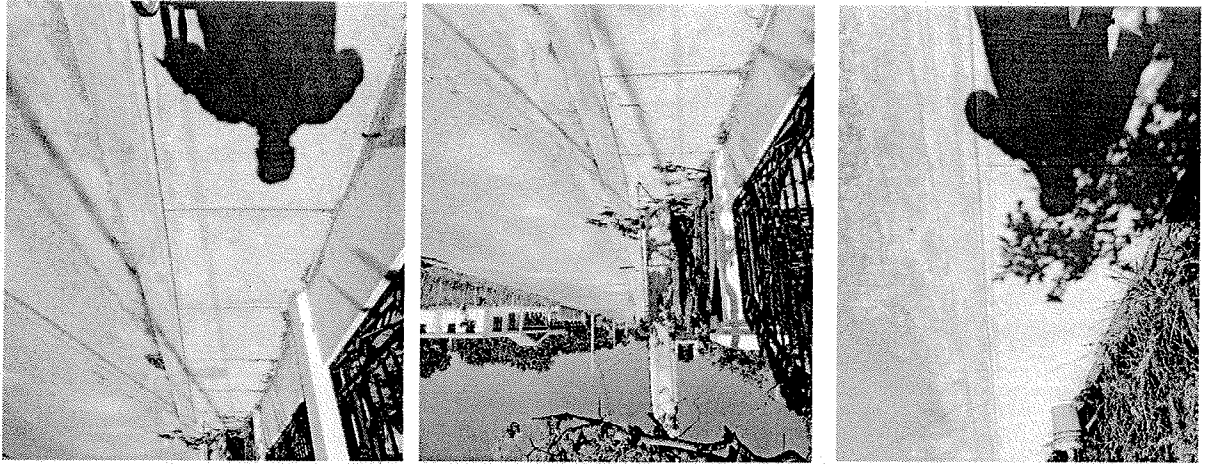

Suministra los datos de este reporte,

ING. ANA INDIHIRA RAMIREZ
Técnico

CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico
