

Santo Domingo, D.N.
15 de mayo de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho


Asunto: **Remisión de reporte de cierre de ejecución de Villa Vásquez**


En la visita técnica realizada el 10 de mayo del 2023 se validó la ejecución de 1,635.66 metros cuadrados de aceras y 1,606.40 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.


La supervisión externa ha validado la ejecución de 225 metros cuadrados de aceras y 257.8 metros lineales de contenes con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 1,860.66 metros cuadrados de aceras y 1,864.2 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 150601

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

PROVINCIA: MONTE CRISTI

MUNICIPIO: VILLA VÁSQUEZ

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 10 de mayo de 2023

1. Ing. Richard Cabrera

TÉCNICOS: 2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	GENERAL CABRERA	28.05	1.25	2			70.125	
TRAMO B	LA ALTAGRACIA	78.30	1.30	2	78.30	2	203.58	156.6
TRAMO C	16 DE AGOSTO	22.30	1.50	1	22.30	1	33.45	22.3
TRAMO D	CALLE DE LA SALIDA	49.50	2.00	1	49.50	1	99	49.5
TRAMO E	SECTOR LAS CALLERAS C/1	373.90	0.70	1	373.90	1	261.73	373.9
TRAMO F	C/2	97.10	0.70	2	97.10	2	135.94	194.2
TRAMO G	C/3	481.70	0.70	1	455.1	1	337.19	455.1
TRAMO H	C/4	63.20	0.70	2	63.20	2	88.48	126.4
TRAMO I	GENERAL CABRERA	28.05	1.25	2			70.125	
TRAMO DK	LA ALTAGRACIA	78.30	1.30	2	78.3	2	203.58	156.6
TRAMO DL	16 DE AGOSTO	22.30	1.50	1	22.3	1	33.45	22.3
TRAMO DM	CALLE DE LA SALIDA	49.50	2.00	1	49.5	1	99	49.5
Total							1635.65	1606.40




AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,170,916.83

Monto desembolsado RD\$ 4,170,916.84 (100%)

Avance de obra 145.74%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 10 de mayo de 2023

PROVINCIA: MONTE CRISTI

MUNICIPIO: VILLA VÁSQUEZ

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,635.65 metros cuadrados de aceras y 1,606.40 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Las aceras tienen menos de un metro de ancho.
2. Algunas zonas han sido maltradas por inundaciones

IMÁGENES



Suministra los datos de este reporte,


ING. RICHARD CABRERA
Técnico


FELIPE REYES
Técnico



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: MONTE CRISTI

MUNICIPIO: VILLA VÁSQUEZ

DISTRITO MUNICIPAL:


BARRIO Y/O SECTOR:

C/ 27 DE FEBRERO, ESQUINA GUILLERMO MAURIZ, BARRIO LA GALLERA, LA
COLONIA

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local ☒
- b. Contratista ☐

Razón Social: AYUNTAMIENTO M. VILLA VASQUEZ
RNC ó Cédula: 40800010-4



3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)


- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes: ☐
- d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Calle 27 de febrero	19.740094	-71.446662	19.739682	-71.446457	45.8	1.55	45.8	74	45.8
Tramo B	Esquina Guillermo Navarro	19.74125	-71.442228	19.742045	-71.441372	132	0.75	132	99	132
Tramo C	Barrio La Gallera	19.737603	-71.439803	19.736921	-71.439752	80	0.65	80	52	80
Tramo D	La colonia									
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										

SECRETARÍA GENERAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
12 JUN 2023
REVISADO
SECRETARÍA DE INTERIORES




5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Los contenes y las aceras de la calle 27 de febrero, Esq. Guillermo Mauriz, fue una reconstrucción.

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.



Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Anthony Isidro Almante Lorete

CÉDULA:

094-0023263-4

CODIA:

43217


FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:


9 de mayo del 2023.



Valida y aprueba los datos suministrados,

Firma y sello
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



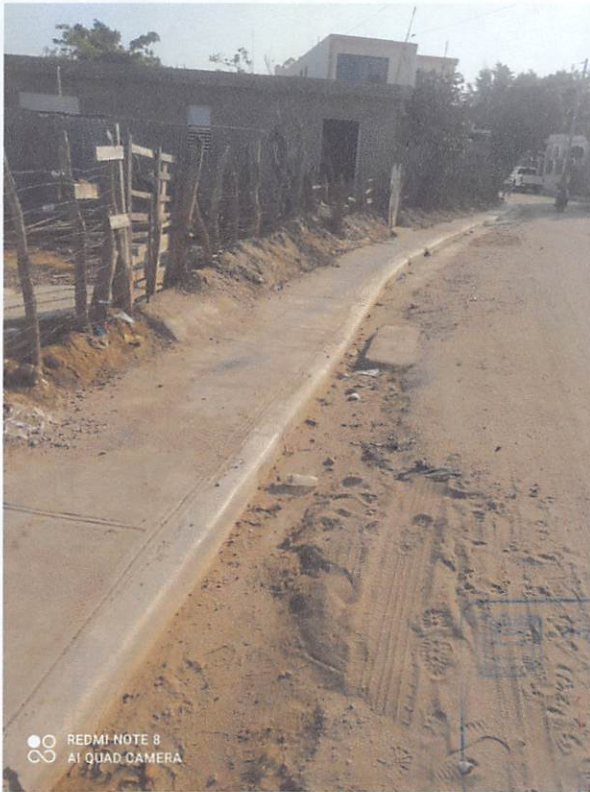

CENTRAL OFICIAL GENERAL
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
2 JUN 2023
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

