



PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL 25-26

INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACERAS Y CONTENES CIERRE DE PROYECTO

Fecha de visita técnica: 26 de agosto de 2026

1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Región: ENRIQUILLO
Provincia: BARAHONA
Municipio: FUNDACIÓN
Distrito Municipal: -
Barrio y/o Sector: ENTRADA DE FUNDACION

2. CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre/Razón Social: FELMEDI CONSTRUCCIONES S.R.L

RNC o Cédula: 133-44002-4


3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| a. Construcción de aceras | ☒ | |
| b. Construcción de contenes | ☐ | |
| c. Reconstrucción de aceras | ☐ | |
| d. Reconstrucción de contenes | ☐ | |
| e. Construcción de obra conexas | ☒ | Especificar: RAMPA DE ACCESO A CAMINO
VECINALES Y ENCACHE |
| f. Reconstrucción de obra conexas | ☐ | Especificar: _____ |
| g. Elementos de accesibilidad | ☐ | Especificar: _____ |
| h. Arborización | ☐ | |

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

FUNDACION

Nombre de Calle: ENTRADA DE FUNDACION

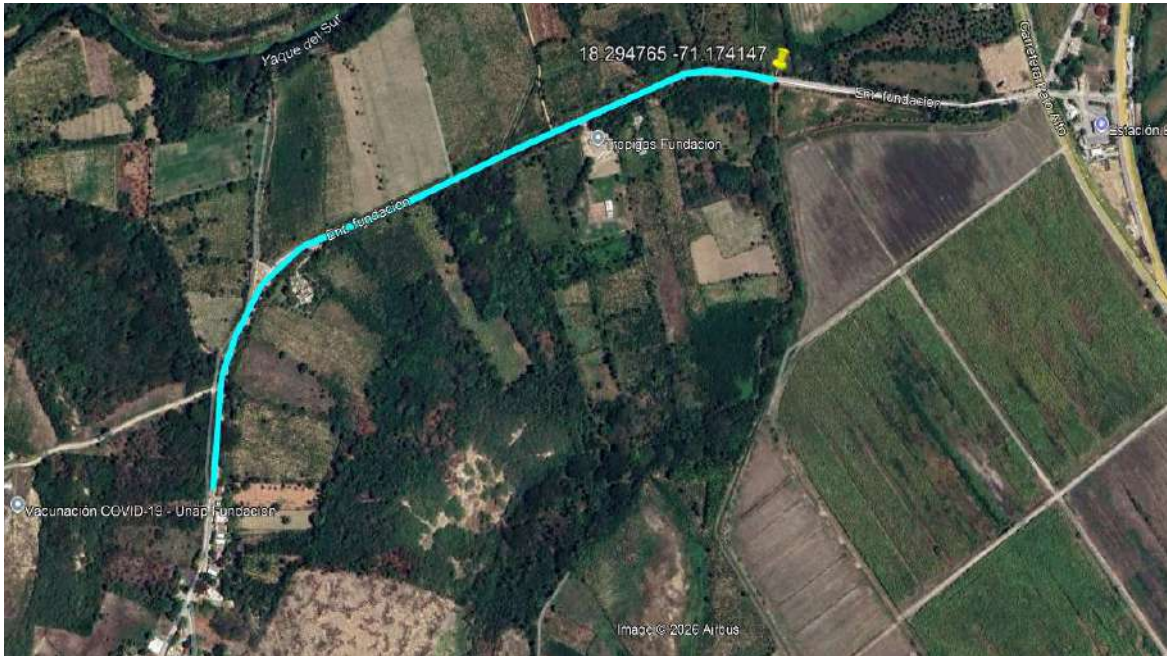

5. LEVANTAMIENTO

		INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMOS	BARRIO O SECTOR / NOMBRE DE LA CALLE	LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD				
Tramo A	Fundacion / Calle entrada de fundacion (ambos lados)	18.290133	-71.180993	18.294765	-71.174147	1,606.00	1.00	1,606.00	
Total								1,606.00	0.00

Nota: Los tramos indicados como ***ambos lados*** tienen la volumetria de ambos lados de las aceras y/o contenes.
Ejecución fisica de obra 100.5% (estimado en base a las cantidades aceras y contenes, no incluye obras conexas ni partidas de terracería)

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1. LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN

Se inspeccionó el Tramo A de la entrada principal de Fundación, en ambos lados de la vía.

Longitud verificada: 1,606.00 m lineales (1,606.00 m² de aceras, ancho 1.00 m). El gobierno local planifico y presupuestó un muro de encache para protección de acera y 6 rampas de acceso de diferentes dimensiones.

2. CONDICIÓN OBSERVADA

Superficie uniforme, acabado violinado y frotado.

Sin fisuras ni desprendimientos visibles.

Bordillos y juntas alineados, sin desniveles significativos.

3. CONCLUSIÓN

El tramo presenta condición constructiva satisfactoria y acabado conforme a especificaciones.

No se presentaron ensayos de laboratorio al momento de la inspección.



Ejecución física reportada: 100.5% (aceras y contenes, sin obras conexas ni terracería).


6. FOTOGRAFIAS DE LAS CALLES INTERVENIDAS

FUNDACION

Nombre de Calle: ENTRADA DE FUNDACION



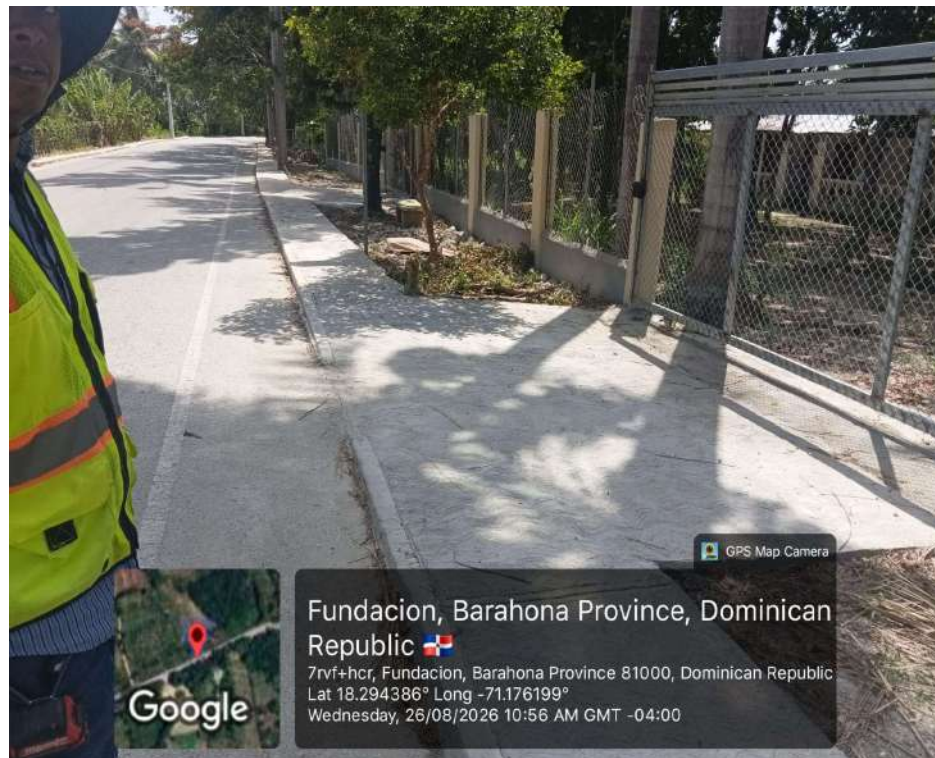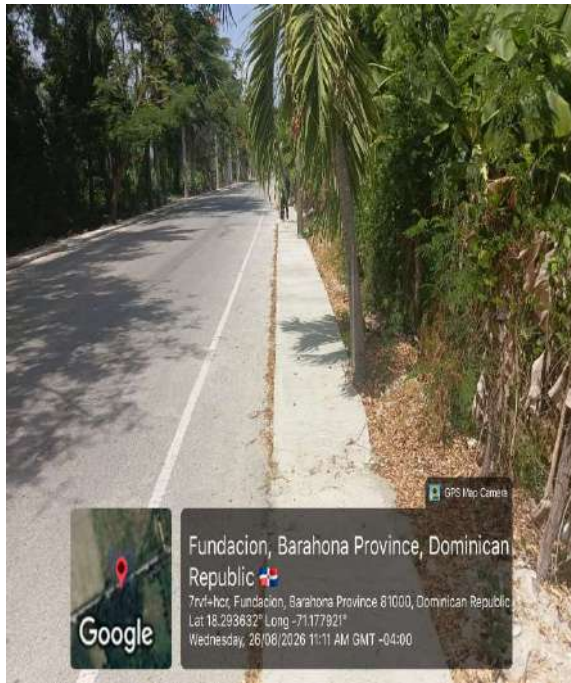

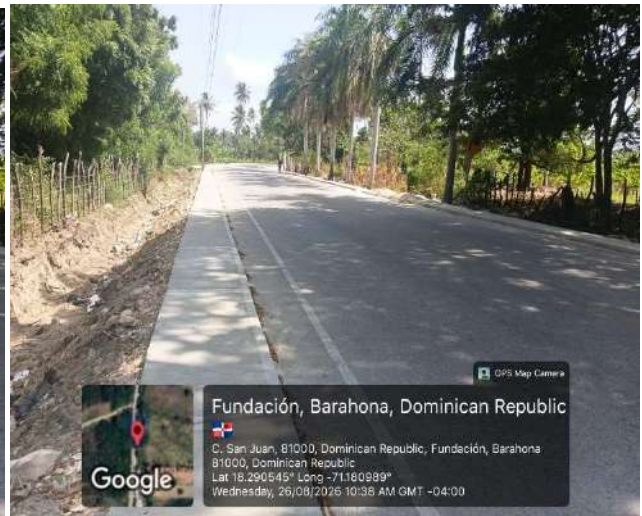

Las informaciones y otros insumos para la elaboración de este informe han sido suministrados por el gobierno local, en calidad de entidad ejecutora de los fondos transferidos desde el Ministerio de Hacienda y Economía para la ejecución de los proyectos de aceras y contenes, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26. El presente informe ha sido elaborado a requerimiento de Liga Municipal Dominicana, en calidad de entidad supervisora, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26.

Por la Liga Municipal Dominicana

Supervisor responsable del proyecto: STAYLIN MENDOZA HEREDIA

CODIA: 48530

Firma y sello:

Staylin M. H.

