



PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL 25-26

INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACERAS Y CONTENES

CIERRE DE PROYECTO

Fecha de visita técnica: 2 de septiembre de 2026

1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Región: ENRIQUILLO
Provincia: BAHORUCO
Municipio: TAMAYO
Distrito Municipal: SANTANA
Barrio y/o Sector: CASCO URBANO Y LOS CONUQUITOS

2. CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre/Razón Social: KDK ENGINEERING AND DESING SRL

RNC o Cédula: 132277231


3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| a. Construcción de aceras | ☒ | |
| b. Construcción de contenes | ☒ | |
| c. Reconstrucción de aceras | ☐ | |
| d. Reconstrucción de contenes | ☐ | |
| e. Construcción de obra conexa | ☐ | Especificar: _____ |
| f. Reconstrucción de obra conexa | ☐ | Especificar: _____ |
| g. Elementos de accesibilidad | ☐ | Especificar: _____ |
| h. Arborización | ☐ | |

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO


CASCO URBANO

Nombre de Calle: 1;2;3

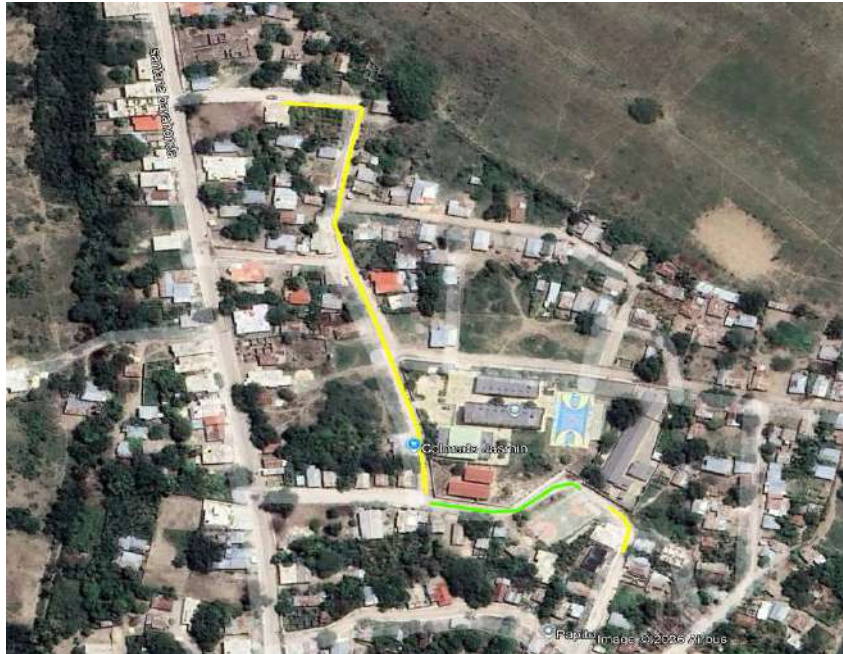

LOS CONUQUITOS

Nombre de Calle: Carretera hacia la zona alta de tamayo; 1

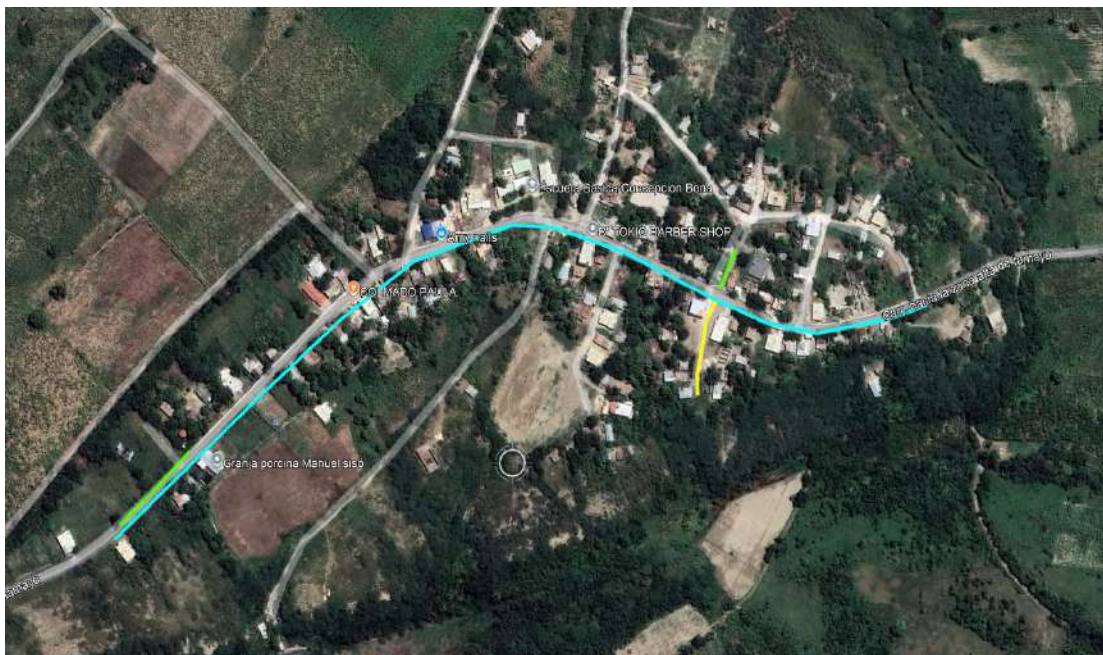

5. LEVANTAMIENTO

		INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMOS	BARRIO O SECTOR / NOMBRE DE LA CALLE	LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD				
Tramo A	Casco Urbano / Calle 1	18.414342°	-71.191092°	18.414256°	-71.191776°	81.60	1.04	84.86	81.60
Tramo B	Casco Urbano / Calle 1 (ambos lados)	18.414020	-71.190909	18.414239	-71.190973	46.90	1.15	53.94	46.90
Tramo C	Casco Urbano / Calle 2 (ambos lados)	18.414256°	-71.191776°	18.416313	,-71.192421	371.40	1.00	371.40	
Tramo D	Los conuquitos / Carretera hacia la zona alta de tamayo	18.411257°	-71.176175°	18.411779°	-71.175606°	83.90	1.00	83.90	
Tramo E	Los conuquitos / Carretera hacia la zona alta de tamayo	18.411115°	-71.176241°	18.412854°	-71.169577°	781.00	1.00	781.00	50.00
Tramo F	Los conuquitos / Calle 1	18.413252°	-71.171158°	18.412962°	-71.171283°	33.70	1.00	33.70	
Tramo G	Los conuquitos / Calle 1 (ambos lados)	18.412874°	-71.171316°	18.412183°	-71.171459°	115.70	1.00	115.70	
Total								1,524.50	178.50

Nota: Los tramos indicados como ***ambos lados*** tienen la volumetría de ambos lados de las aceras y/o contenes.
Ejecución física de obra 102.6% (estimado en base a las cantidades aceras y contenes, no incluye obras conexas ni partidas de terracería)


OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la visita de inspección realizada el día 02/09/2026, se procedió al levantamiento y verificación de los trabajos ejecutados, tomando las mediciones pertinentes para comprobar las cantidades observadas en campo. En términos generales, los trabajos inspeccionados presentan una condición y terminación aceptables. No obstante, durante la verificación técnica y documental de la Cubicación No. 1 se observaron diferencias entre las cantidades certificadas y las cantidades verificadas mediante el levantamiento de campo, particularmente en la partida de contenes, donde fueron certificados 346.00 ml y se verificaron 178.50 ml construidos, para una diferencia de 167.50 ml; asimismo, las aceras verificadas alcanzan 1,524.50 m², superando las cantidades contratadas y cubicadas. En la revisión aritmética de la cubicación, los subtotales por capítulo y los costos indirectos fueron verificados, presentándose únicamente una diferencia de RD\$0.01 por concepto de redondeo. También se observó una diferencia de RD\$2,000,000.00 entre el anticipo establecido contractualmente y el monto de avance inicial reflejado en la cubicación, así como que la fecha de la cubicación corresponde a un período posterior al plazo de ejecución inicialmente establecido, sin evidencia de prórroga formal en la documentación revisada. Las situaciones antes señaladas se dejan consignadas como observaciones derivadas de la revisión documental y de la verificación realizada en campo.

6. FOTOGRAFIAS DE LAS CALLES INTERVENIDAS


CASCO URBANO

Nombre de Calle: 1

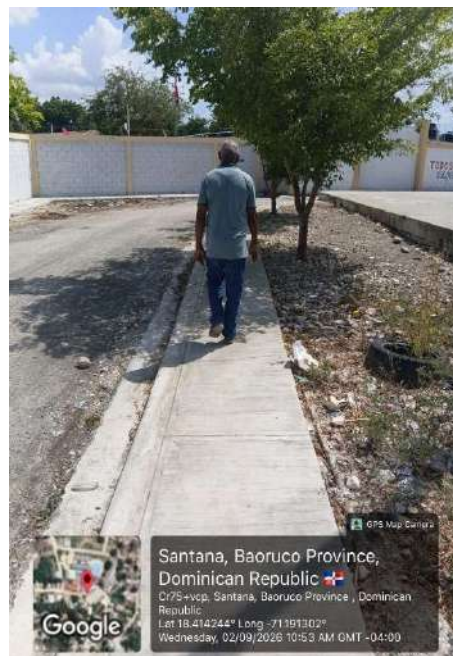


CASCO URBANO

Nombre de Calle: 1

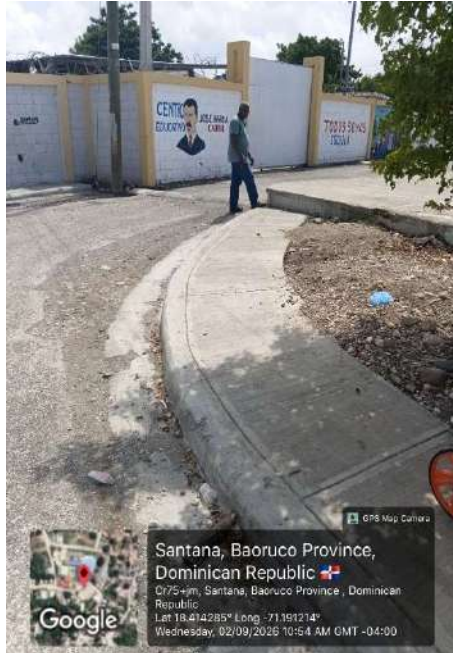

CASCO URBANO

Nombre de Calle: 2

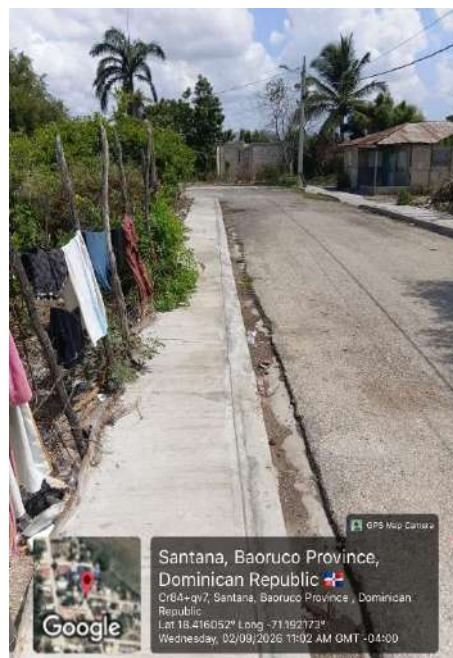

CASCO URBANO

Nombre de Calle: 2



LOS CONUQUITOS

Nombre de Calle: CARRECTERA HACIA LA ZONA ALTA DE TAMAYO



LOS CONUQUITOS

Nombre de Calle: CARRECTERA HACIA LA ZONA ALTA DE TAMAYO



Las informaciones y otros insumos para la elaboración de este informe han sido suministrados por el gobierno local, en calidad de entidad ejecutora de los fondos transferidos desde el Ministerio de Hacienda y Economía para la ejecución de los proyectos de aceras y contenes, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26. El presente informe ha sido elaborado a requerimiento de Liga Municipal Dominicana, en calidad de entidad supervisora, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26.

Por la Liga Municipal Dominicana

Supervisor responsable del proyecto: STAYLIN MENDOZA HEREDIA

CODIA: 48530

Firma y sello:

Staylin M. A.

