



PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL 25-26

INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACERAS Y CONTENES

CIERRE DE PROYECTO

Fecha de visita técnica: 10 de septiembre de 2026

1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Región: ENRIQUILLO
Provincia: INDEPENDENCIA
Municipio: DUVERGÉ
Distrito Municipal: VENGAN A VER
Barrio y/o Sector: VENG A VER

2. CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre/Razón Social: ANGEL DIOMEDES PEREZ Y PEREZ

RNC o Cédula: 020-0009052-8


3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| a. Construcción de aceras | ☐ | |
| b. Construcción de contenes | ☒ | |
| c. Reconstrucción de aceras | ☐ | |
| d. Reconstrucción de contenes | ☐ | |
| e. Construcción de obra conexas | ☐ | Especificar: _____ |
| f. Reconstrucción de obra conexas | ☐ | Especificar: _____ |
| g. Elementos de accesibilidad | ☐ | Especificar: _____ |
| h. Arborización | ☐ | |

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Venga A Ver

Nombre de Calle: Principal; 1; 2 y 3

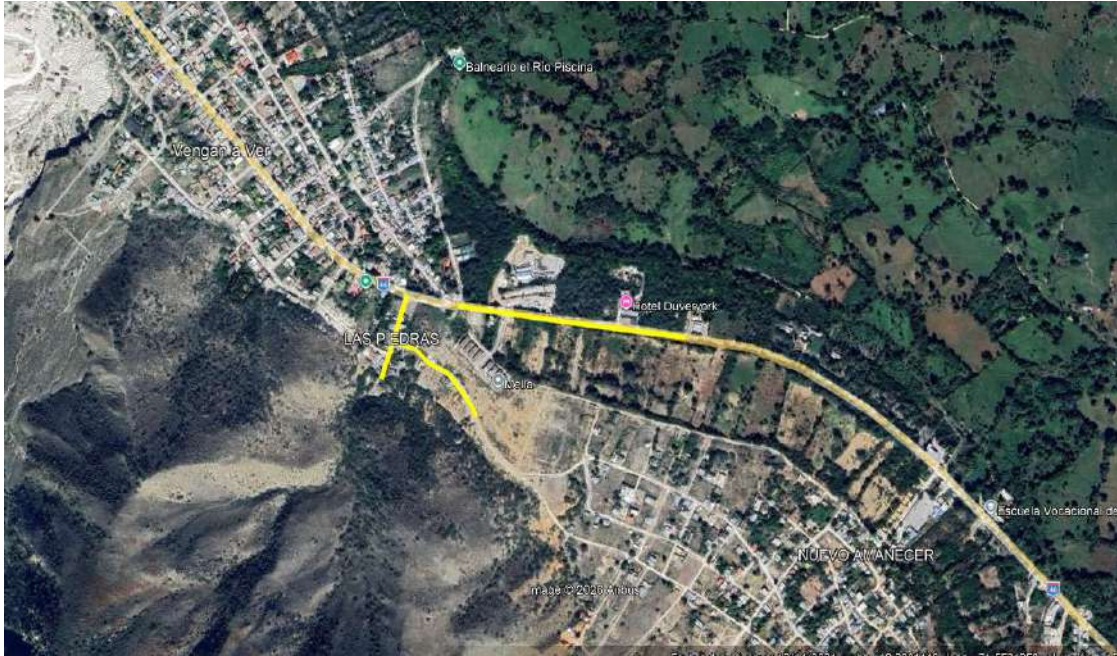

5. LEVANTAMIENTO

		INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMOS	BARRIO O SECTOR / NOMBRE DE LA CALLE	LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD				
Tramo A	Venga A Ver / Calle Principal (ambos lados)	18.386310°	-71.542305°	18.386823°	-71.546513°			0.00	710.00
Tramo B	Venga A Ver / Calle 1 (ambos lados)	18.387012°	-71.547481°	18.385661°	-71.547903°			0.00	297.00
Tramo C	Venga A Ver / Calle 2 (ambos lados)	18.386065°	-71.547831°	18.386251°	-71.548228°			0.00	102.80
Tramo D	Venga A Ver / Calle 3 (ambos lados)	18.386247°	-71.547647°	18.385022°	-71.546182°			0.00	430.00
Total								0.00	1,539.80

Nota: Los tramos indicados como ***ambos lados*** tienen la volumetria de ambos lados de las aceras y/o contenes.
Ejecución física de obra 100.2% (estimado en base a las cantidades aceras y contenes, no incluye obras conexas ni partidas de terracería)

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la visita de inspección realizada el 10 de septiembre de 2026 en el Distrito Municipal Vengan a Ver, Provincia Independencia, se verificaron los trabajos de construcción de contenes en cuatro tramos. El contrato contempla 1,537.03 ML de contenes, con una sección de 0.30 m de altura y 0.45 m de base, por un monto de RD\$3,634,170.82. En campo se levantaron 1,539.80 ML, cantidad que prácticamente coincide con lo contratado y cubicado al 100%, registrándose además una buena terminación visual de los trabajos.

La revisión documental y aritmética de la Cubicación No. 1, única y final, permitió comprobar que los valores consignados coinciden con el presupuesto y el monto contractual. Asimismo, el anticipo de RD\$726,834.16 fue amortizado en su totalidad, resultando un monto a pagar de RD\$2,907,336.66.

Como aspecto técnico de atención, se verificó que 710.00 ML correspondientes a la Calle Principal fueron ejecutados con una altura de 0.40 m, superior a los 0.30 m contemplados en el presupuesto, debido a las condiciones de dicha vía. Esta diferencia no fue reflejada de manera diferenciada en el presupuesto ni en la cubicación, por lo que se recomienda realizar el análisis de precio unitario correspondiente y gestionar el ajuste administrativo que proceda, en caso de que la parte contratante lo considere pertinente.

Finalmente, se identificó una observación documental relacionada con la firma de las partes contratante y contratista en el referido contrato. Si bien el documento se encuentra debidamente firmado y notariado por un notario, se recomienda que ambas partes procedan a completar las firmas e iniciales correspondientes en las páginas que así lo requieran, a fin de mantener debidamente formalizado el expediente contractual.

Los elementos ubicados bajo el nivel del terreno no fueron verificables mediante inspección visual. En términos generales, los trabajos observados presentan una ejecución física acorde con lo contratado y buena terminación visual.

6. FOTOGRAFIAS DE LAS CALLES INTERVENIDAS


Vengan a ver

Nombre de Calle: Principal




Vengan a ver

Nombre de Calle: Principal

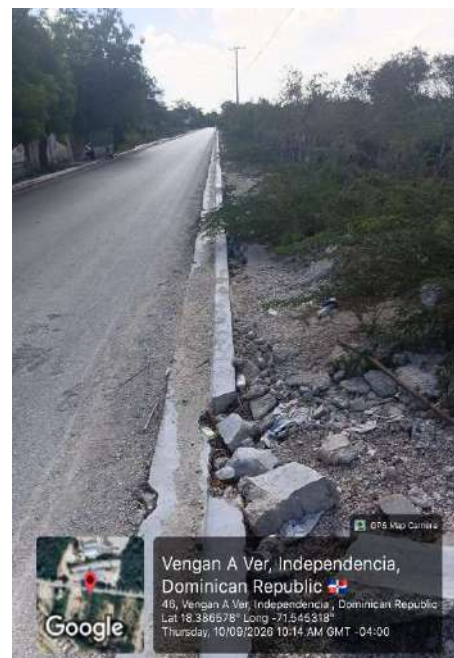


Vengan a ver

Nombre de Calle: 2

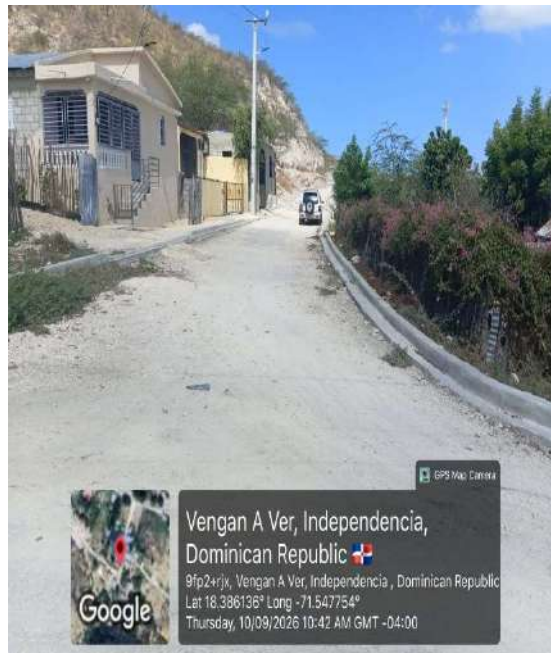

Vengan a ver

Nombre de Calle: 1

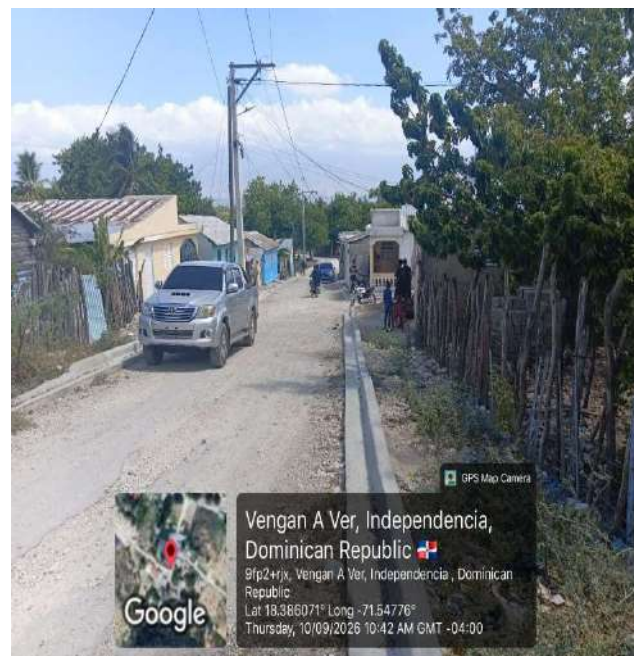

Las informaciones y otros insumos para la elaboración de este informe han sido suministrados por el gobierno local, en calidad de entidad ejecutora de los fondos transferidos desde el Ministerio de Hacienda y Economía para la ejecución de los proyectos de aceras y contenes, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26. El presente informe ha sido elaborado a requerimiento de Liga Municipal Dominicana, en calidad de entidad supervisora, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26.

Por la Liga Municipal Dominicana

Supervisor responsable del proyecto: STAYLIN MENDOZA HEREDIA

CODIA: 48530

Firma y sello:

Staylin M. H.

