



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

Santo Domingo, D.N.
06 de diciembre de 2023

Al:

Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía:

Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto:

Remisión de informe de cierre de ejecución de Ramón Santana.

En la visita técnica realizada el 10 de marzo de 2023 se validó la ejecución de 904.82 metros cuadrados de aceras y 1,929.80 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 535.40 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia que se ha ejecutado 904.82 metros cuadrados de aceras y 2,465.2 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Nota: En el 3er componente el gobierno local decidió construir sólo contenes para impactar más comunidades, y aprovechar el programa de asfaltado.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castillo de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 230301

REGIÓN: HIGUAMO

PROVINCIA: SAN PEDRO DE MACORÍS

MUNICIPIO: RAMÓN SANTANA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 10 de marzo de 2023

1. Ing. Edward Acosta

TÉCNICOS: 2. Elizabeth García

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ DEL MULTIUSO	229.90	0.99	1.00	229.90	1.00	228.61	229.90
TRAMO B	C/LIC. AGUEDA ESTHER	190.50	1.07	1.00	190.50	1.00	203.15	190.50
TRAMO C	C/CONCPCION BONA				266.20	1.00		266.20
TRAMO D	C/PROYECTO 1	468.40	0.77	1.00	468.40	1.00	360.09	468.40
TRAMO E	C/FCO. DEL OSARIO SANCHEZ				284.40	1.00		284.40
TRAMO F	C/JUAN BOSCH				100.60	2.00		201.20
TRAMO G	C/JOAQUIN BALAGUER				146.30	1.00		146.30
TRAMO H	C/MIGUEL COSS	138.20	0.82	1.00	142.90	1.00	112.97	142.90
Total							904.82	1,929.80

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,571,923.20

Monto desembolsado RD\$ 3,571,923.20 (100%)

Avance de obra 170.68%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: HIGUAMO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 10 de marzo de 2023

PROVINCIA: SAN PEDRO DE MACORÍS

MUNICIPIO: RAMÓN SANTANA

DISTRITO MUNICIPAL: -



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 904,82 metros cuadrados de aceras y 1,929,80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS




1. Según lo observado durante la visita técnica, los trabajos levantados se están haciendo correctamente y con la calidad adecuada.
2. En la visita se evidencio en la construcción de varias obras complementarias.
3. En algunos tramos de los badenes construidos se presentan deterioro debido al paso de equipos pesados por lo que se recomiendo su pronta reconstrucción.

IMÁGENES

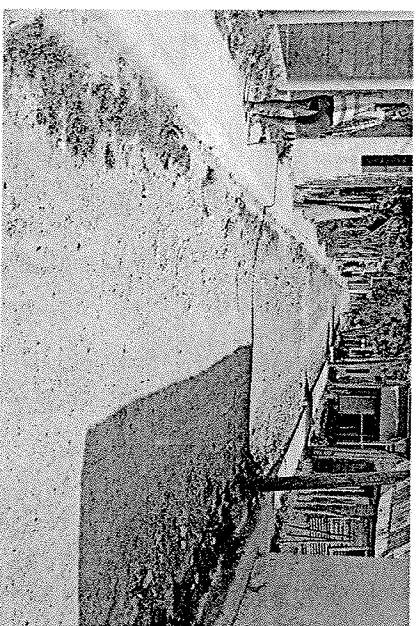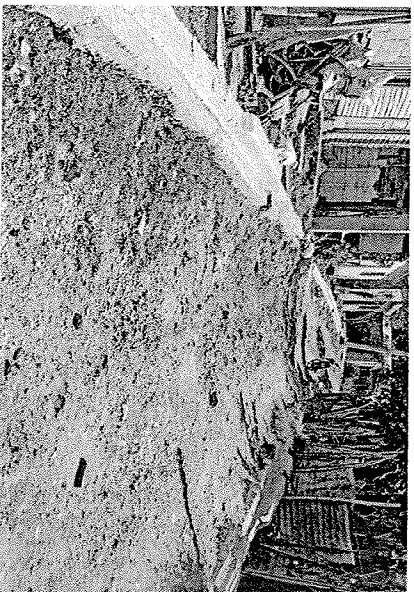



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

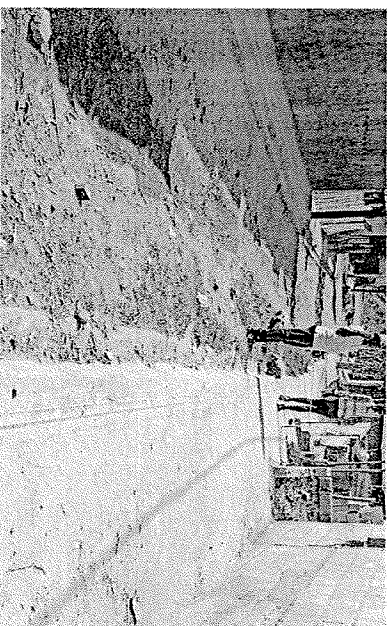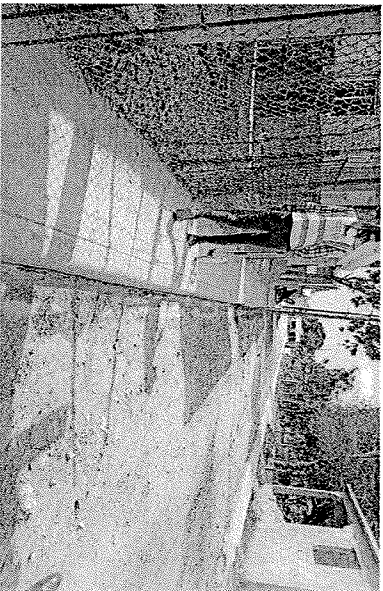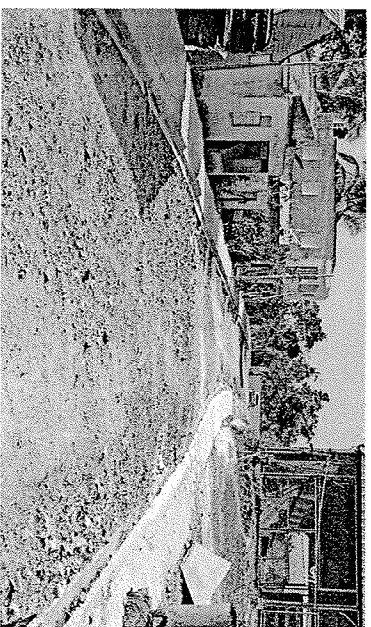

Suministra los datos de este reporte,


ING. EDWARD ACOSTA
Técnico


ELIZABETH GARCIA
Técnico

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: SAN PEDRO DE MACORIS

MUNICIPIO: RAMON SANTANA

DISTRITO MUNICIPAL: _____

BARRIO Y/O SECTOR: _____

BARRIO NUEVO

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local ☐
- b. Contratista ☐

Razón Social	JONATHAN A.SIERRA
RNC ó Cédula:	030005570-1

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros:

CONSTRUCCION DE CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Calles 1000 y 1100	18.5482353	-69.1809789	18.5489953	-69.1788680	—	—	267.7	—	535.40
Tramo B										
Tramo C										
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

