



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

Santo Domingo, D.N.
26 de abril de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de reporte de cierre de ejecución del DM Quita Sueño**


En la visita técnica realizada el 19 de mayo de 2022 se validó la ejecución de 519.495 metros cuadrados de aceras y 423.9 metros lineales de contenes, mientras que en la siguiente visita realizada el 24 de abril del 2023 se validó la ejecución de 824.94 metros cuadrados de aceras y 814.80 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 118.495 metros cuadrados de aceras, y 196.25 metros lineales de contenes con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 1,462.93 metros cuadrados de acera y 1,434.95 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL -DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 240102

REGIÓN: CIBAO SUR

PROVINCIA: SÁNCHEZ RAMÍREZ

MUNICIPIO: COTUI

DISTRITO MUNICIPAL: QUITA SUEÑO

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 19 de mayo de 2022

1. Arq. Zunilda Del Rosario

TÉCNICOS: 2. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Calle 4	106.50	0.92	1			97.79	
TRAMO B	Calle 3	160.90	1.11	1	125.30	1	178.27	125.3
TRAMO C	Calle 12	11.90	0.95	1			11.305	
TRAMO D	Calle Prolongación 16 de agosto	188.50	0.73	1	190.4	1	138.36	190.4
TRAMO E	Calle 1	54.10	0.87	2	54.1	2	93.77	108.2
Total							519.495	423.9

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,989,523.09
Monto desembolsado RD\$ 1,494,761.55 50%
Avance de obra 56.52%



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO SUR

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 19 de mayo de 2022

PROVINCIA: SÁNCHEZ RAMÍREZ

MUNICIPIO: COTUÍ

DISTRITO MUNICIPAL: QUITA SUEÑO




REPORTE

A la fecha de 19/05/2022 se ha ejecutado 519.50 metros cuadrados de aceras y 423.90 metros lineales de contén, lo que corresponde al 56.52% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Se pudo observar mala terminación en algunos tramos de aceras construidas, debido a que no se colocaron las reglas para la elaboración de los cantos laterales.

IMÁGENES

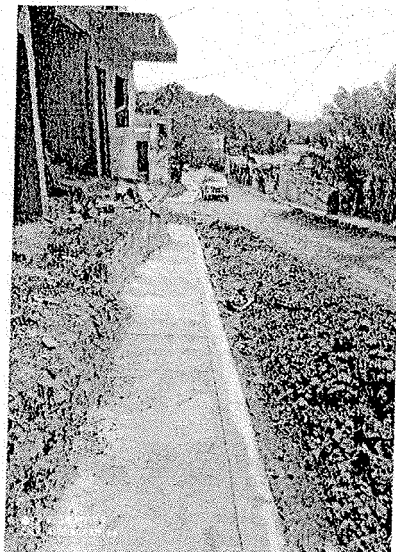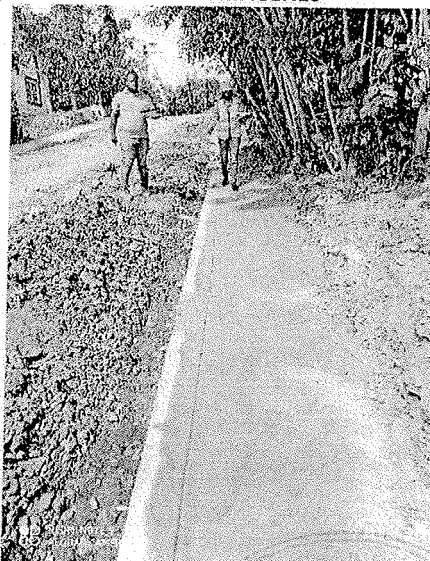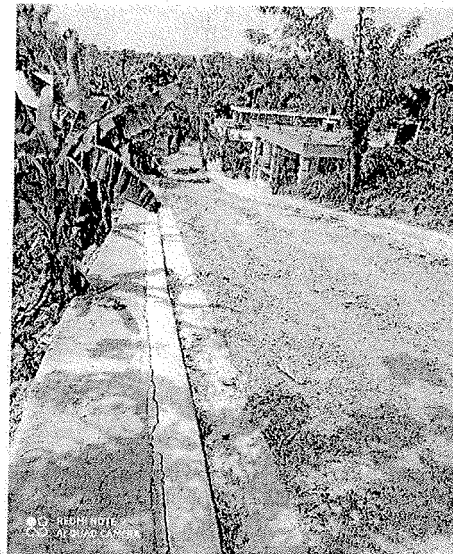


Suministra los datos de este reporte,


Zunilda Del Rosario G.
ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO

Técnico

Ing. Staylin Mendoza
ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 240102

REGIÓN: CIBAO SUR

PROVINCIA: SÁNCHEZ RAMÍREZ

MUNICIPIO: COTUI

DISTRITO MUNICIPAL: QUITA SUEÑO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 21/04/2023


1. Felipe Reyes

TÉCNICOS: 2. Ing. Richard Cabrera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	LOS TANQUES							
TRAMO B	C/3ER	46.90	0.73	1	50.90	1	34.237	50.9
TRAMO C	C/3ER	80.50	1.00	1	100.20	1	80.5	100.2
TRAMO D	C/1RA	88.80	0.86	1	88.80	1	76.368	88.8
TRAMO E	URBANISACION LA MARIA							
TRAMO F	C/1ERA	62.40	1.00	1	64.4	1	62.4	64.4
TRAMO G	C/1ERA	47.40	0.55	1	47.4	1	26.07	47.4
TRAMO H	C/1ERA	39.20	0.66	1	39.2	1	25.872	39.2
TRAMO I	CALLE 4	106.50	0.92	1			97.79	
TRAMO J	Calle 3	160.90	1.11	1	125.30	1	178.27	125.3
TRAMO K	Calle 12	11.90	0.95	1			11.305	
TRAMO L	Calle Prolongación 16 de agosto	188.50	0.73	1	190.4	1	138.36	190.4
TRAMO M	Calle 1	54.10	0.87	2	54.1	2	93.77	108.2
Total							824.94	814.80

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,989,523.09
Monto desembolsado RD\$ 2,989,523.09 (100%)
Avance de obra 101.61%



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO SUR
PROVINCIA: SÁNCHEZ RAMÍREZ
MUNICIPIO: COTUÍ
DISTRITO MUNICIPAL: QUITA SUEÑO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 21/04/2023




INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 824.94 metros cuadrados de aceras y 814.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Se pudo observar una variación en el ancho de la acera que oscilaban entre 0.70m, 0.85m etc...
2. También nos encontramos con una buena terminación tanto de acera como de contenes.

IMÁGENES

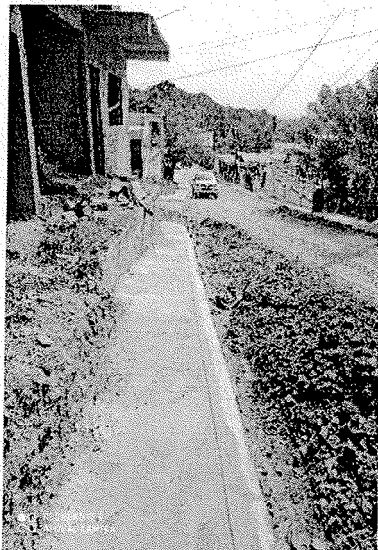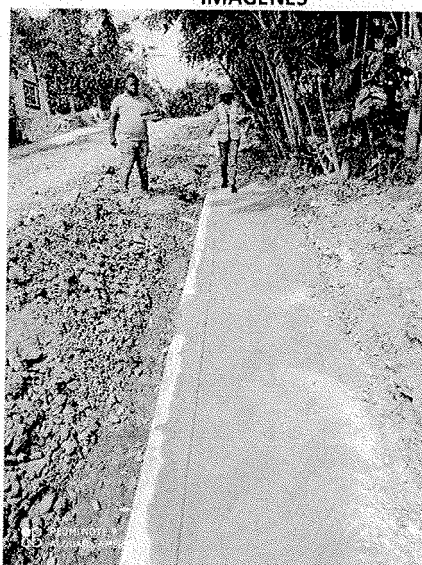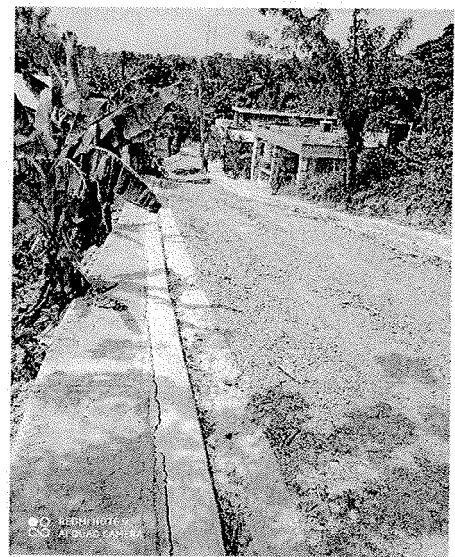



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

Suministra los datos de este reporte,

FELIPE REYES
Técnico

ING. RICHARD CABRERA
Técnico





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

3er Componente

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO: COTUI
DISTRITO MUNICIPAL: QUITA SUEÑO
BARRIO Y/O SECTOR: LA ESTANCIA

--

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local ☐
b. Contratista ☒

Razón Social: JUAN LUIS GONZALEZ UREÑA
RNC ó Cédula: 057-0014510-4

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
b. Incluye demoliciones de tramos:
c. Incluye badenes: ☐
d. Otros:

CONSTRUCCION DE 118-48 METROS CUADRADOS DE ACERAS Y 196.25 METROS LINEALES DE CONTENES EN EL SECTOR LA ESTANCIA

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Calle Lado derecho	19.050747	70.159782	19.050417	70.159363	11.5	0.90	11.5	10.35	11.5
Tramo B	Calle Lado derecho	19.050747	70.159782	19.050417	70.159363	25.02	1.00	25.02	25.02	25.02
Tramo C	Calle Lado derecho	19.050747	70.159782	19.050417	70.159363	4.00	1.35	4.00	5.4	4.00
Tramo D	Calle Lado derecho	19.050747	70.159782	19.050417	70.159363	7.4	0.75	7.4	5.55	7.4
Tramo E	Calle Lado derecho	19.050747	70.159782	19.050417	70.159363	5.2	0.74	5.2	3.848	5.2
Tramo F	Calle Lado derecho	19.050747	70.159782	19.050417	70.159363	3.2	0.62	3.2	1.984	3.2
Tramo G	Calle Lado derecho	19.050747	70.159782	19.050417	70.159363			3.7		3.7
Tramo H	Calle Lado derecho	19.050747	70.159782	19.050417	70.159363	6.6	1.15	6.6	7.59	6.6
Tramo I	Calle Lado izquierdo	19.050747	70.159782	19.050417	70.159363	6.02	1.12	6.02	6.74	6.02
Tramo J	Calle Lado izquierdo	19.050747	70.159782	19.050417	70.159363	4.00	0.60	4.00	2.4	4.00
Tramo K	Calle Lado izquierdo	19.050747	70.159782	19.050417	70.159363	3.90	0.47	3.90	1.833	3.90
Tramo L	Calle Lado izquierdo	19.050747	70.159782	19.050417	70.159363	3.5	0.34	3.5	1.19	3.5

5.77.5



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M	Calle Lado izquierdo	19.050747	70.159782	19.050417	70.159363	3.00	1.07	3.00	3.21	3.00
Tramo N	Calle Lado izquierdo	19.050747	70.159782	19.050417	70.159363	20.5	0.95	20.5	19.475	20.5
Tramo O	Calle Lado izquierdo	19.050747	70.159782	19.050417	70.159363			2.4		2.4
Tramo P	Calle Lado izquierdo	19.050747	70.159782	19.050417	70.159363	14.5	1.00	14.5	14.5	14.5
Tramo Q	Calle Lado izquierdo	19.050747	70.159782	19.050417	70.159363	5.70	1.65	5.70	9.405	5.70
Tramo R	Calle Lado izquierdo	19.050417	70.159363	19.050510	70.159458			55.08		55.08
Tramo S	Calle Lado derecho	19.050417	70.159363	19.050322	70.159264			11.03		11.03
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										


5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Plantilla de los contenes 0.35x0.45

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

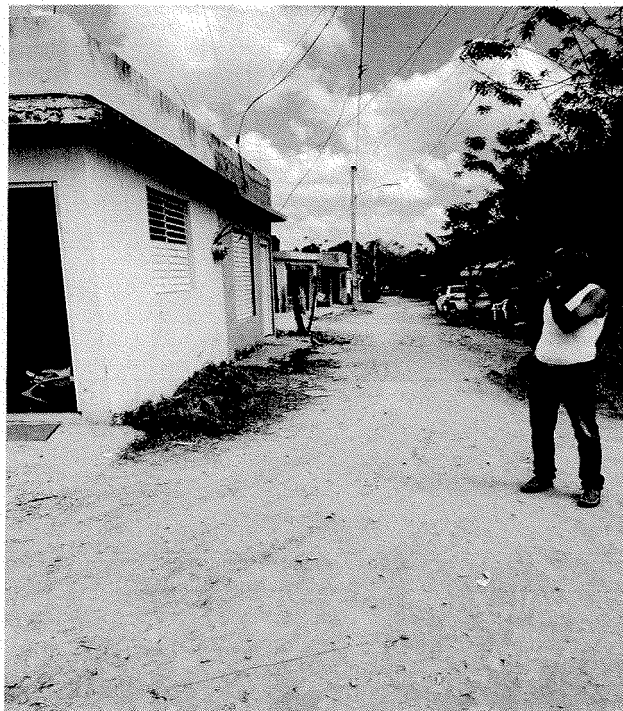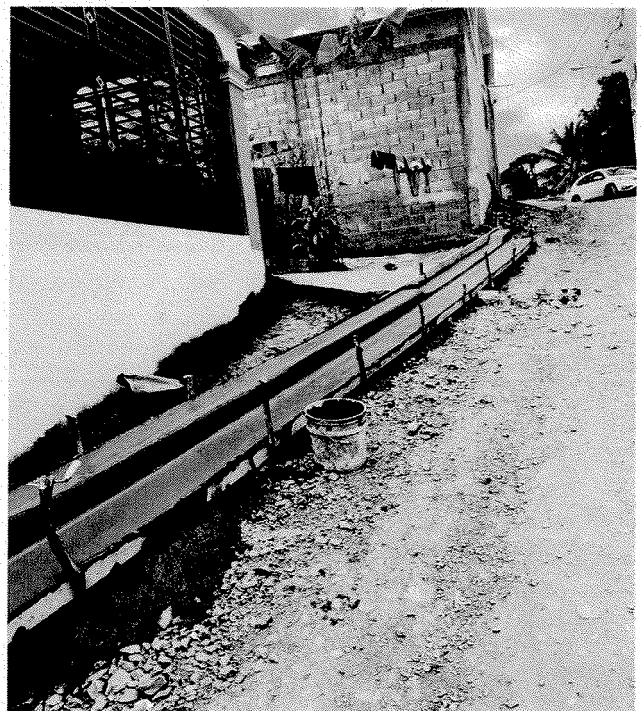

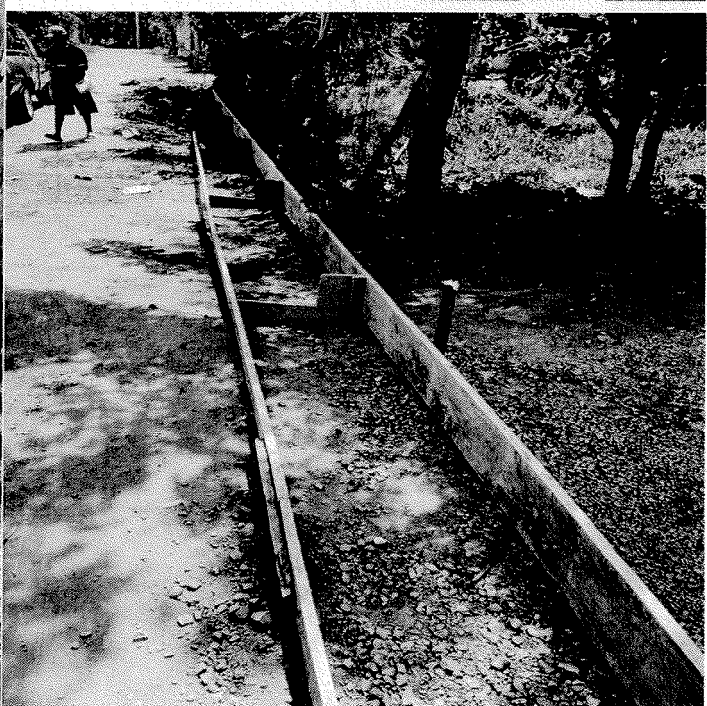

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Juliana Muñoz D.

CÉDULA:

056-0148422-2


CODIA:

25464

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

02/03/23

Valida y aprueba los datos suministrados,



Bertha
Firma y sello
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal

