




**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

Santo Domingo, D.N.
19 de septiembre de 2023


Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna 
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de avance de ejecución de obra de la Construcción de un Cementerio tipo C en La Ciénaga Barahona**

Mediante el informe presentado por el supervisor de la obra, Validamos que esta se encuentra en un avance del 11 % aproximadamente.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales

Martes, 12 de septiembre de 2023

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. LOCALIZACIÓN

Provincia: Barahona

Municipio: La Cienaga

Distrito Municipal: -

Barrio y/o sector: Centro Del Pueblo, La Cienaga


2. PROYECTO

Construcción, de cementerio tipo C.

3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

LATITUD

LONGITUD

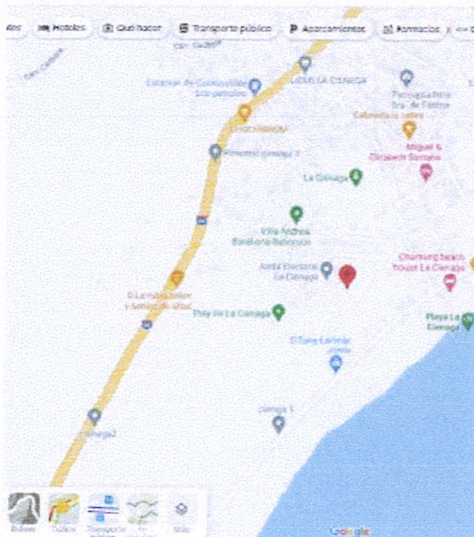

1. $18^{\circ}03'55.9''N$ $71^{\circ}06'24.7''W$

1. $18.065528, -71.106861$

8. ANEXAR CUBICACIÓN

Nota: Dichas cubicaciones deben estar validadas por el contratista y el Gobierno Local

9. OBSERVACIONES

El proceso de desarrollo del proyecto va muy bien, pero hemos hecho énfasis en que se guarde la integridad del proyecto, como también todos los controles de calidad que el mismo amerite en todas sus fase.

10. SUMINISTRADO Y VALIDADO POR:



Yonatan Trujillo

Codia: 32038

Cedula: 066-0022819-8

SUPERVISOR

[Handwritten Signature]

ALCALDE

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN

1. Datos Generales

Título del Proyecto	Construcción de Cementerio Tipo C	
Nombre de la autoridad municipal:	Jose Francisco Moreta Feliz	
Gobierno Local:	Municipio La Cienaga	
Supervisor que prepara el reporte:	Ing. Yonatan Talabera M	
Fecha de inicio del proyecto:	Fecha de finalización del proyecto:	Fecha de elaboración del reporte de Avance actual:
20/03/2023	20/12/2023	12/09/2023

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN

Fecha de elaboración de Informes anteriores

Informe 1:

19/05/2023

Informe 2:

Informe 3:

Informe 4:

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN

2. Actividades

2.1 Cronograma de Actividades

Copiar el cronograma/ o en su defecto partidas y subpartidas presupuestadas y validadas por el gobierno local, tal y como se elaboró en el documento de proyecto. Señalar con distintos colores aquellas actividades/partidas que se han realizado y aquellas que están en ejecución.

Nota : En el presupuesto que anexamos solo están marcadas las actividades realizadas que están en el presupuesto base, ya que la otra actividad de movimiento y compactación de tierra no está en el mismo.

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN

2.2 Actividades realizadas

Partidas o tareas	Fecha de Inicio	Fecha de término	Descripción de avance	Porcentaje de ejecución física de Avance %	Observaciones
<i>Según Presupuesto del Proyecto</i>			<i>Actividad realizada hasta la fecha de elaboración del presente Informe</i>	<i>Porcentaje o grado de avance del indicador</i>	<i>Comentarios sobre posibles modificaciones, ajustes o cambios respecto a lo planificado</i>
Letrero, Limpieza del solar, Relleno Compactado, Zanja Perimetral de Muros, Caseta de Materiales, Zapata y Acero de columnas de muros, Etc.	20/03/2023	20/12/2023	11	10%, del presupuesto base, y un 100% de la otra tarea realizada	Se ha Hecho un Gran Movimiento de Tierra y También Compactado.

--	--	--	--	--	--

Informe de Avance de Proyectos en el Marco del Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales Para Obras de

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN

--	--	--	--	--	--

2.3 Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del proyecto

Producto del proyecto al que pertenecen	Actividad realizada	Observaciones
	Movimiento de Tierra bajo nivel de piso	Terreno muy accidentado
		Alto volumen de relleno, bajo nivel de piso

3. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del proyecto

Limitaciones	Actividades correctivas desarrolladas	Acciones correctivas por desarrollar
La topografía del terreno	Rellenar y Compactar	Completar el relleno, y Compactar Cuando se Hagan los Muros

Anexos: evidencias fotográficas en orden cronológico y con descripción de partidas

1. SUMINISTRADO Y VALIDADO POR:



Yonatan Talabera M.
ING. YONATAN TALABERA M.

Jose Francisco Moreta Feliz
JOSE FRANCISCO MORETA FELIZ

Codia:

ALCALDE

Cedula:


SUPERVISOR

ANEXO TRABAJO DE MOVIMIENTO DE TIERRA







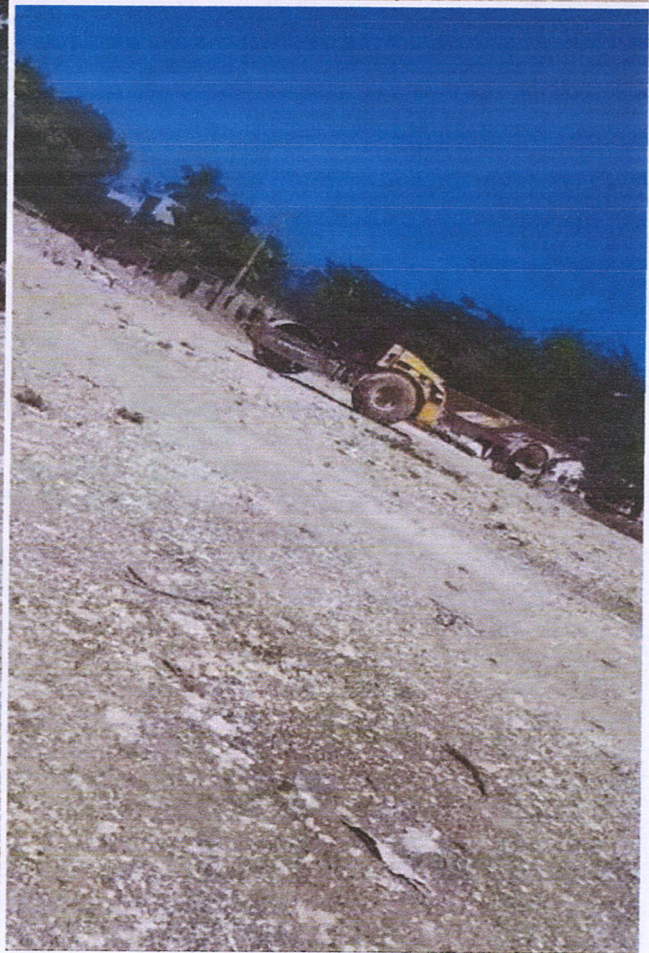



Infraestructuras de Competencia Municipal Página

