

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 060702

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: DUARTE

MUNICIPIO: EUGENIO MARÍA DE HOSTOS

DISTRITO MUNICIPAL: SABANA GRANDE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 5 de mayo de 2023

1. Ing. Richard Cabrera

TÉCNICOS: 2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	MARIA HERNANDEZ	400.00	1.00	2	400.00	2	800	800
Total							800.00	800.00


AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,755,586.95

Monto desembolsado RD\$ 2,755,586.96 (100%)

Avance de obra 116.16%

LIGA MUNICIPAL —DOMINICANA—



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANTEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: DUARTE

MUNICIPIO: EUGENIO MARÍA DE HOSTOS

DISTRITO MUNICIPAL: SABANA GRANDE


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 800.00 metros cuadrados de aceras y 800.00 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. En la visita de inspección se observó una buena terminación de aceras y contén.
2. En este Levantamiento también cumplieron con las especificaciones recomendadas.



IMÁGENES

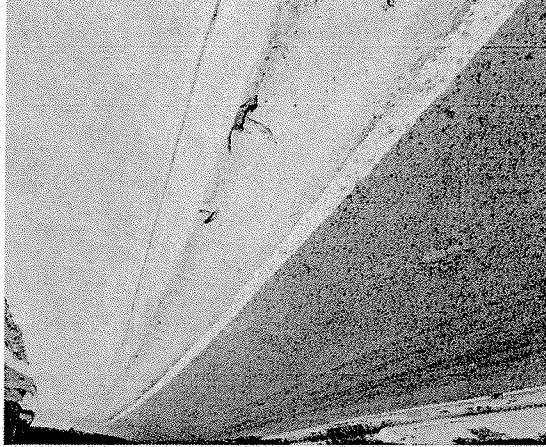

Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA
Técnico

FELIPE REYES
Técnico

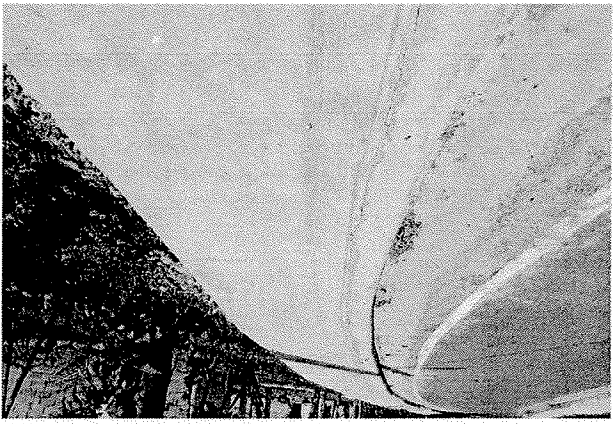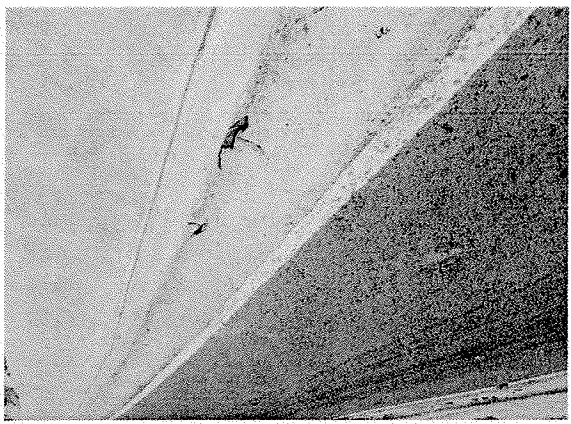

LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

