



Municipalidad de Guanamico

Tierra fértil donde fluye la alegría y la abundancia bajo el manto de la virgen de la Altagracia.

Guanamico, Puerto Plata,
16 de noviembre del año 2022.

Al: Ing. Valentin Santos Garcia
Subsecretario de Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial, Liga Municipal Dominicana.
Su despacho.

Asunto: Informe final del programa de construcción de aceras y contenes en el municipio.

Luego de un cordial saludo, le estamos remitiendo el informe final sobre el estado de la obra de construcción para cual recibimos fondos con las siguientes informaciones:

Obra ejecutada en el periodo que comprende desde 19 de julio del 2022 al 19 de septiembre del 2022, para un acumulado de 874.56 construcción de aceras y 874.56 de contenes, por el monto de RD \$ 3, 293,412.3 le anexamos las referidas cubicaciones e informes fotográficos de las distintas zonas impactadas a nivel municipal.

Sin más, atentamente;

Gertrudis González Núñez
Alcaldesa Municipal.





ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANANICO

**ING. DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ.
CODIA:41126**

**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN
EL MUNICIPIO DE GUANANICO.**

INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

01 DE NOVIEMBRE DEL 2022.



INFORME DE OBRA

ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, las actividades ejecutadas en el proyecto de Construcción de aceras y contenes en el municipio de guanamico, en el periodo del 19 de julio del 2022 al 19 de septiembre del 2022:

- Colocación de vallas informativas.
- Excavación manual y mecánica del material inservible.
- Colocación de relleno de mina.
- Compactación y nivelación del terreno.
- Ligado y vaciado de hormigón 180kg/cm2
- Construcción de aceras.
- Construcción de contenes.
- Levantamientos topográficos.
- Limpieza y bote del material inservible.

ZONAS IMPACTADAS.




Calle marcial francisco (arroyo viejito).



Agua larga (la Altagracia).



**SECTOR LA SABANA
(CALLE DE TOMAITA).**

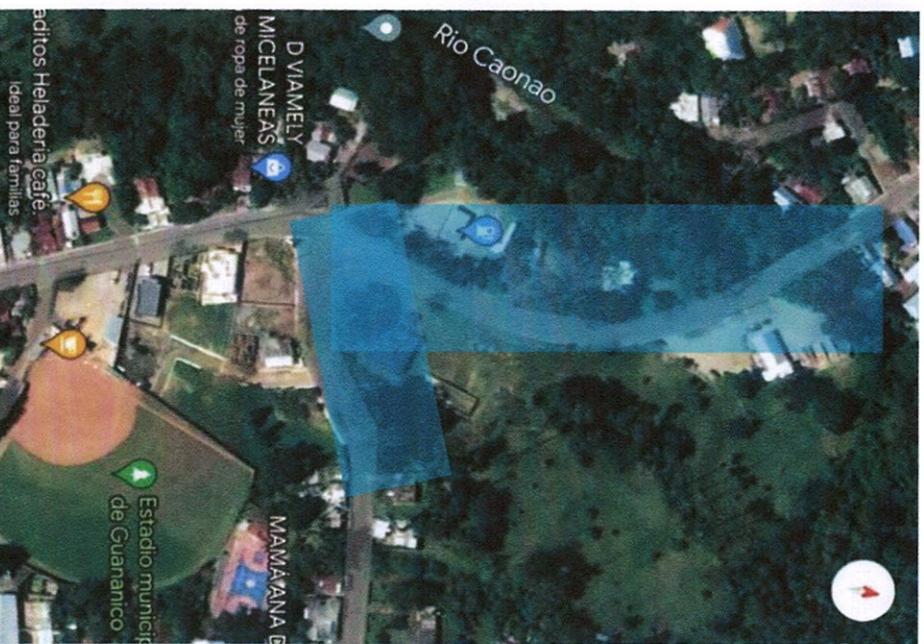

LA SABANA-CALLE MELLA

ING. DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ

TEL: 829-958-2301.

CODIA: 41126.

TERA CUBICACION DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE GUANANICO.

CUBICACION GENERAL

REPORTE GENERAL

FECHA DESDE: 19/07/22 HASTA:19/09/22

NO.	DESCRIPCION
1	CANTIDAD DE ACERAS A EJECUTAR: 874.56 M2 CANTIDAD DE CONTENES A EJECUTAR: 874.56 ML

1.1	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UDS.	ACUMULADO	%ACUMULADO.
1.1.1	CONSTRUCCION DE ACERAS	M2	874.56	100.00%
1.1.2	CONSTRUCCION DE CONTENES	ML	874.56	100.00%

ING. DIOSCAR L. FRANCISCO RODRIGUEZ.



PERSONAL PRESENTE EN OBRA.

INGENIERO RESIDENTE: 1

MAESTRO CONSTRUCTOR:1

ALBAÑILES: 2


TERMINADORES: 2

AYUDANTES: 6




INFORME FOTOGRAFICO


1-) Excavación del material inservible.

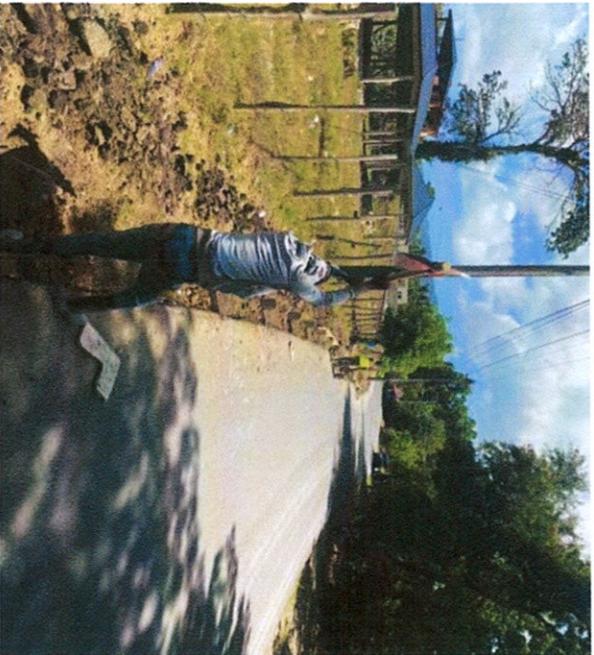

2-) Nivelación y compactación.

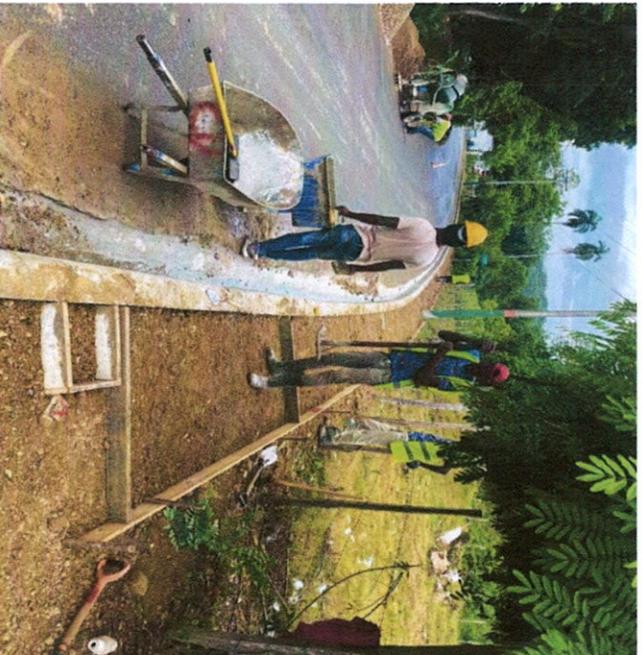

3-) Colocación de hormigón por paños.

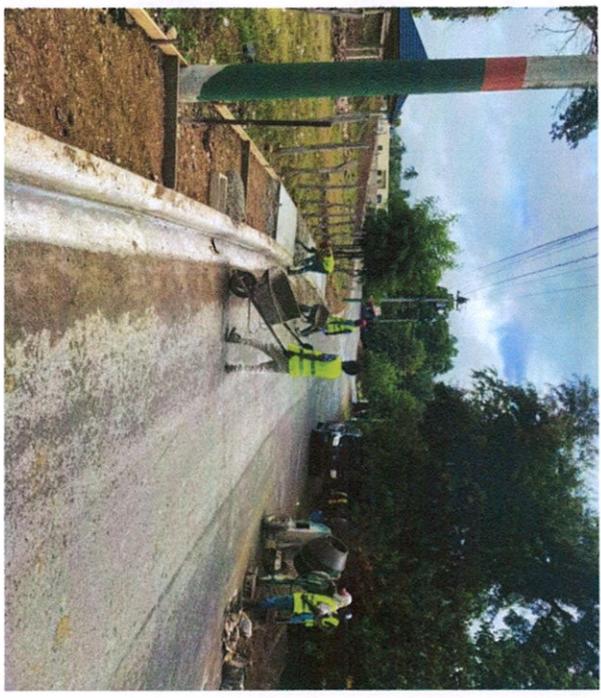



4-) Construcción de contenes.



5-) Levantamiento topográfico.



6-) Colocación de relleno.

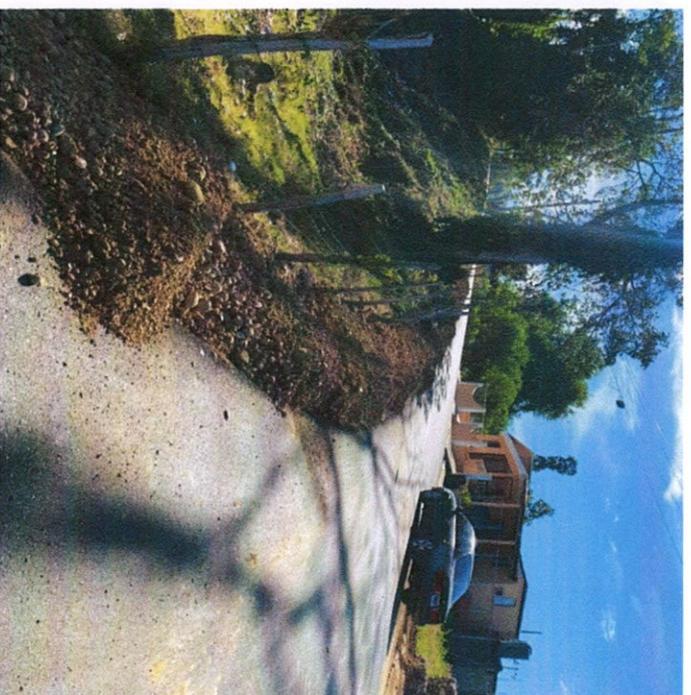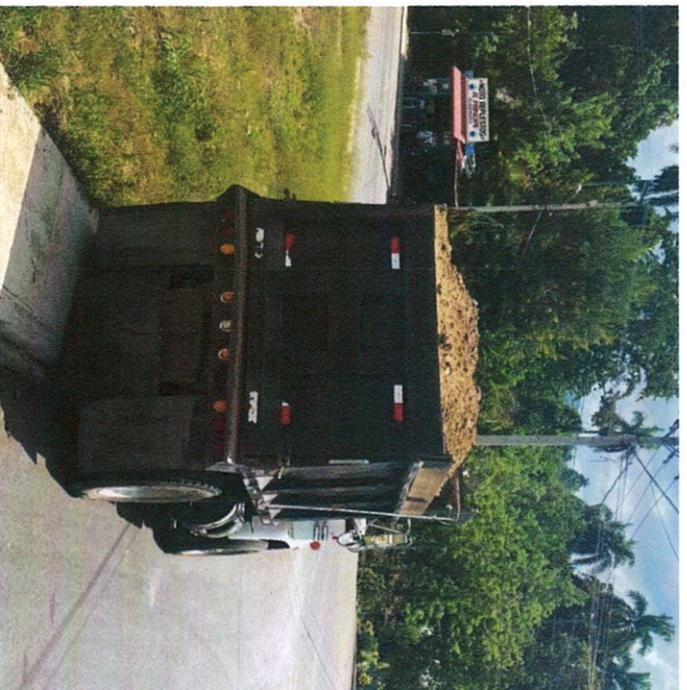

8/10/2024
5/10/2024

7-) Construcción de aceras.



8-) Limpieza y bote del material inservible.

