



LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 180501  
 REGIÓN: CIBAO NORTE  
 PROVINCIA: PUERTO PLATA  
 MUNICIPIO: LOS HIDALGOS  
 DISTRITO MUNICIPAL: -  
 FECHA DE VISITA TÉCNICA: 29 de septiembre de 2022  
 TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Rámirez  
 2. Ing. Asamín Ferreras

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE PRINCIPAL	28.00	1.00	1	779.30	1	28	779.3
TRAMO B	CALLE LOS ALTOS DE LA BOCA UNIFICO				300.50	1		300.5
TRAMO C	CALLE VUELTA LARGA	76.00	1.00	1	353.20	1	76	353.2
TRAMO D								
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							104.00	1433.00

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,588,082.90  
 Monto desembolsado RD\$ 3,588,082.91 (100%)  
 Avance de obra 104.60%



**LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —**

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN:** CIBAO NORTE  
**PROVINCIA:** PUERTO PLATA  
**MUNICIPIO:** LOS HIDALGOS  
**DISTRITO MUNICIPAL:** -

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 29 de septiembre de 2022

**INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN**

Mediante el presente informe se certifica que el Gobierno Local ha ejecutado 104.00 metros cuadrados de aceras y 1,433.00 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

**NOTAS**

En esta visita de inspección pudimos observar que el municipio de Los Hidalgos esta construyendo


1. más aceras que contenes.
2. Las coodenadas fueron tomadas con el gps.

**IMÁGENES**





LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

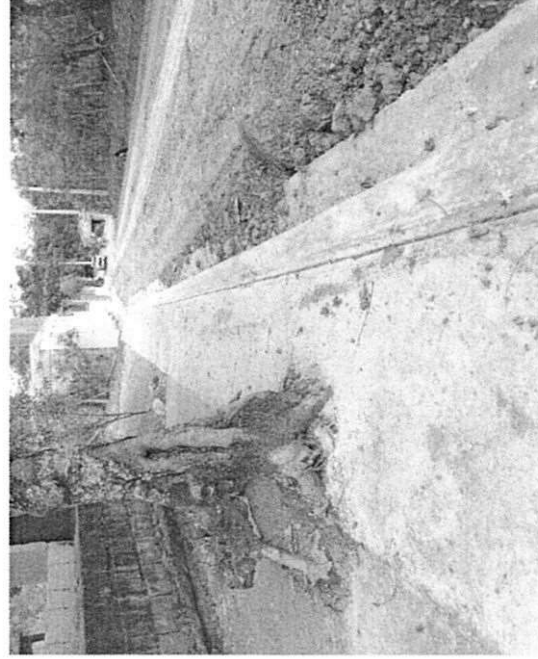

Suministra los datos de este reporte,

  
ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ  
Técnico

  
ING. ASAMIN FERRERAS  
Técnico

