

Santo Domingo, D.N.
27 de noviembre de 2023

Al:

Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía:

Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto:

Remisión de informe de Avance de Santiago Oeste.

En la visita técnica realizada el 29 de mayo de 2023 se validó la ejecución de 3,111.15 metros cuadrados de aceras y 3,840.80 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 1,473.63 metros cuadrados de aceras y 2,299.4 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 4,584.78 metros cuadrados de aceras y 6,140.2 metros lineales de contenes, lo que corresponde al 94 % de los fondos asignados para este territorio.


Para su conocimiento y fines de lugar,




Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales

LIGA MUNICIPAL -DOMINICANA-




SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 29 de mayo de 2025
TÉCNICOS: 1. Arq. Zuleida Del Rosario
2. Ing. Staylin Mendoza
CODIGO: 250108
REGION: CIBAO NORTE
PROVINCIA: SANTIAGO
MUNICIPIO: SANTIAGO
DISTRITO MUNICIPAL: SANTIAGO OESTE

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Antigua Autopista Duarte	382.00	1.00	2.00	382.00	2.00	764.00	764.00
TRAMO B	Antigua Autopista Duarte			2.00	156.20	1.00	-	156.20
TRAMO C	Principal Llanos del Ingenio a Valle Lindo	299.00	0.92	2.00	299.00	2.00	550.16	598.00
TRAMO D	Calle 2 de Valle Lindo	34.30	1.00	2.00	120.15	2.00	68.60	240.30
TRAMO E	PARADA 7, ANTIGUA CARRETERA DUARTE	316.90	1.00	2.00	340.30	2.00	633.18	680.60
TRAMO F	SAN MIGUEL CALLE 1	33.30	0.86	1.00	33.30	1.00	28.49	33.30
TRAMO G	SECTOR VALLE LINDO CALLE RESP. PENETRACION	174.75	0.84	2.00	204.75	2.00	293.54	409.50
TRAMO H	SECTOR VALLE LINDO CALLE 2	40.20	0.90	2.00	52.70	2.00	72.52	105.40
TRAMO I	SECTOR VALLE LINDO CALLE PENETRACION	74.40	0.89	2.00	77.30	2.00	131.93	154.60
TRAMO J	SECTOR VALLE LINDO CALLE 3	55.00	1.00	2.00	60.00	2.00	110.00	120.00
TRAMO K	SECTOR VALLE LINDO CALLE 4	59.20	0.91	2.00	59.55	2.00	107.47	119.10
TRAMO L	SECTOR VALLE LINDO CALLE 5	61.15	0.65	2.00	48.15	2.00	79.00	96.30
TRAMO M	SECTOR VALLE LINDO CALLE 6	34.40	1.26	1.00			43.28	
TRAMO N	SECTOR VALLE LINDO CALLE 4	40.65	0.89	2.00	40.65	2.00	72.03	81.30
TRAMO O	SECTOR ALEGRIA CALLE 70	14.00	0.85	2.00	70.10	2.00	23.80	140.20
TRAMO P	SECTOR ALEGRIA CALLE 71	69.50	0.96	2.00	71.00	2.00	133.15	142.00
Total							3,111.15	3,840.80

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA
Monto asignado RD\$ 11,992,539.45
Monto desembolsado RD\$ 5,996,269.73 (50%)
Avance de obra 113.08%



LIGA MUNICIPAL —DOMINICANA—

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: SANTIAGO

MUNICIPIO: SANTIAGO

DISTRITO MUNICIPAL: SANTIAGO OESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 29 de mayo de 2023

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 3,111.15 metros cuadrados de aceras y 3,840.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. La construcción cumple con los estándares recomendados, teniendo una óptima calidad.
2. La obra fue licitada y contratada.
3. Esta obra fue ejecutada en su totalidad.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

Arq. Elizabeth Quinlan

ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO

Técnico

Ing. Staylin Mendoza

ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico



PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA:	SANTIAGO
MUNICIPIO:	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
DISTRITO MUNICIPAL:	SANTIAGO OESTE
BARRIO Y/O SECTOR:	VILLA ROSA II,EL PROGRESO,LAS ALMENDRAS ANTIGUO VILLA ROSA III

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local	☐
b. Contratista	☒

Razón Social	1.ABSTRACTIS CONSTRUCTORA SRL, 2.OCTAVIO ABREU COLON,
RNC ó Cédula:	132-830067 031-0329456-1

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes: X
b. Incluye demoliciones de tramos: X
c. Incluye badenes:
d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		LONGITUD	LATITUD	LONGITUD	DE ACERAS	ANCHO DE LA ACERA	LONGITUD DE CONTENES	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		FINAL									
Tramo A	CALLE 1 HASTA LA CALLE 4	19°28'34.49"N	70°45'2.74"O	19°28'35.45"N	70°45'3.25"O	165	0.97	165	165	160.05	165
Tramo B	CALLE 4 UNIDO CON CALLE 2	19°28'36.13"N	70°45'3.40"O	19°28'33.45"N	70°45'3.76"O	98.3	0.73	97.80	97.80	71.76	97.8
Tramo C	CALLE 3	19°28'33.42"N	70°45'3.80"O	19°28'31.97"N	70°45'2.67"O			57.10			57.10
Tramo D	CALLE 3	19°28'32.11"N	70°45'2.86"O	19°28'35.58"N	70°45'4.82"O			124.30			124.30
Tramo E	CALLE 5	19°28'31.88"N	70°45'2.91"O	19°28'31.64"N	70°45'3.54"O			30.30			30.30
Tramo F	CALLE PRINCIPAL	19°28'31.37"N	70°45'2.03"O	19°28'32.69"N	70°45'2.21"O			55.70			55.70
Tramo G	CALLE PRINCIPAL	19°28'32.11"N	70°45'2.64"O	70°45'2.64"O	70°45'2.54"O	112.60	0.83	144.9		93.46	144.9
Tramo H	CALLE 4	19°28'35.06"N	70°45'6.20"O	19°28'34.17"N	70°45'6.86"O			46.80			46.80
Tramo I	CALLE 4B	19°28'35.10"N	70°45'6.07"O	19°28'34.37"N	70°45'6.25"O			27.20			27.20

Σ 335.77 3-749.2

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD	LONGITU D DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		FINAL										
Tramo A	INICIA EN LA CALLE 1	19°29'30.89"N	70°45'2.13"O	19°29'31.65"N	70°45'1.93"O	32.30	0.93	32.30	30.04	32.30	30.04	32.30
Tramo B	INICIA EN LA CALLE UNO	19°29'30.40"N	70°45'1.51"O	19°29'28.86"N	70°44'57.03"O	51.60	1.00	229.7	51.60	229.7	51.60	229.7
Tramo C	CALLE 2	19°29'31.20"N	70°45'1.39"O	19°29'29.73"N	70°44'58.19"O			90.8		90.8		90.8
Tramo D	INICIA EN LA CALLE 2	19°29'31.23"N	70°45'1.43"O	19°29'32.72"N	70°45'0.09"O	61.9	1.00	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9
Tramo E	CALLE 1	19°29'32.92"N	70°44'59.90"O	19°29'33.45"N	70°44'59.22"O	25.90	1.48	25.90	38.33	25.90	38.33	25.90
Tramo F	CALLE 1	19°29'33.55"N	70°44'59.06"O	19°29'33.94"N	70°44'57.10"O	52.90	1.35	52.90	71.42	52.90	71.42	52.90
Tramo G	INICIA EN LA CALLE 1	19°29'34.15"N	70°44'57.12"O	19°29'36.46"N	70°44'58.58"O	40.80	1.14	109.4	46.51	109.4	46.51	109.4
Tramo H	INICIA EN LA CALLE 4	19°29'36.65"N	70°44'59.29"O	19°29'33.60"N	70°44'59.99"O	51.70	0.90	147.5	46.53	147.5	46.53	147.5
Tramo I	CALLE 1	19°29'33.48"N	70°45'0.10"O	19°29'31.67"N	70°45'1.66"O	83.00	0.97	83.00	80.51	83.00	80.51	83.00

5 426.84 5 = 833.4



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE LA ACERA ANCHO	LONGITUD DE CONTENES	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD				
Tramo A Lado Derecho	CALLE 1, HASTA PRIMERA ENTRADA	19°28'31.29"N	70°45'26.17"O	19°28'31.10"N	70°45'25.19"O	31.5	1.2	37.8	31.5
Tramo B Lado Izquierdo	CALLE 1, HASTA PRIMERA ENTRADA	19°28'31.54"N	70°45'25.96"O	19°28'31.41"N	70°45'25.07"O	29.3	0.98	28.71	29.3
Tramo C Lado Derecho	CALLE 1, HASTA SEGUNDA ENTRADA	19°28'31.00"N	70°45'24.94"O	19°28'30.80"N	70°45'23.96"O	34.8	0.90	31.32	34.8
Tramo D Lado Izquierdo	CALLE 1, SEGUNDA ENTRADA	19°28'31.33"N	70°45'24.85"O	19°28'31.14"N	70°45'23.86"O	33.30	1.03	34.30	33.30
Tramo E Lado Derecho	CALLE 1, HASTA TERCERA ENTRADA	19°28'30.80"N	70°45'23.72"O	19°28'30.56"N	70°45'22.61"O	35.10	1.00	35.10	35.10
Tramo F Lado Izquierdo	CALLE 1, HASTA TERCERA ENTRADA	19°28'31.06"N	70°45'23.61"O	19°28'30.87"N	70°45'22.53"O	32.90	1.03	33.89	32.90
Tramo G Lado Derecho	CALLE 1, HASTA CUARTA ENTRADA	19°28'30.47"N	70°45'22.36"O	19°28'29.68"N	70°45'20.47"O	62.40	1.00	62.40	62.40
Tramo H Lado Izquierdo	CALLE 1, HASTA CUARTA ENTRADA	19°28'30.88"N	70°45'22.22"O	19°28'30.06"N	70°45'20.28"O	63.60	1.00	63.60	63.60
Tramo I Lado Derecho	CALLE 1, HASTA QUINTA ENTRADA	19°28'29.64"N	70°45'20.29"O	19°28'28.85"N	70°45'18.58"O	55.60	1.00	55.60	55.60
Tramo J Lado Izquierdo	CALLE 1, HASTA QUINTA ENTRADA	19°28'29.92"N	70°45'20.19"O	19°28'29.13"N	70°45'18.46"O	57.10	1.00	57.10	57.10



Tramo K Lado Derecho	CALLE 1, HASTA SEXTA ENTRADA	19°28'28.75"N 70°45'18.47"O	19°28'27.42"N 70°45'14.07"O	145.00	145.00	1.00	145.00	136.20	145.00	145.00
Tramo L Lado Izquierdo	CALLE 1, HASTA SEXTA ENTRADA	19°28'28.99"N 70°45'18.32"O	19°28'27.80"N 70°45'13.90"O	136.20	136.20	1.00	136.20	136.20	136.20	136.20

Σ = 721.02 Σ = 716.8

SERVACIONES Y RECOMENDACIONES

721.02 m2 de Aceras y 716.8 m de Contenes. Se recomendó al ingeniero realizar una limpieza de todas las aceras y contenes

5- FOTOGRAFÍAS DE LA CALLE A INTERVENIR

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

YABERLIN VENTURA TORIBIO

Yaberlin Ventura T.

CÉDULA:

094-0024487-8

CODIA:

40742

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

04 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Valida y aprueba los datos suministrados,



Yaberlin Ventura T.

Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



**COLEGIO DOMINICANO
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS
Y AGRIMENSORES (CODIA)**

APELLIDOS:

VENTURA TORIBIO

NOMBRES:

YABERLIN


PROFESION: INGENIERO CIVIL

EXEQUATUR: 60

DIF: 29/01/2020

CEDULA: 094-0024487-8

COLEGIATURA: 40742

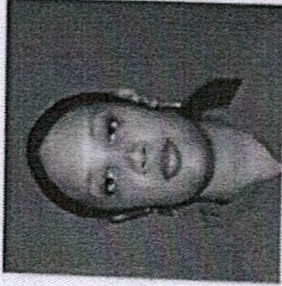

Yaberlin Ventura T.

Firma Colegiado

Firma Presidente



**REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL**

094-0024487-8

LUGAR DE NACIMIENTO:

EL LIMON, VILLA GONZALEZ, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO:

27 OCTUBRE 1992

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

SEXO: F SANGRE: O+ ESTADO CIVIL: SOLTERA

Ocupación: ESTUDIANTE


FECHA DE EXPIRACIÓN:

27 OCTUBRE 2024




Yaberlin Ventura T.

**YABERLIN
VENTURA TORIBIO**

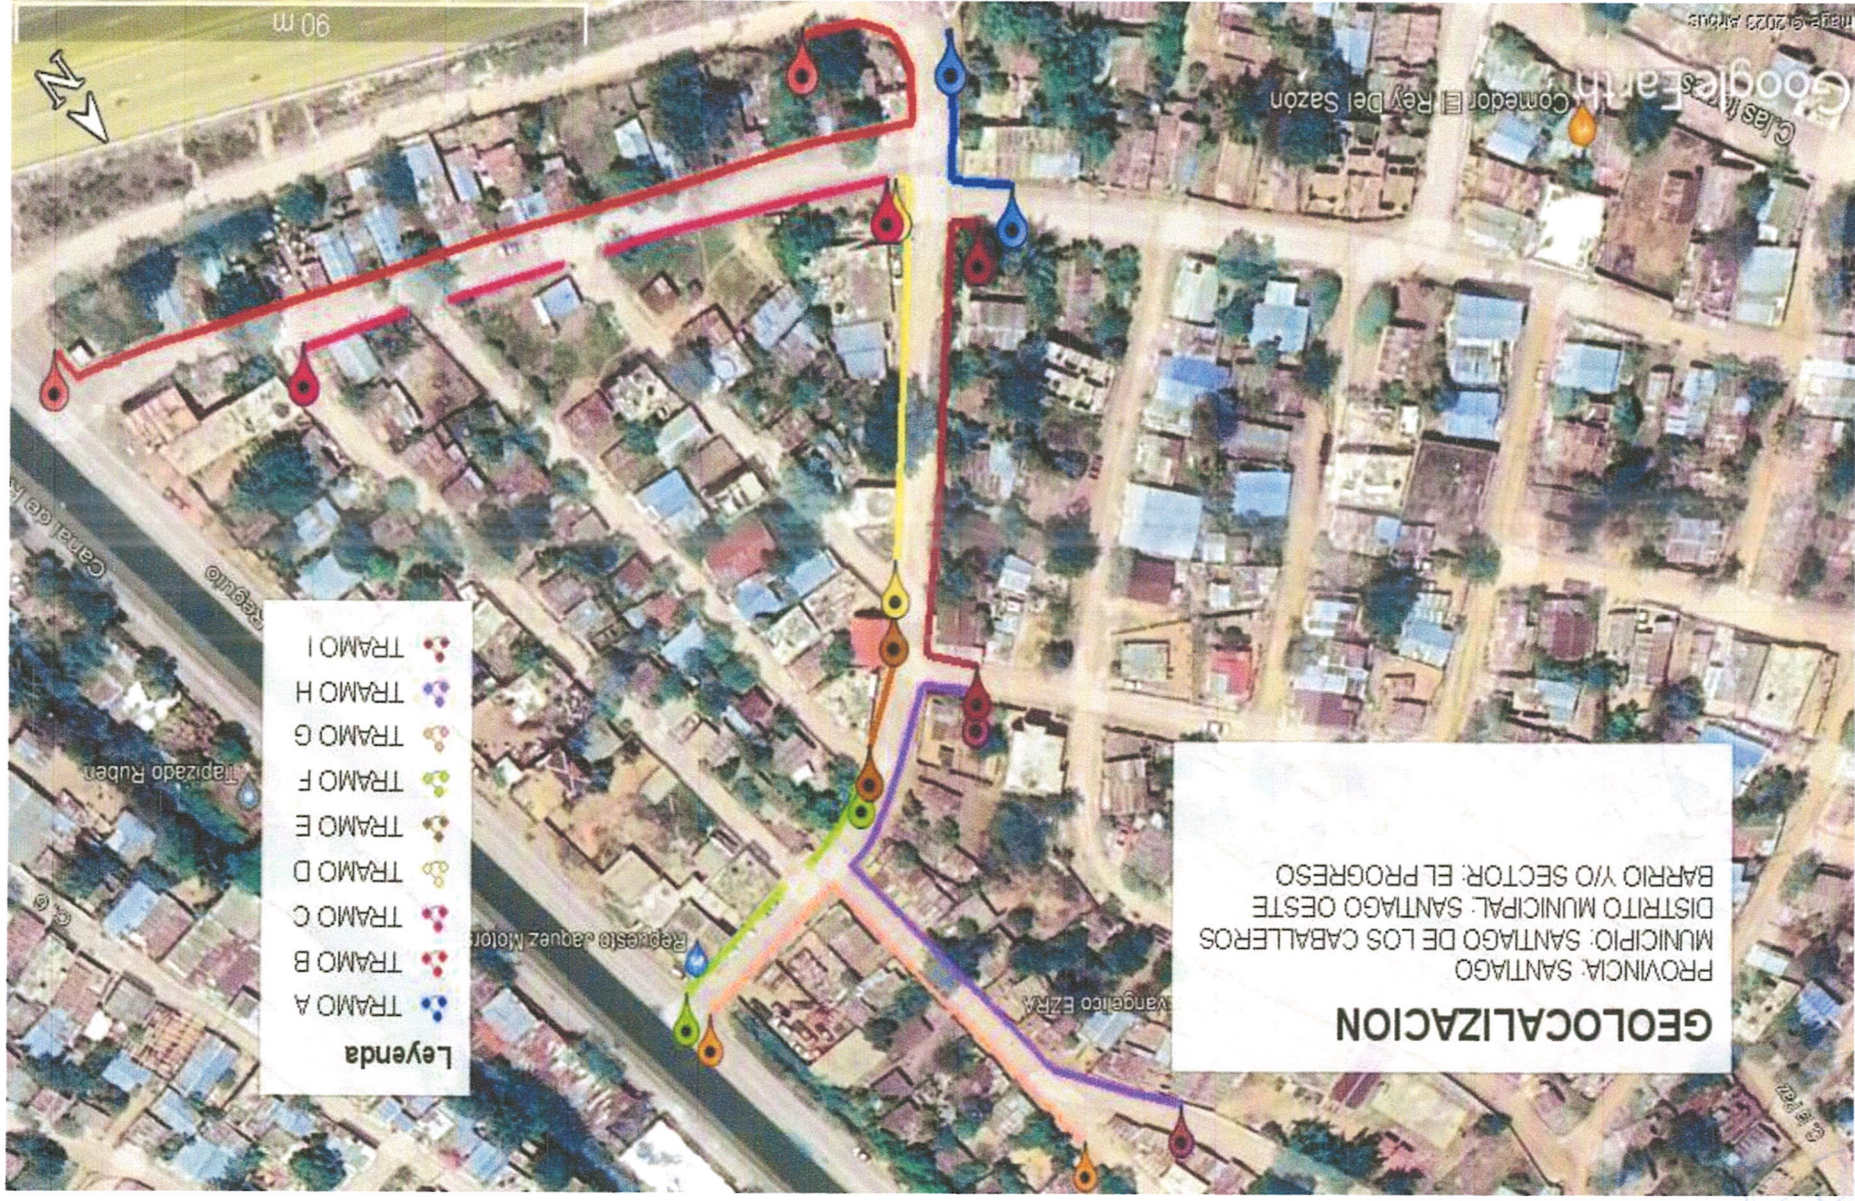



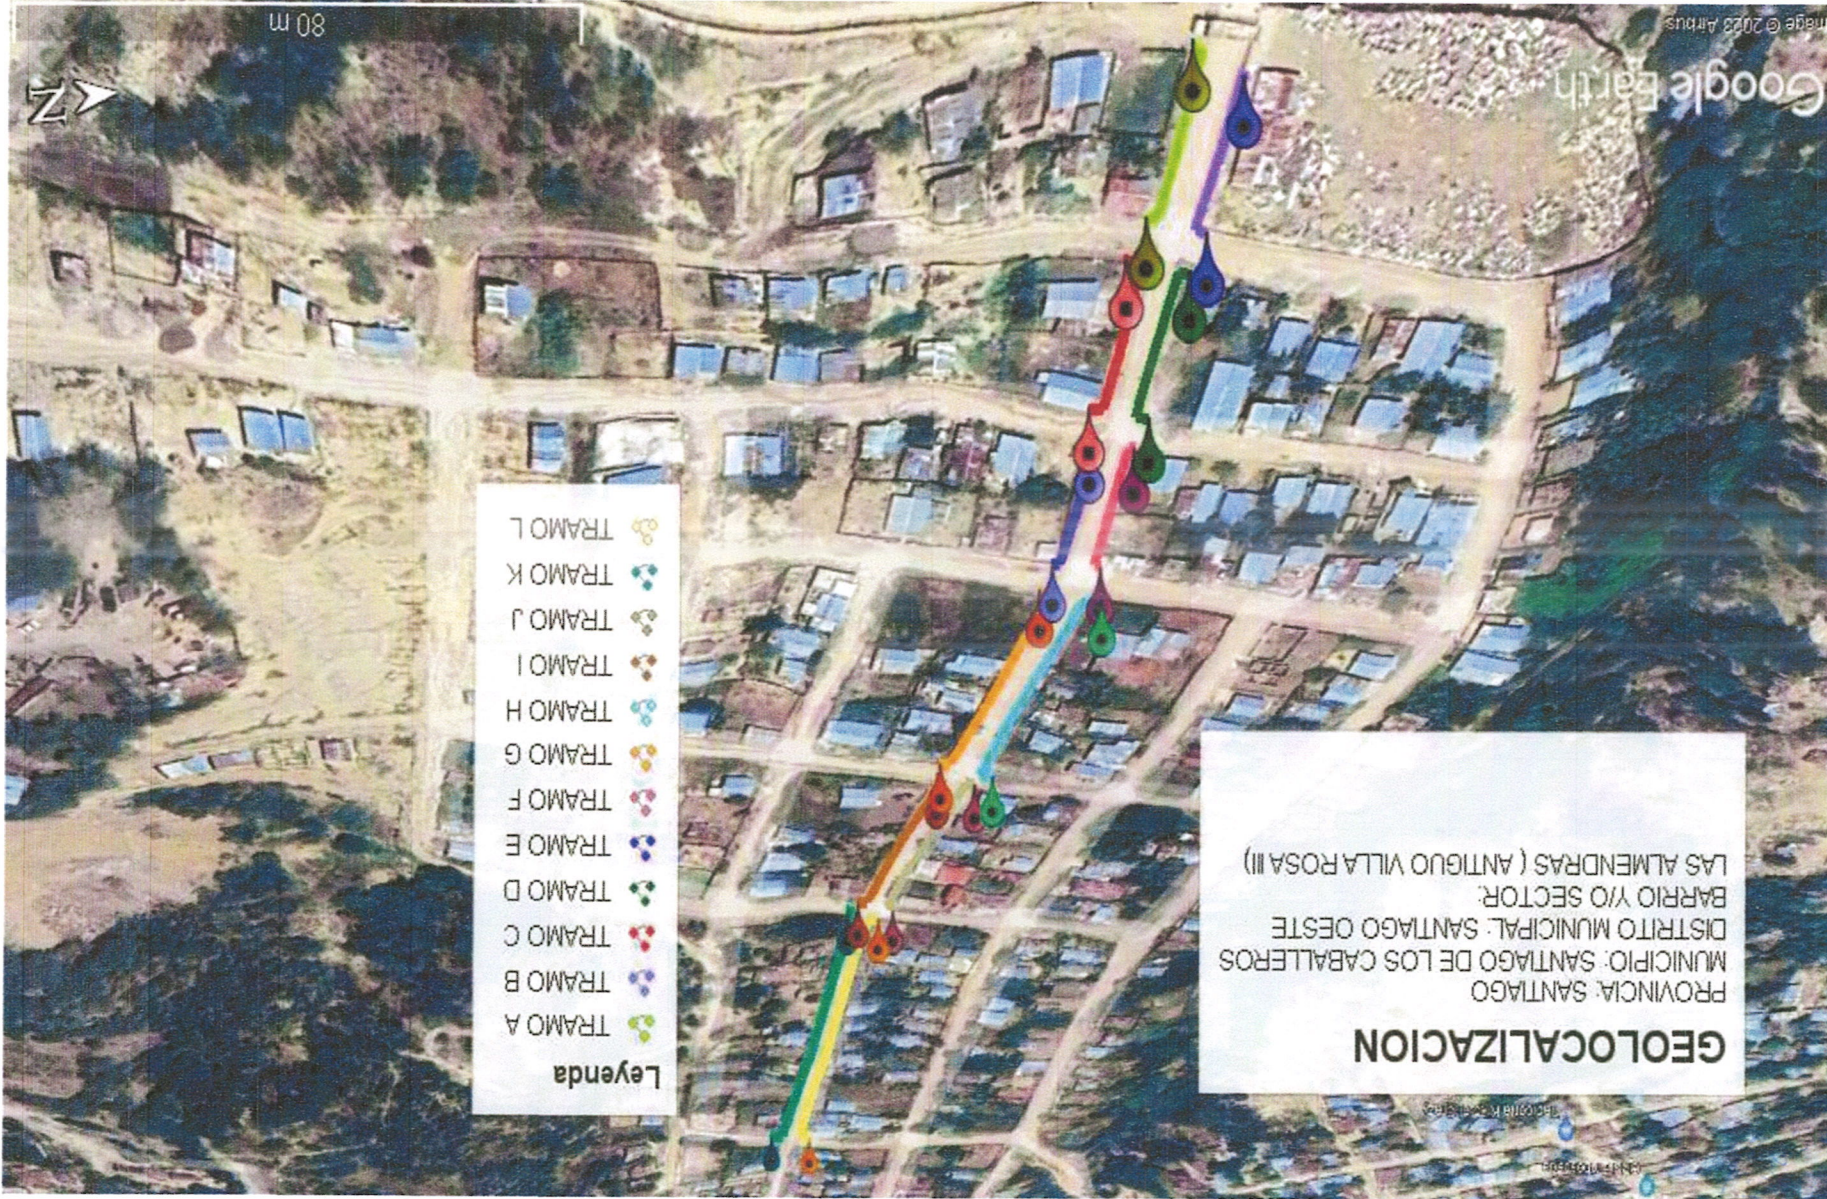




VILLA ROSA II (ENS.ALMA ROSA I)





VILLA ROSA II (ENS.ALMA ROSA I)



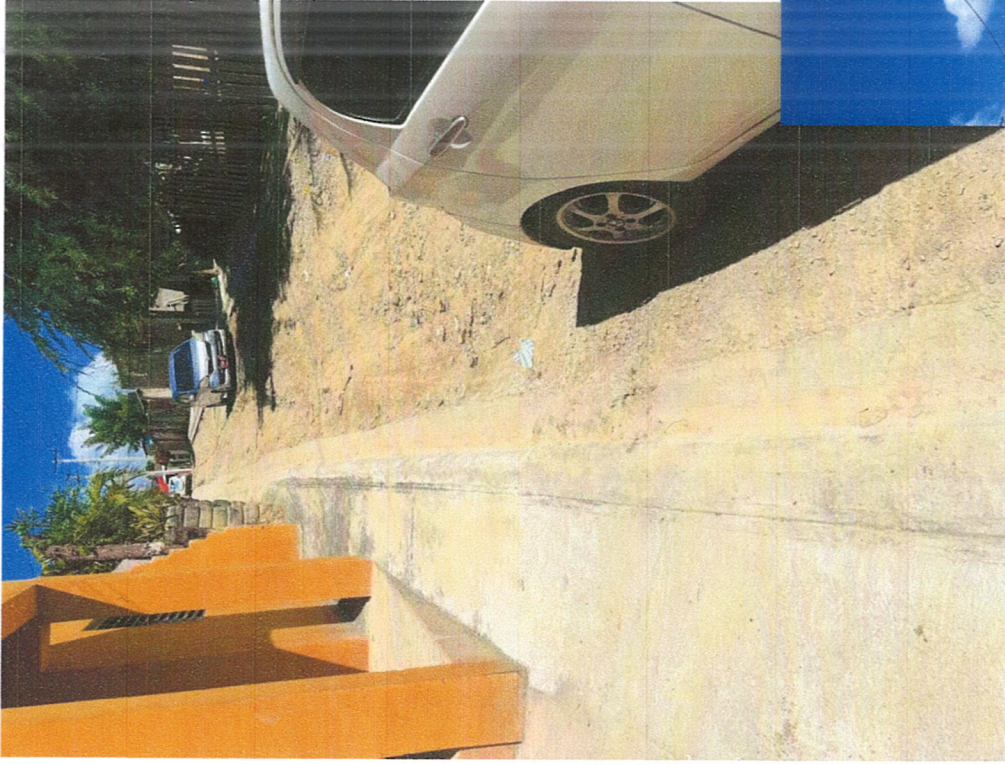

VILLA ROSA II (ENS.ALMA ROSA I)





VILLA ROSA II (ENS. ALMA ROSA I)






VILLA ROSA II (ENS.ALMA ROSA I)





VILLA ROSA II (ENS.ALMA ROSA I)



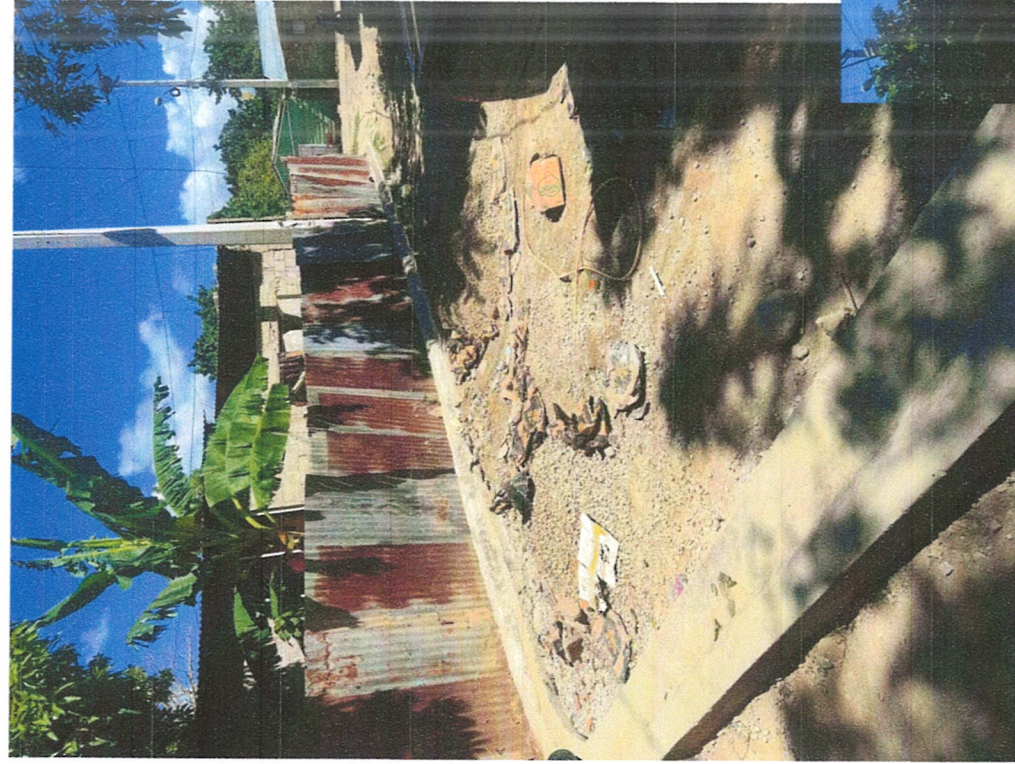


VILLA ROSA II (ENS.ALMA ROSA I)







VILLA ROSA II (ENS.ALMA ROSA I)



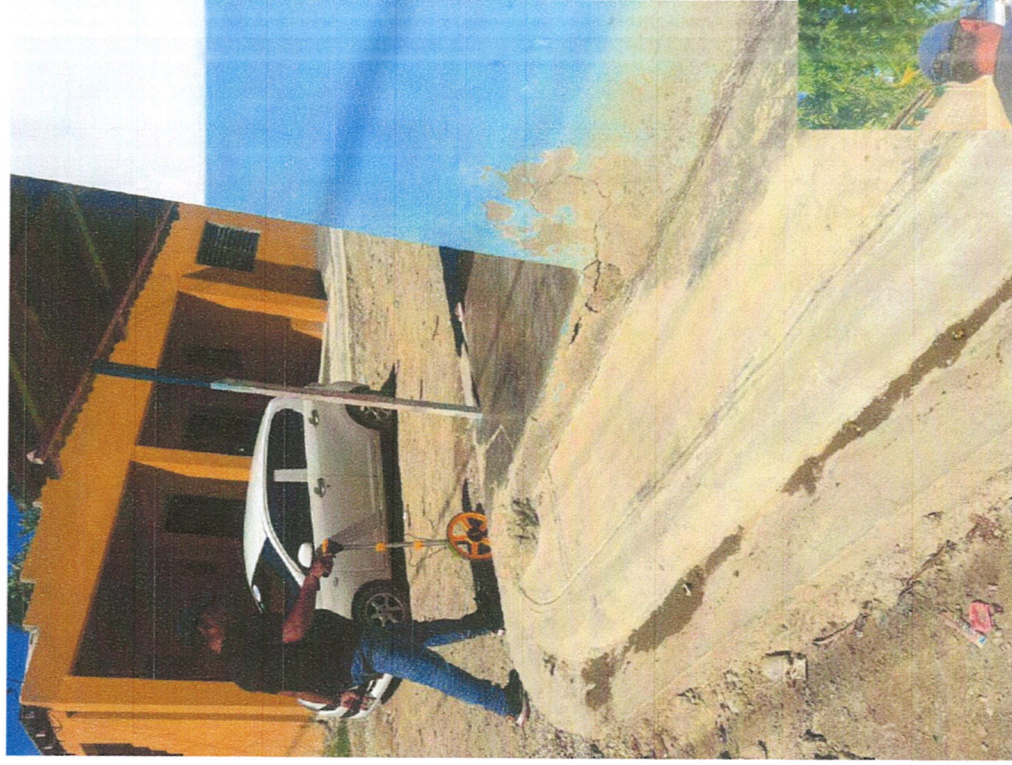


VILLA ROSA II (ENS.ALMA ROSA I)

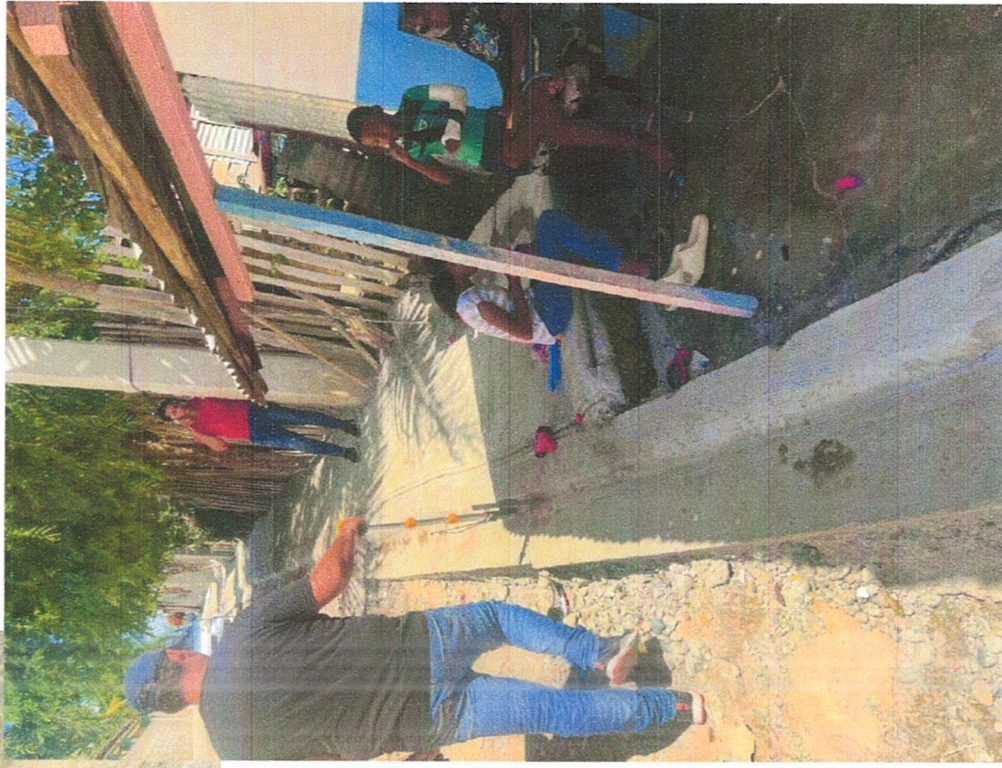

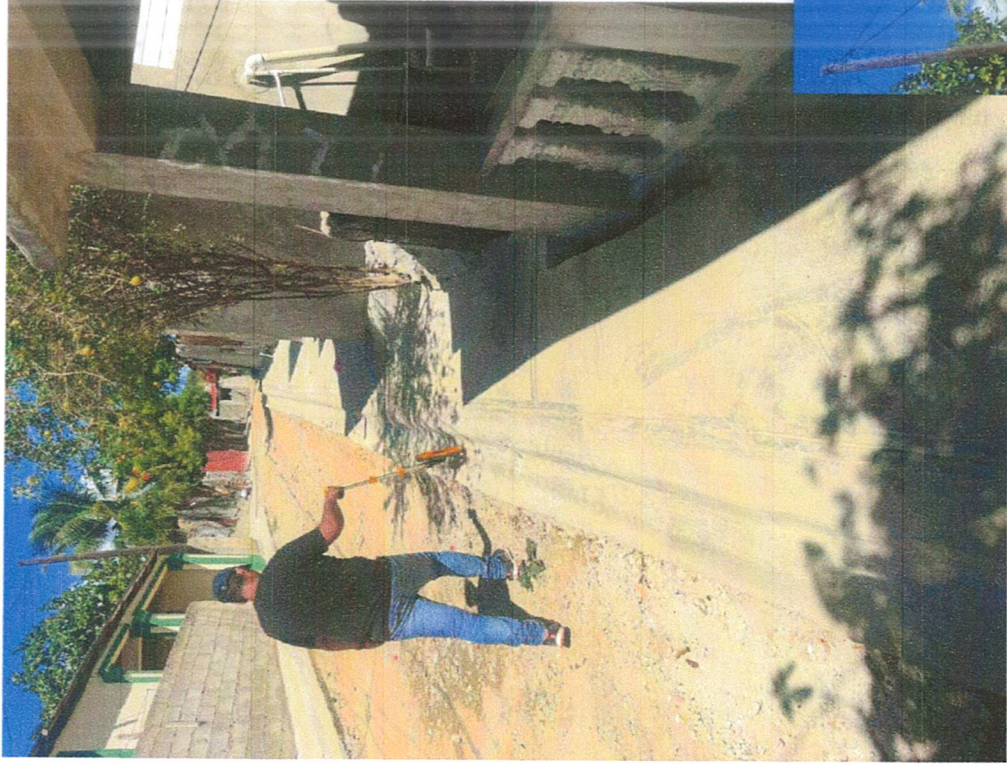


VILLA ROSA II (ENS.ALMA ROSA I)



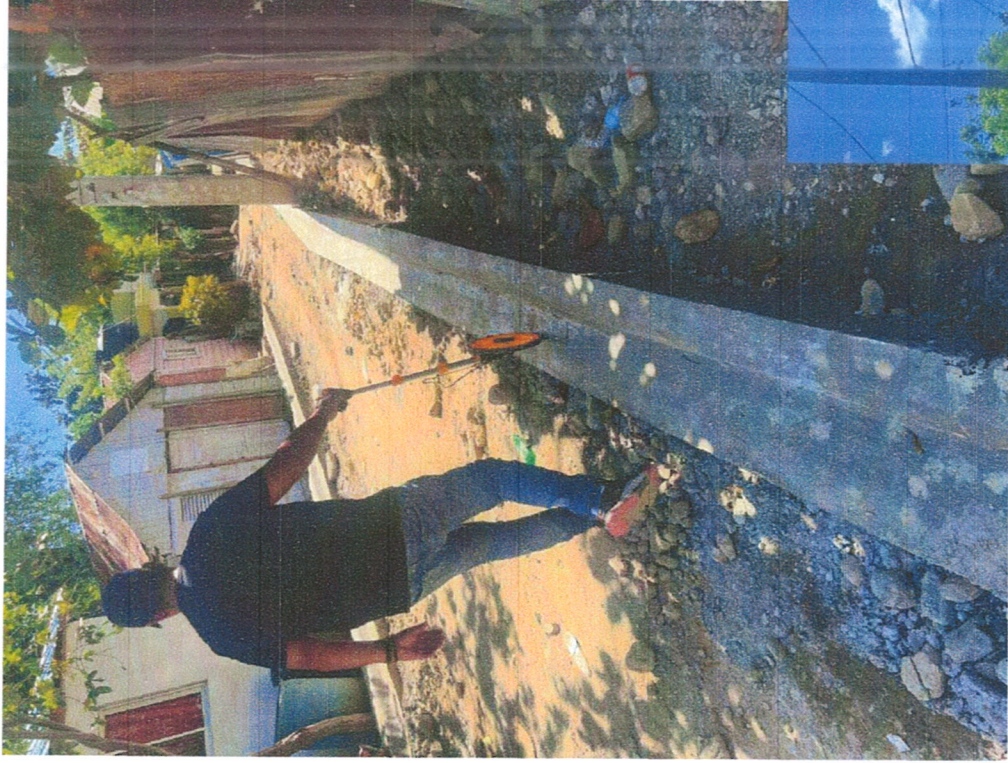



VILLA ROSA II (ENS. ALMA ROSA I)



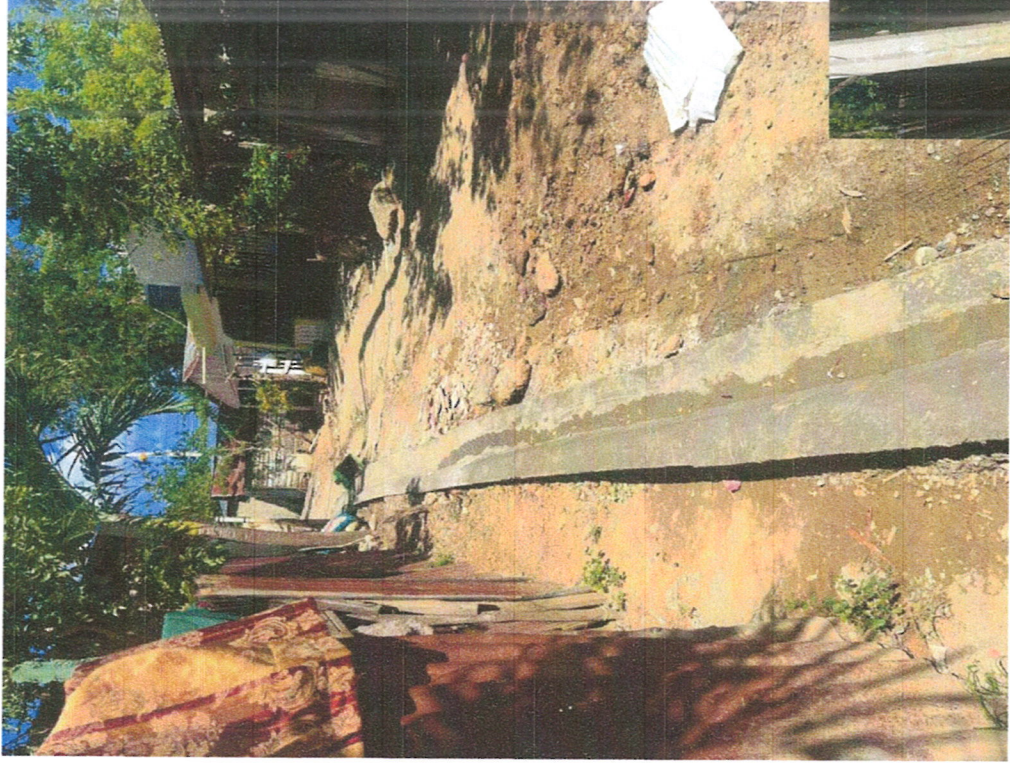

VILLA ROSA II (ENS. ALMA ROSA I)

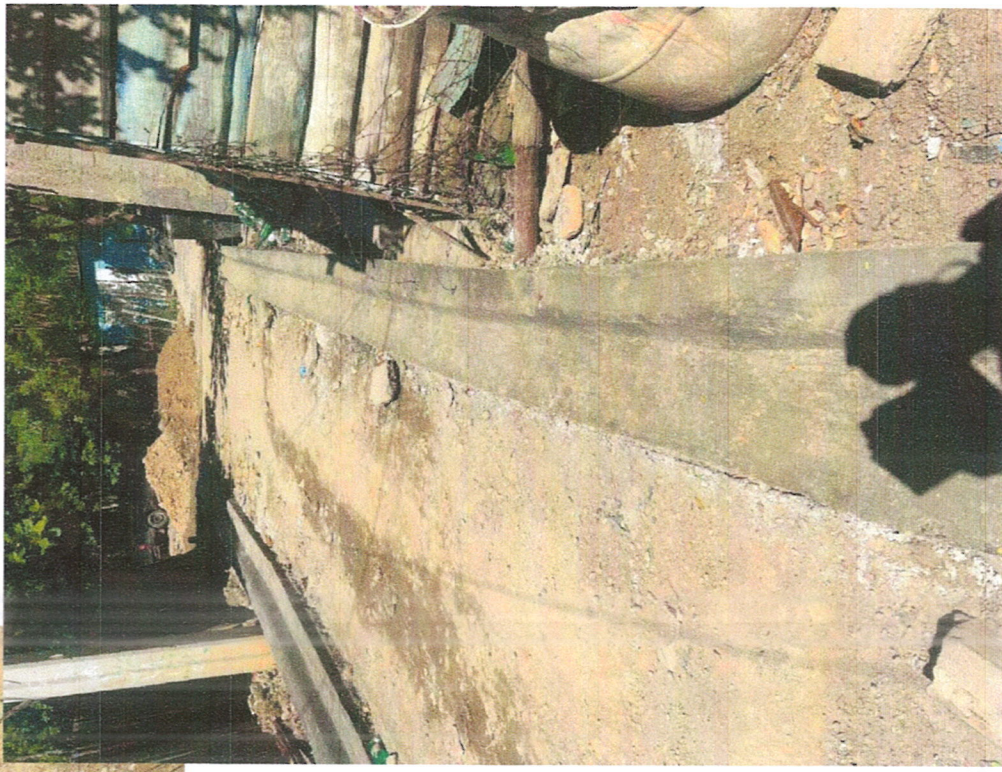

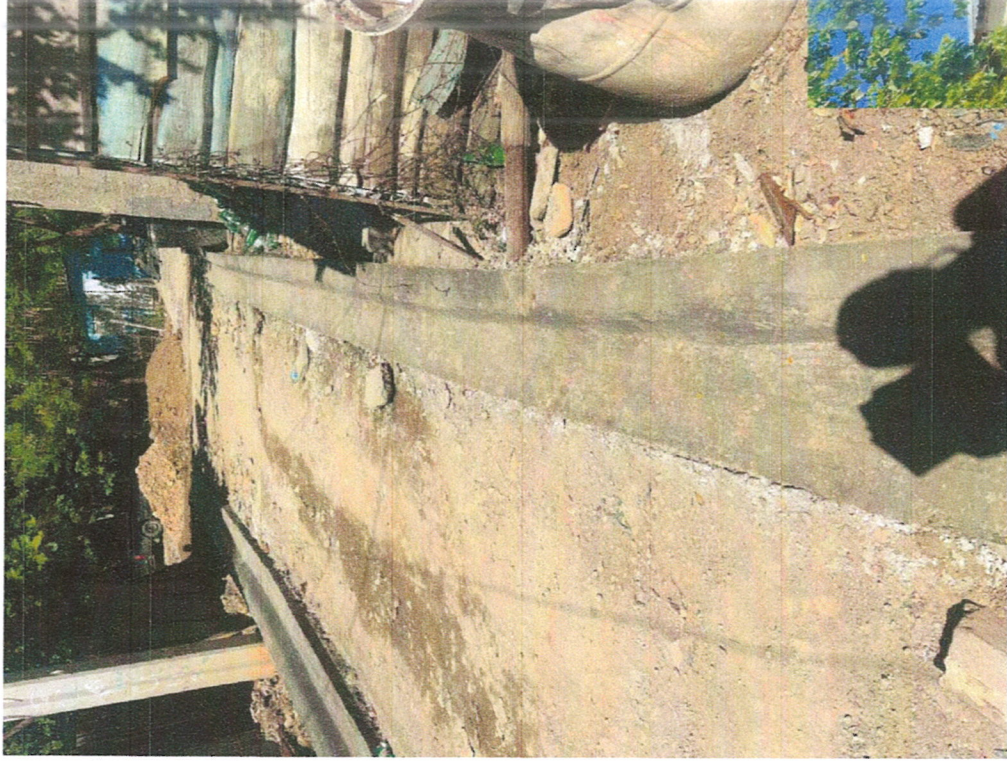

VILLA ROSA II (ENS.ALMA ROSA I)






VILLA ROSA II (ENS.ALMA ROSA I)








LAS ALMENDRAS, SANTIAGO OESTE

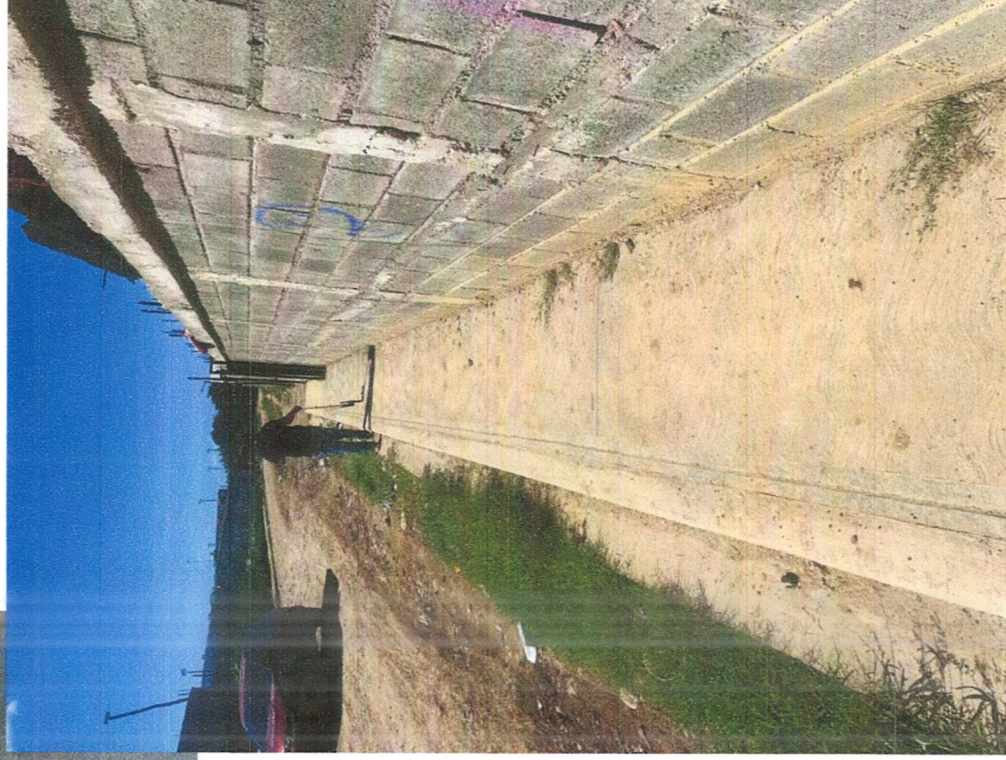


LAS ALMENDRAS, SANTIAGO OESTE

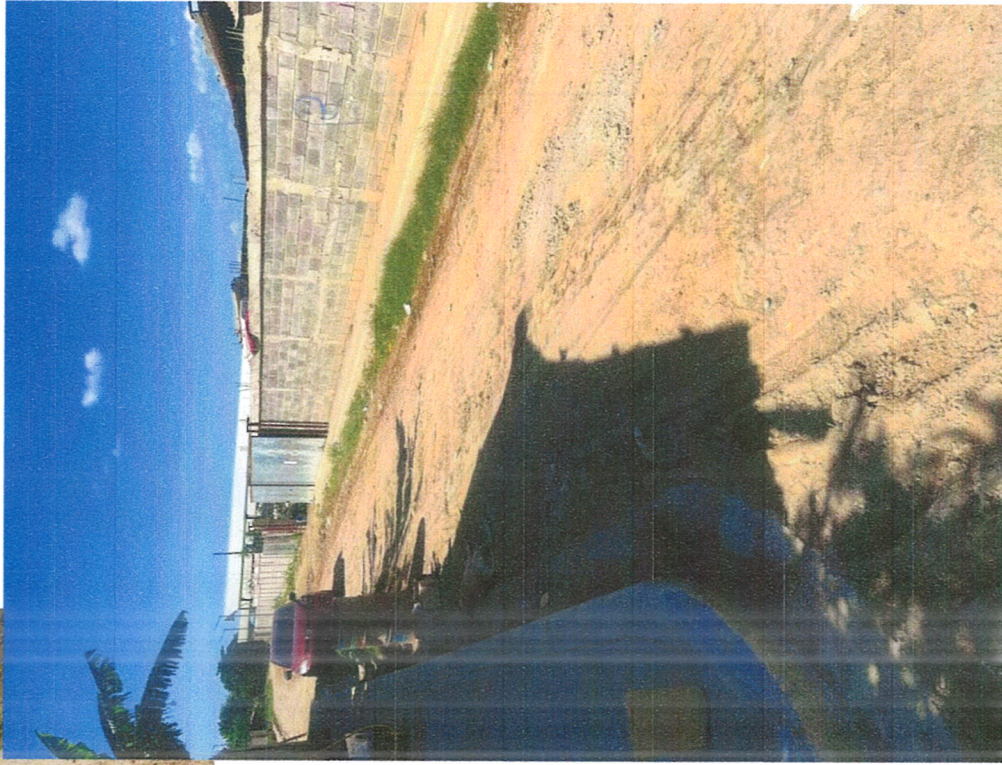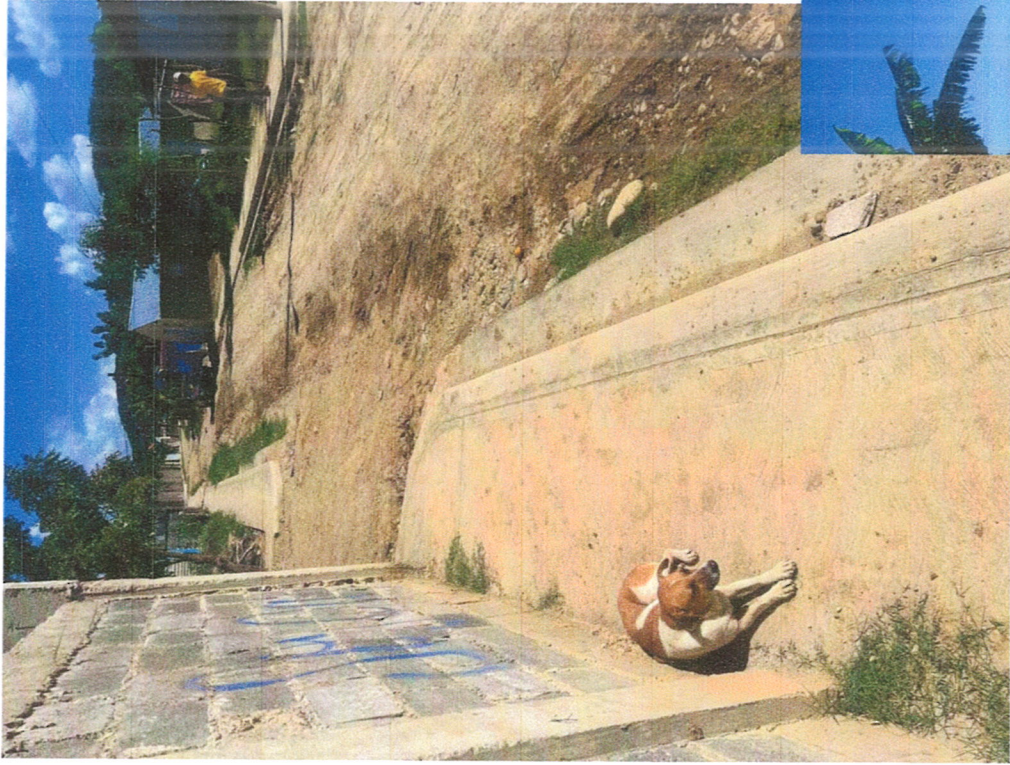

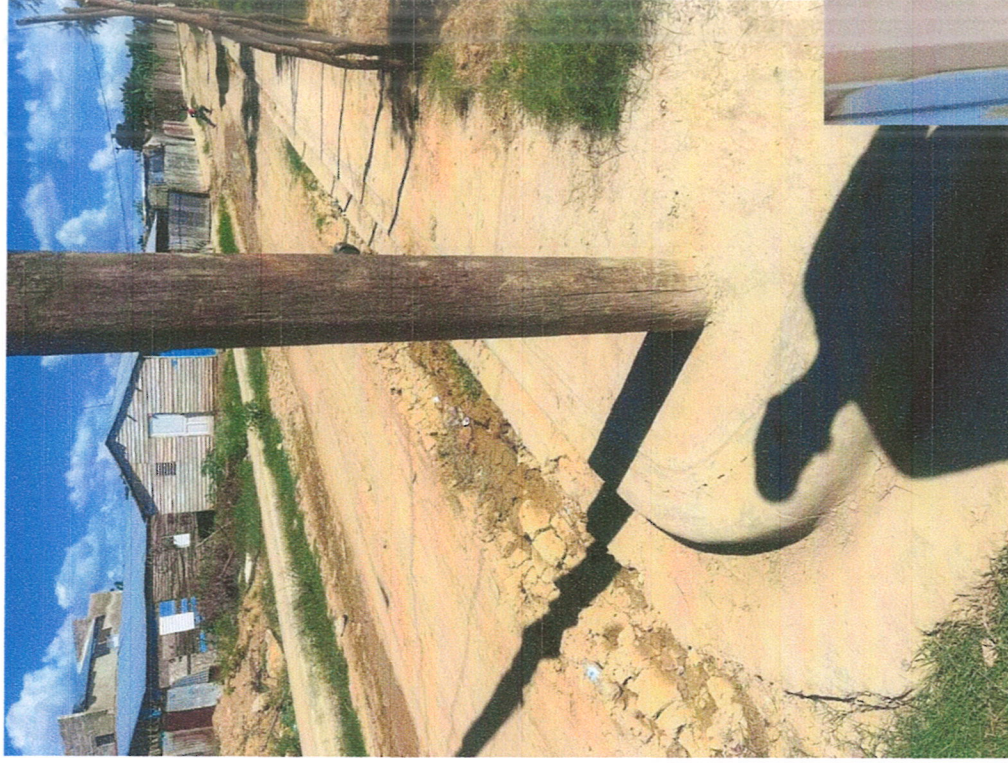

LAS ALMENDRAS, SANTIAGO OESTE

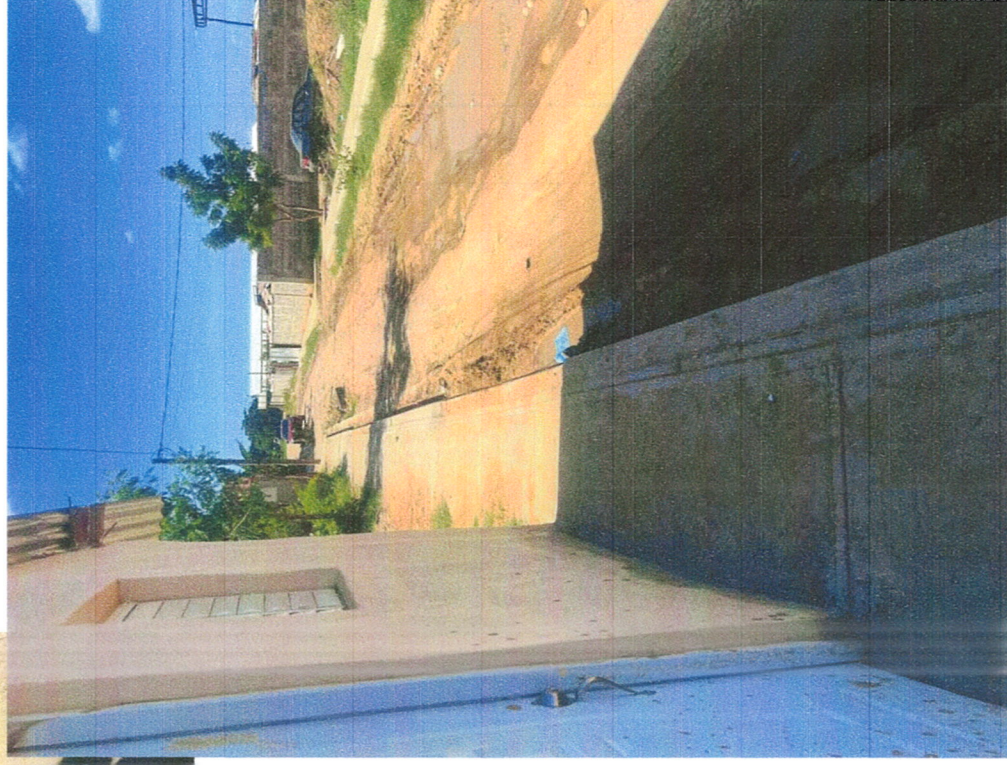





LAS ALMENDRAS, SANTIAGO OESTE





LAS ALMENDRAS, SANTIAGO OESTE

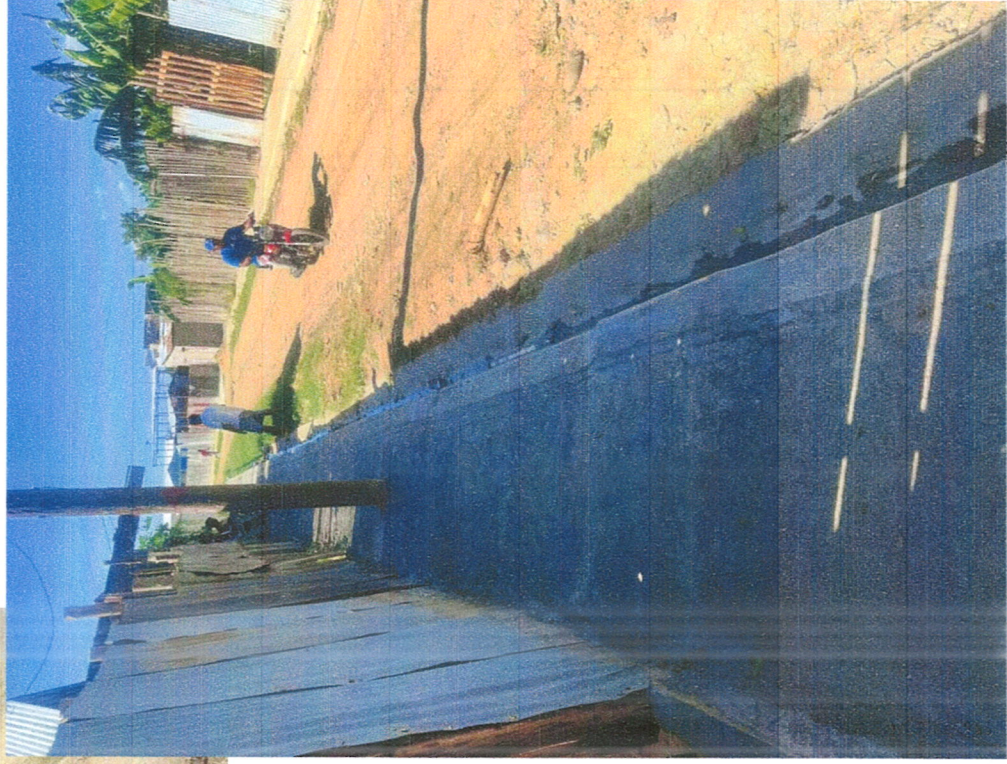

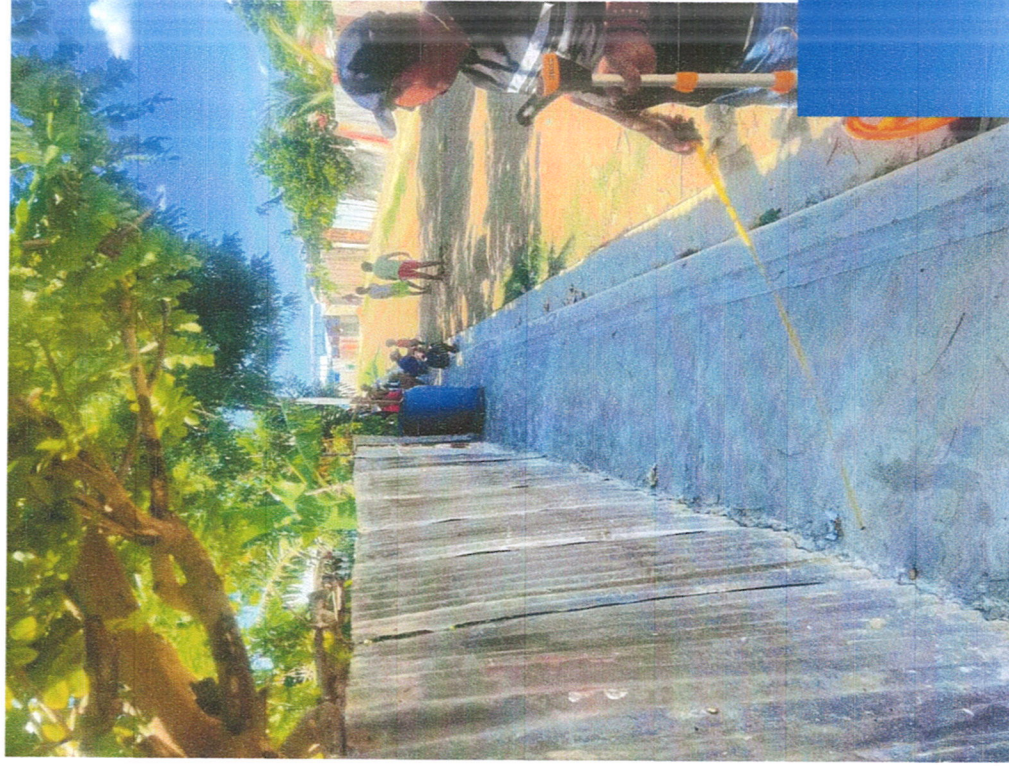


LAS ALMENDRAS, SANTIAGO OESTE





LAS ALMENDRAS, SANTIAGO OESTE

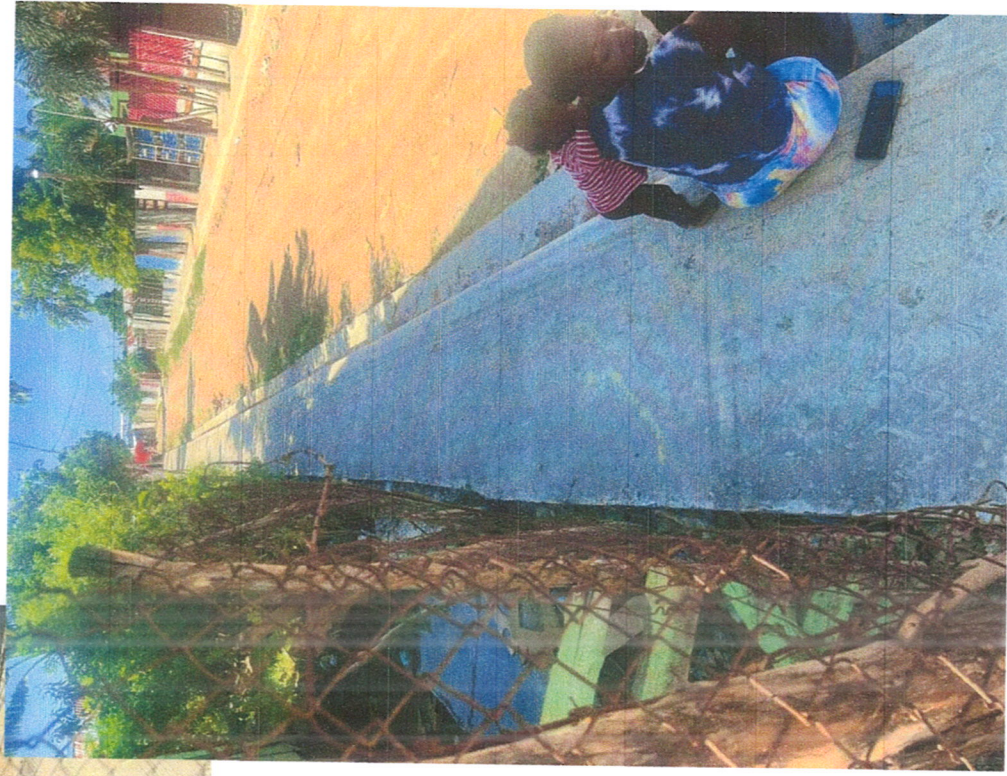


LAS ALMENDRAS, SANTIAGO OESTE






LAS ALMENDRAS, SANTIAGO OESTE

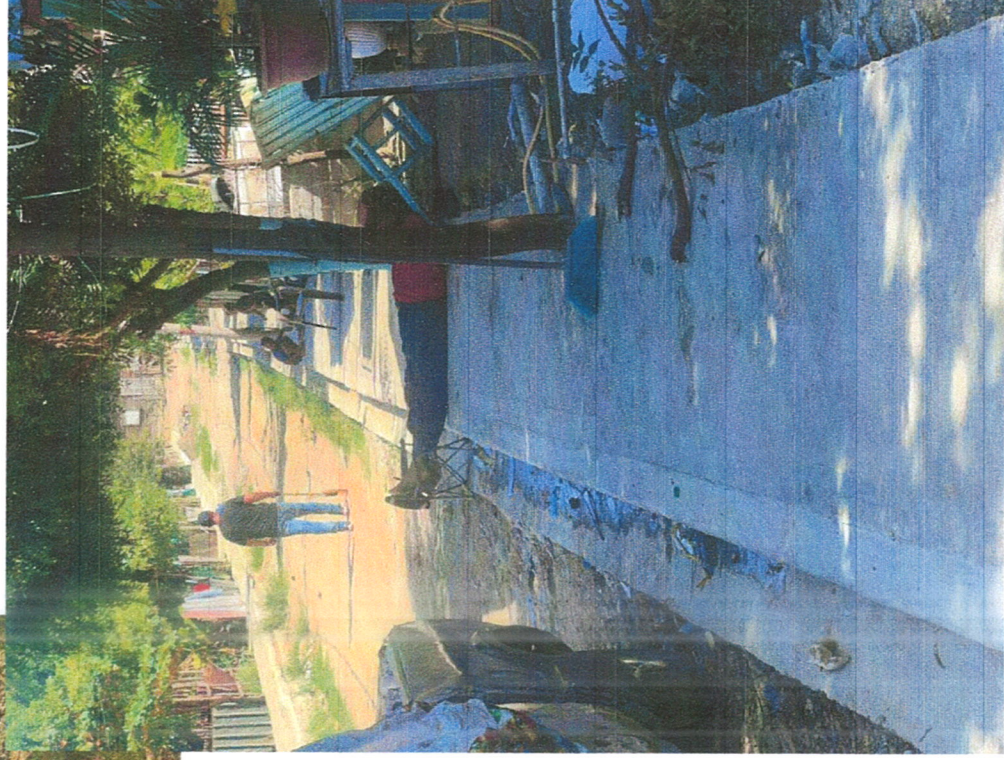





LAS ALMENDRAS, SANTIAGO OESTE

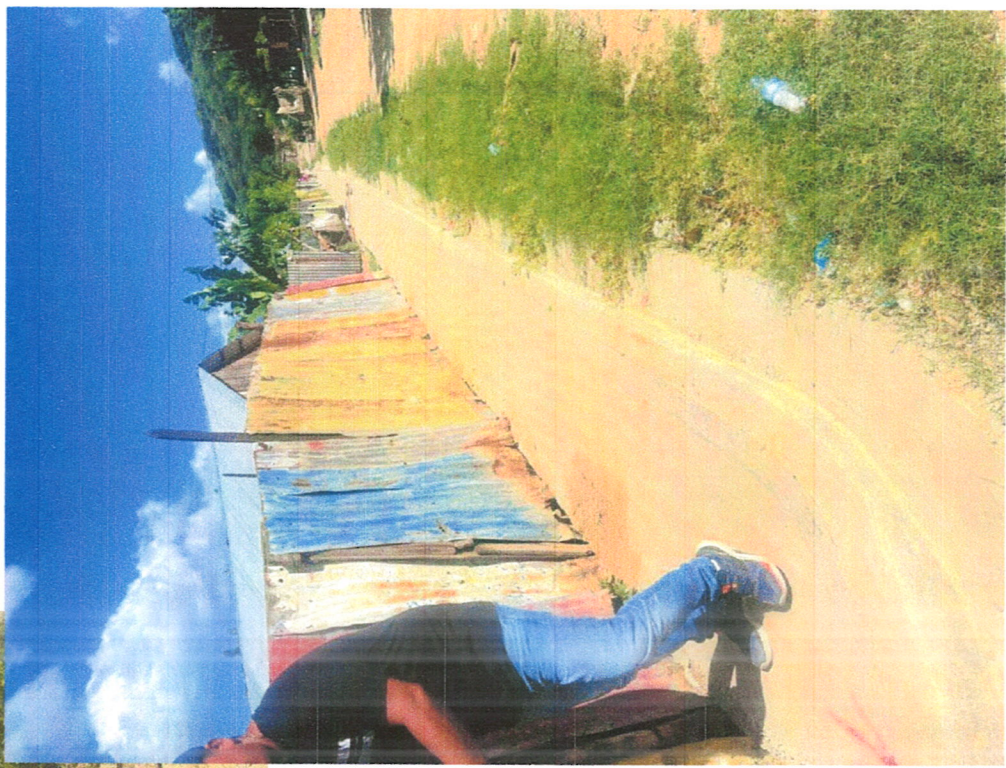



LAS ALMENDRAS, SANTIAGO OESTE

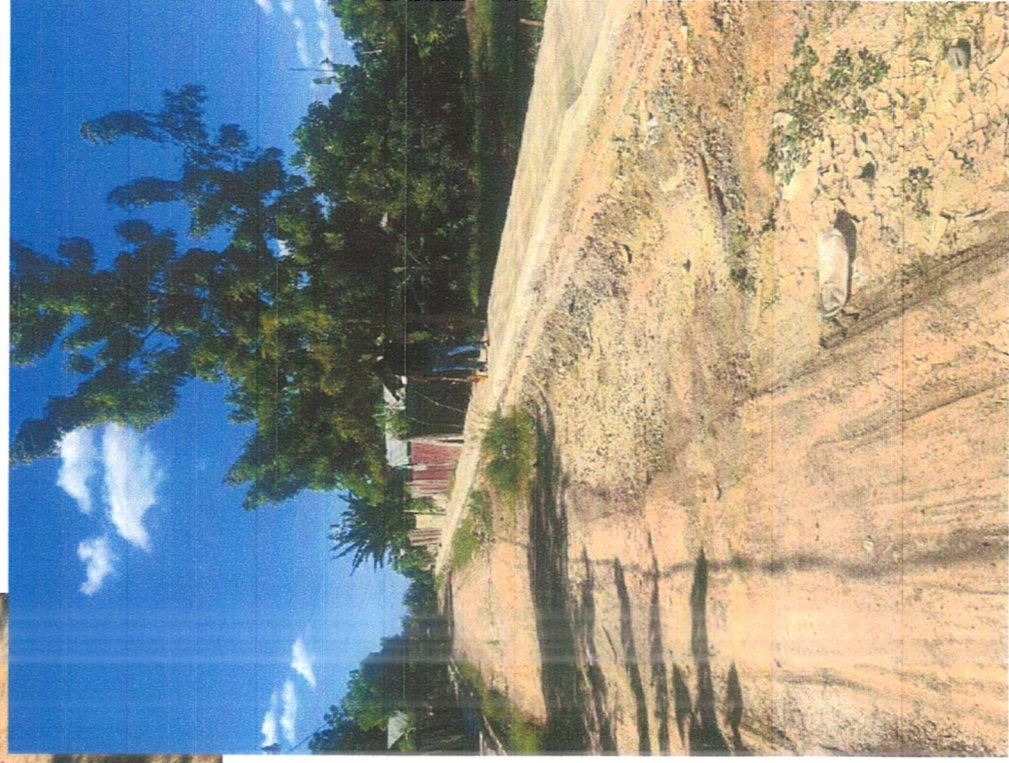


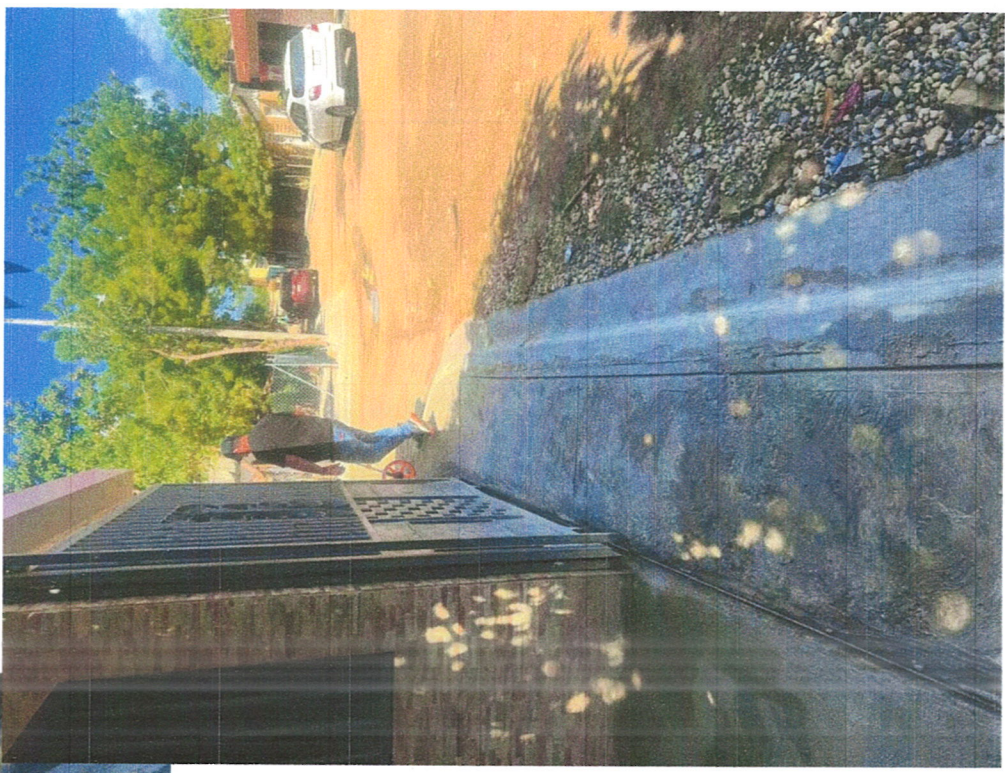

5

EL PROGRESO, SANTIAGO OESTE



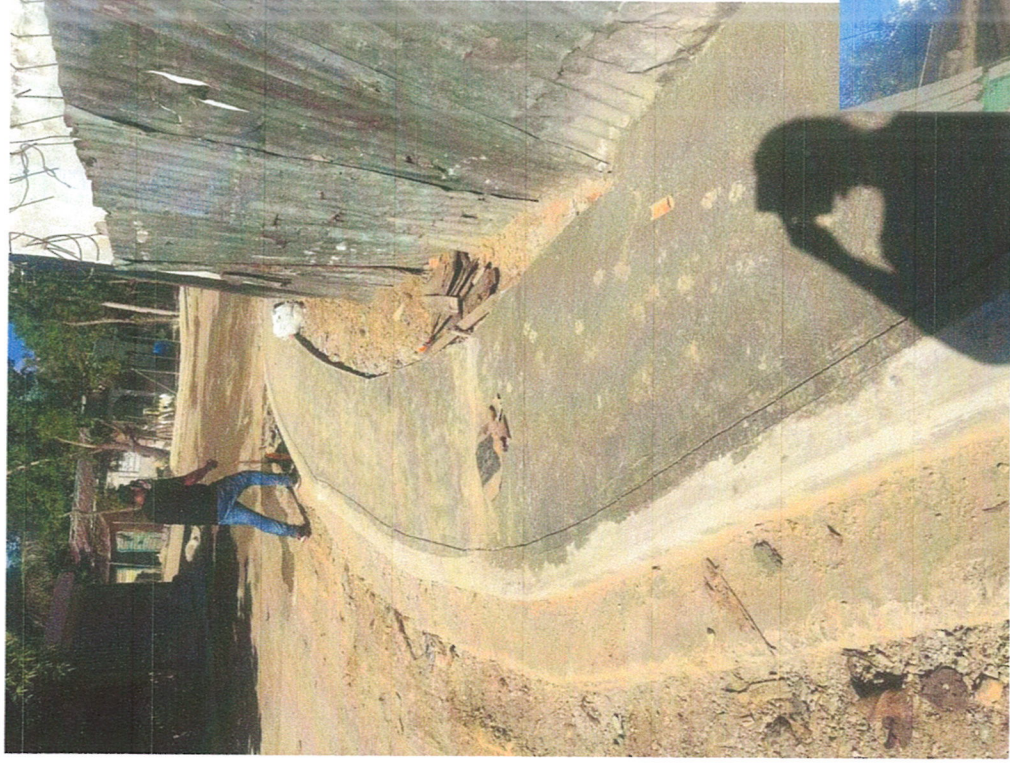


EL PROGRESO, SANTIAGO OESTE




CONTENES EN CONSTRUCCION



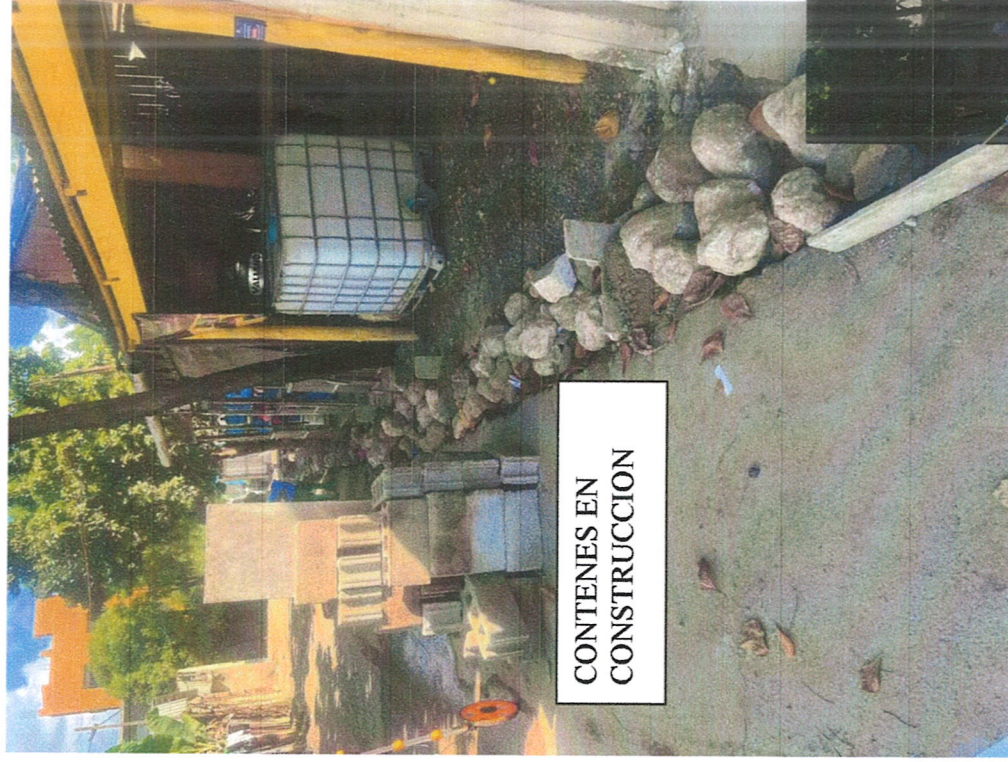


CONTENES EN
CONSTRUCCION

EL PROGRESO, SANTIAGO OESTE

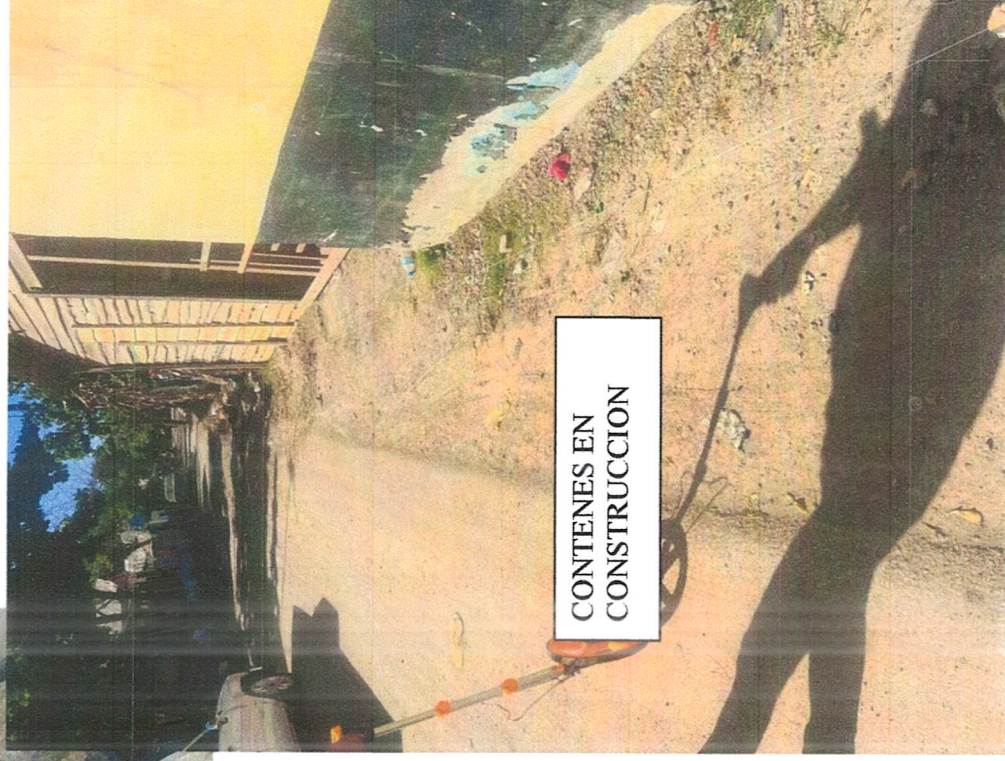

CONTENES EN
CONSTRUCCION




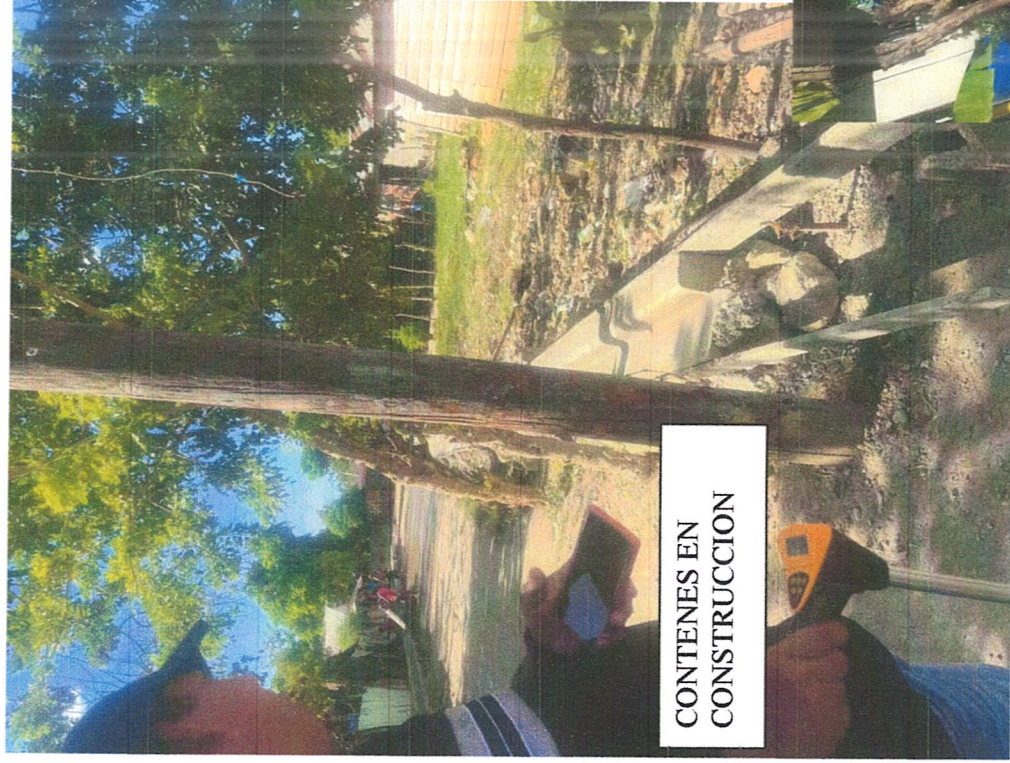


CONTENES EN
CONSTRUCCION


EL PROGRESO, SANTIAGO OESTE



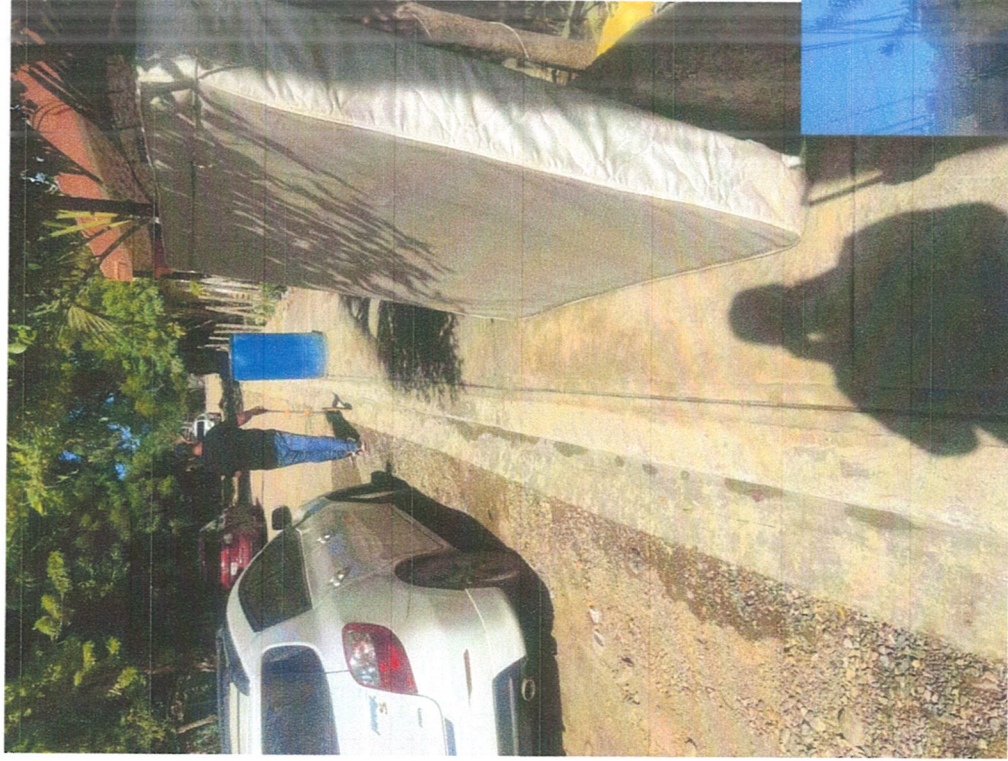

EL PROGRESO, SANTIAGO OESTE

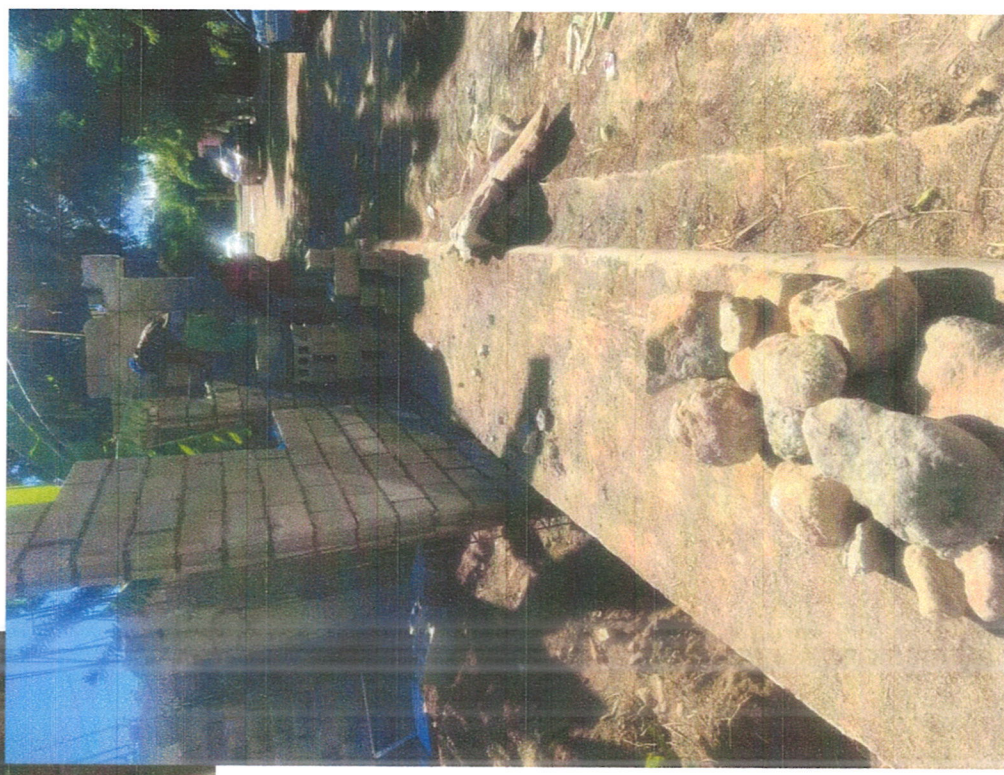

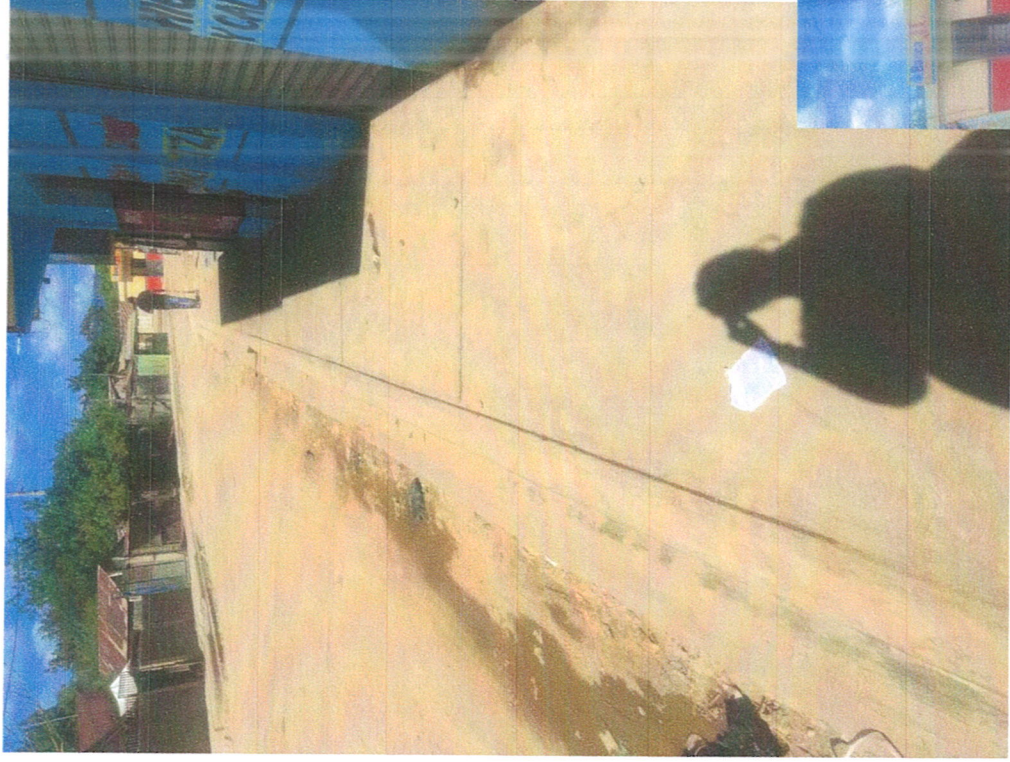


EL PROGRESO, SANTIAGO OESTE







EL PROGRESO, SANTIAGO OESTE

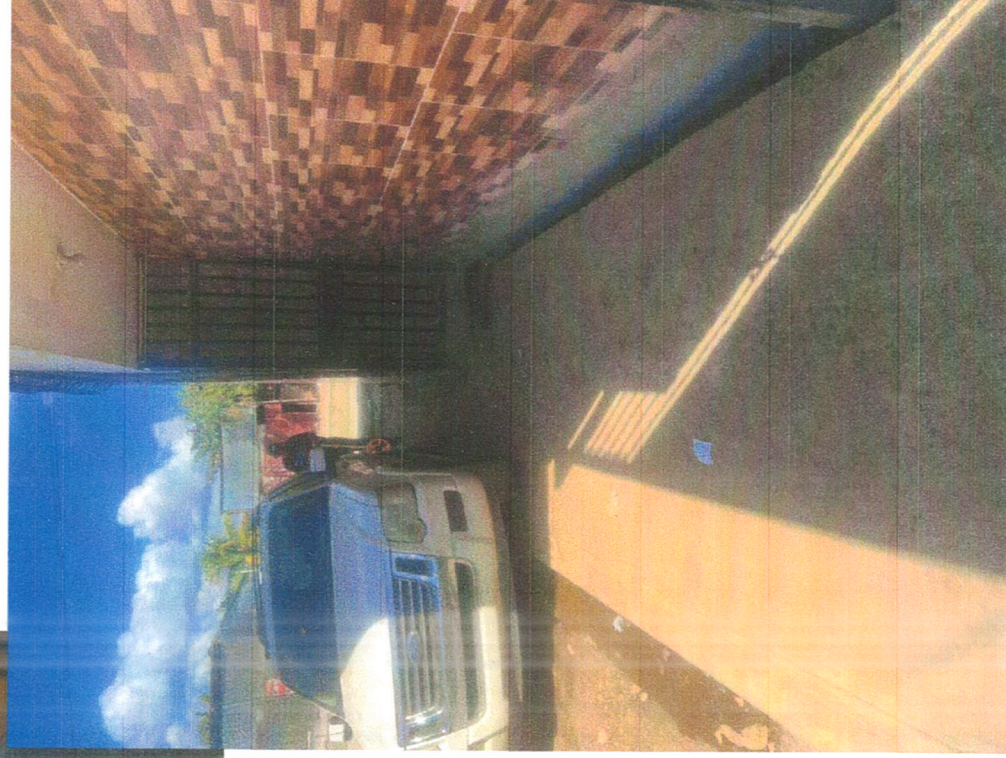




EL PROGRESO, SANTIAGO OESTE

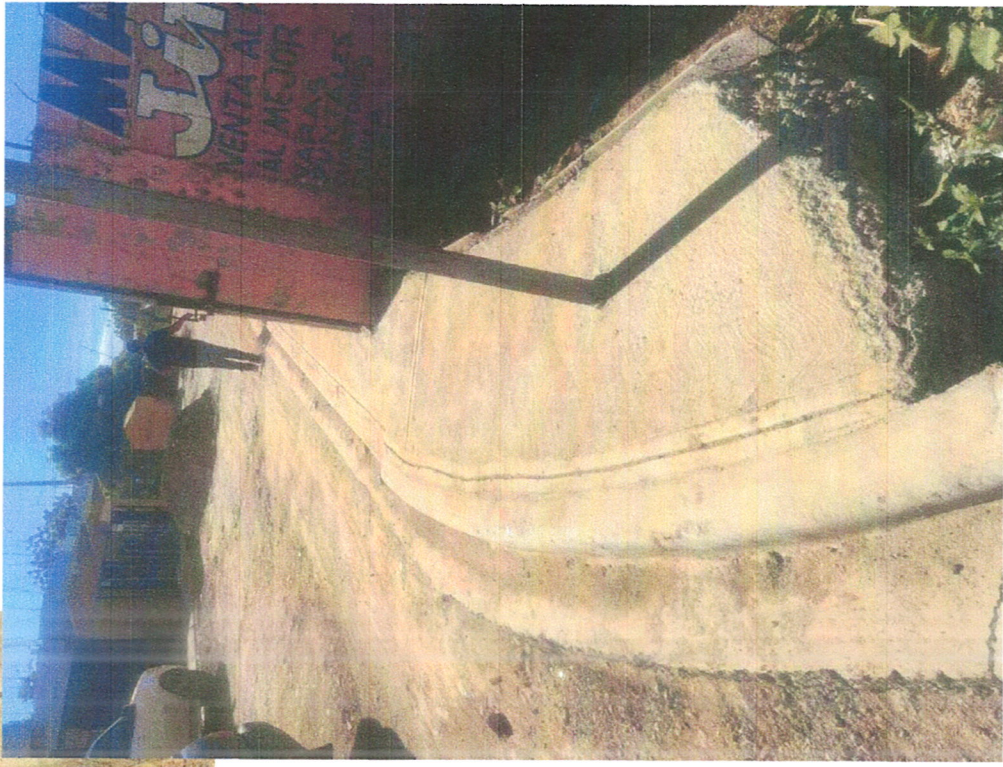

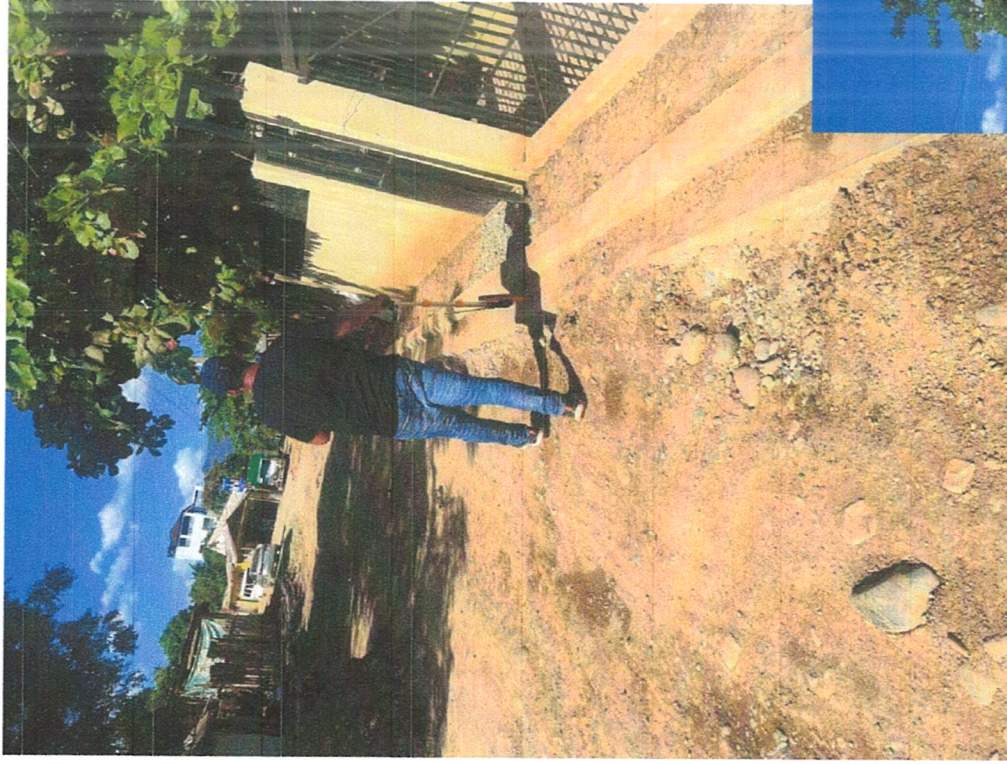

EL PROGRESO, SANTIAGO OESTE

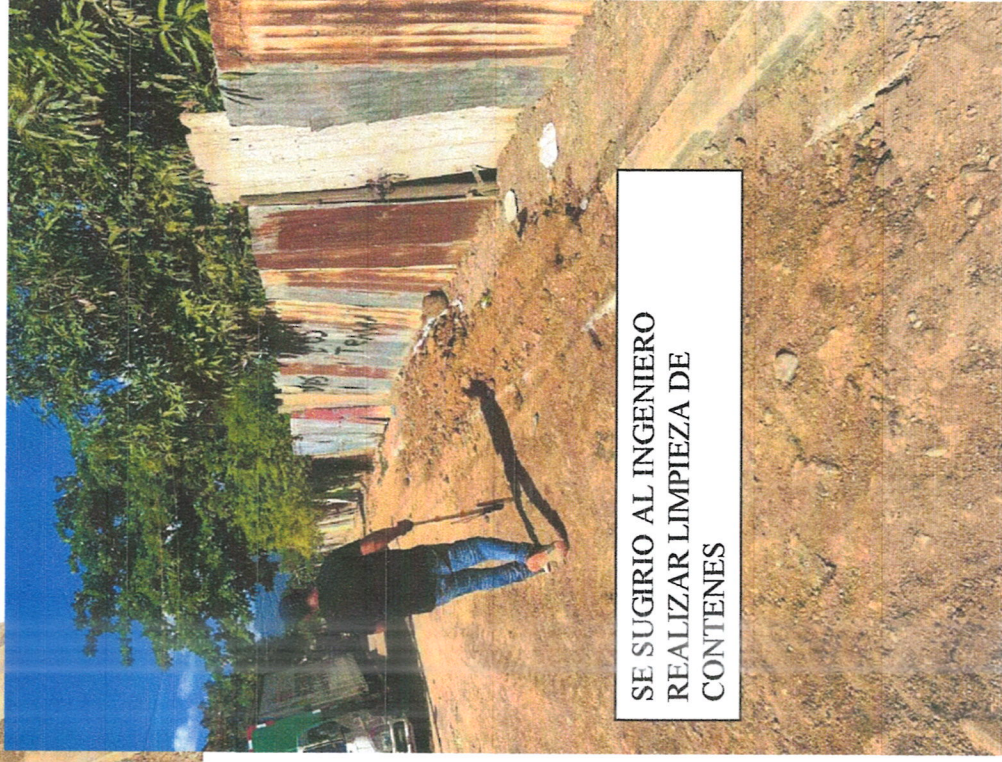


SE SUGIRIO AL INGENIERO
REALIZAR LIMPIEZA DE
CONTENES






EL PROGRESO, SANTIAGO OESTE

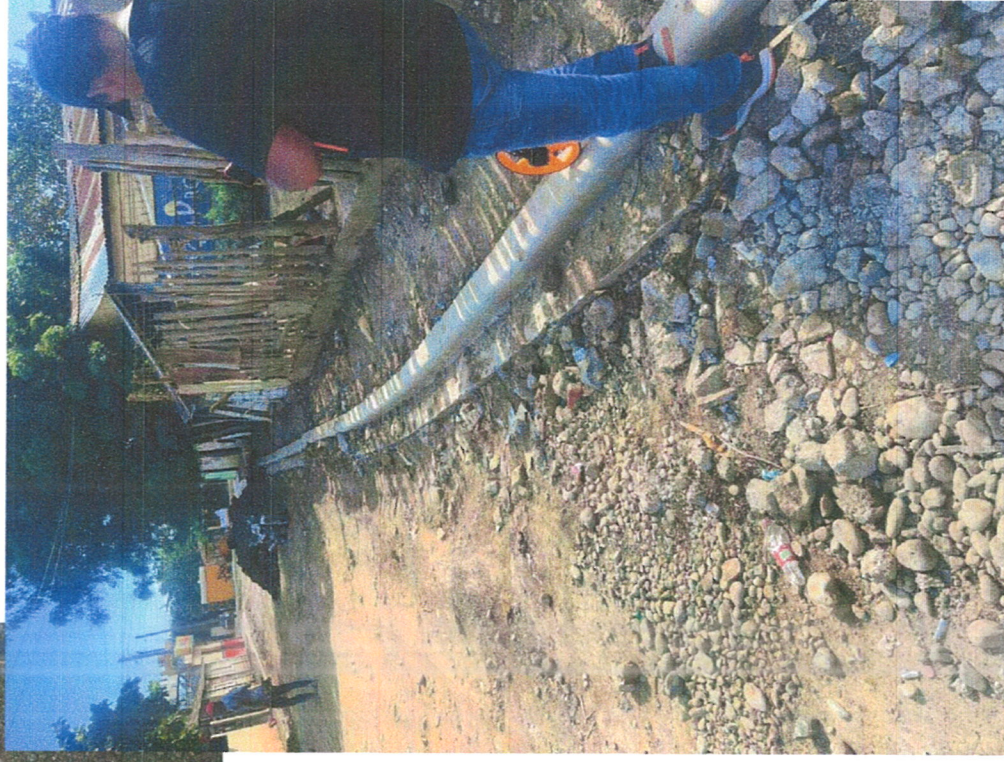



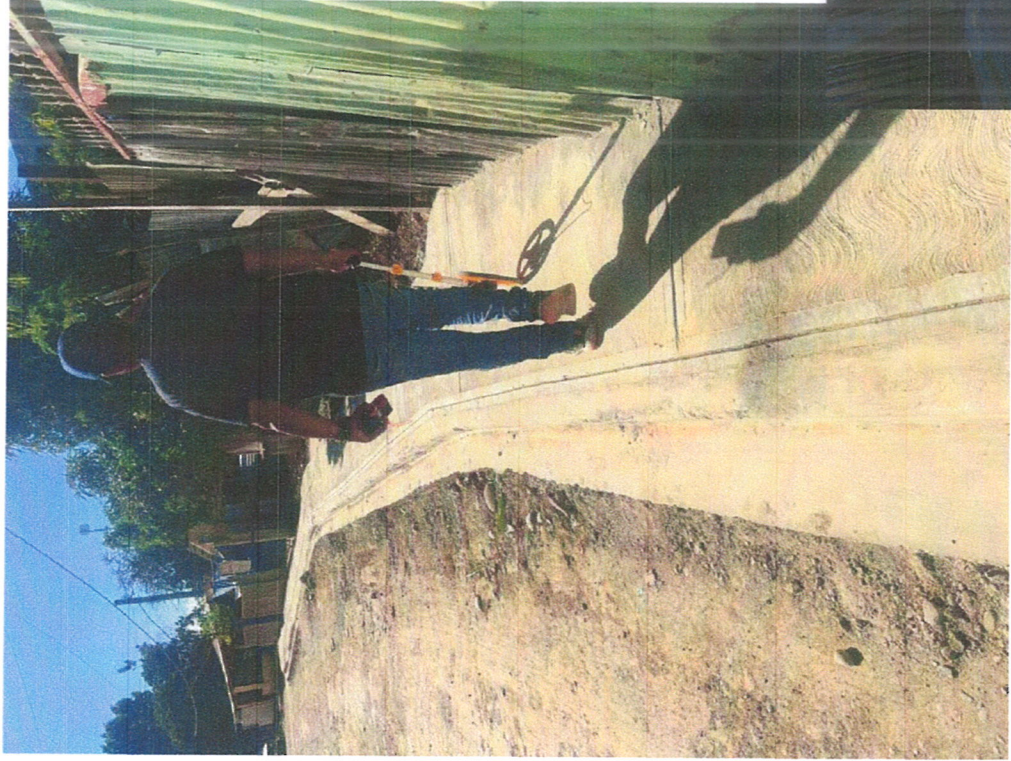

EL PROGRESO, SANTIAGO OESTE



EL PROGRESO, SANTIAGO OESTE

