



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 20 de mayo de 2022


TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Ramírez
2. Ing. Staylin Mendoza

CODIGO: 250802
REGIÓN: CIBAO NORTE
PROVINCIA: SANTIAGO
MUNICIPIO: PUNAL
DISTRITO MUNICIPAL: GUAYABAL

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Calle los Quiles				88.80	1		88.8
TRAMO B	Calle los Quiles				79.10	2		158.2
TRAMO C	Calle los Quiles				45.60	2		91.2
TRAMO D	Calle los Quiles				53.5	2		107
TRAMO E	Calle los Quiles				4.9	1		4.9
Total							0	450.1

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,854,772.26
Monto desembolsado RD\$ 1,927,386.13 50%
Avance de obra 29.53%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE
PROVINCIA: SANTIAGO
MUNICIPIO: PUÑAL
DISTRITO MUNICIPAL: GUAYABAL

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 20 de mayo de 2022



REPORTE

A la fecha de 20/05/2022 se ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 450.10 metros lineales de contén, lo que corresponde al 29.53% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Este distrito esta ejecutando por contrato.
2. Al momento de la inspección estuvo presente la Sra. Fior Denis Tavares (DIRECTORA) y otras autoridades del ayuntamiento acompañándola en su recorrido.
3. Esta construyendo canaleta, por tanto se le aclararon las informaciones de lugar.
4. Informaron que solo van construir contenes, quedaron de enviar el presupuesto usado.

IMÁGENES

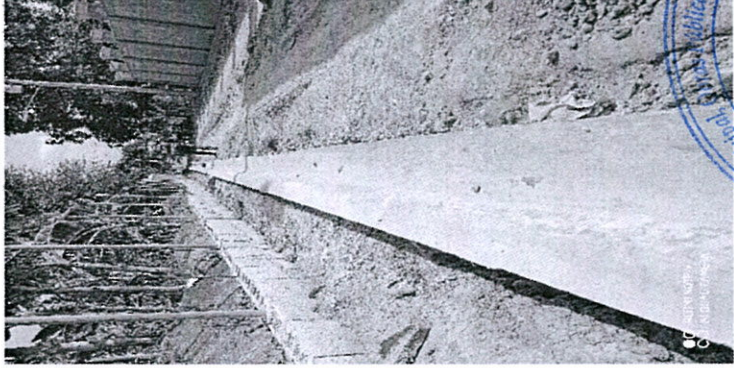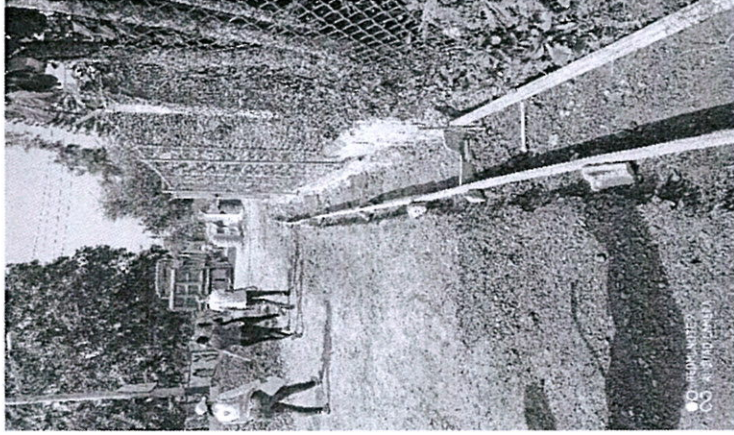

Suministra los datos de este reporte,


ING. AVA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico


LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —
ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico
