



REPÚBLICA DOMINICANA



## *Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua*

www.alcaldia villajaragua.gob.do

E-mails: ayuntamientojaragua2020@gmail.com

RNC 4-17-00776-2

### **ACTA 001-2023**

#### **COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2023**

---

En el municipio de Villa Jaragua, provincia Bahoruco a los 16 días del mes de enero del año 2023 siendo las 6:00 p.m. previa convocatoria a los miembros del Comité de Seguimiento y Control y con la asistencia del alcalde Iván Arístides Medina Trinidad, M. A. y el encargado de Planificación y Desarrollo Lic. Enmanuel Salvador Pérez. Esta reunión fue la continuación de la convocada del día 13, la cual se llevo a cabo sin la presencia del alcalde.

Como único punto de agenda fue establecer el orden de ejecución de las obras escogidas en las asambleas comunitarias y ratificadas en las asambleas de Bloque y Cabildo Abierto a ser ejecutadas en PPM 2023.

Previo elección hizo uso de las palabras el alcalde, el cual explico la reducción de los montos presupuestados asignados inicialmente, debido a la nueva redistribución de fondos para el presente año, dicha disminución fue de un 10% a cada una de las obras a ser ejecutadas. Se planteo alternativas para evitar esta disminución, señalando afectar alguna obra administrativa, lo cual no era posible por los compromisos inclusive de avance de recursos utilizados a créditos en las mismas.

En cuanto a la obra de barrio Brisa-Tunal Arriba se requiere de estudios (el costo de estos se le cargará al mismo) como la donación del terreno donde se hará y que por el monto (la de mayor presupuesto) fue colocada en la posición 8, con la obra de La Madre se hace necesario la construcción de un puente (que los comunitarios se comprometieron hacer en el 2022 con recursos propios lo cual no fue posible) se hará con fondos del PPM asignado a su obra.


La ejecución que las mismas iniciaran en el mes de marzo, comenzando con la de Villa Progreso por ser una continuación del 2022 y ser la ultima ejecutada, se señalo que hay obras que se pueden ejecutar simultáneamente, no obstante al orden establecido se pueden dar situaciones que varíen este orden. Con la de Las Cañitas aun no hay terrero destinado para levantar el centro comunal, en caso de no ser posible se destinará el presupuesto a otra necesidad que identifique la comunidad.

El orden de ejecución establecido fue la siguiente:

No.	Obra	Sector/Sección
1	Continuación Construcción Verja Perimetral y Embellecimiento	Villa Progreso
2	Electrificación e Iluminación (Segunda Fase)	Pie de la Loma
3	Canalización de Arroyo	El Maniel
4	Continuación Construcción Contenes calle Fe y Alegría	La Madre
5	Continuación Construcción Contenes calle Restauración Parte Alta	El Otro Lado
6	Construcción de Contenes Calles	Palenque
7	Continuación Construcción Contenes calle Mercedes	Alto Velo
8	Perforación de Pozo e Instalación de Bomba	Tunal Arriba/Barrio Brisa
9	Mantenimiento de Caminos y Agua Potable	El Barro
10	Mantenimiento de Caminos	Mata de Naranja, Guayubín, Hoyo de Julián
11	Construcción de Centro de Comunal	Las Cañitas

No habiendo más nada que tratar se dio por concluida reunión a las 7:30 p.m.


**Firman por el Comité de Seguimiento:**

Nombre	Cargo	Firma
Luis Medina Trinidad	Presidente	
Miguel Peña Trinidad	Tesorero	
Nayelis Santana Santana	Secretaria	Ausente
Carolina Medina	Vocal	
Diorvin Peña	Vocal	
Orfelina Vallejo	Vocal	
Matías Apóstol Díaz Nova	Vocal	Ausente

**Firman por el Ayuntamiento:**

Nombre	Cargo	Firma y Sello
Iván Arístides Medina Trinidad, M. A.	Alcalde Municipal	
Lic. Emmanuel Salvador Pérez Méndez	Encargado de Planificación y Desarrollo	

**Fotos**  
**Reunión Comité de Seguimiento**

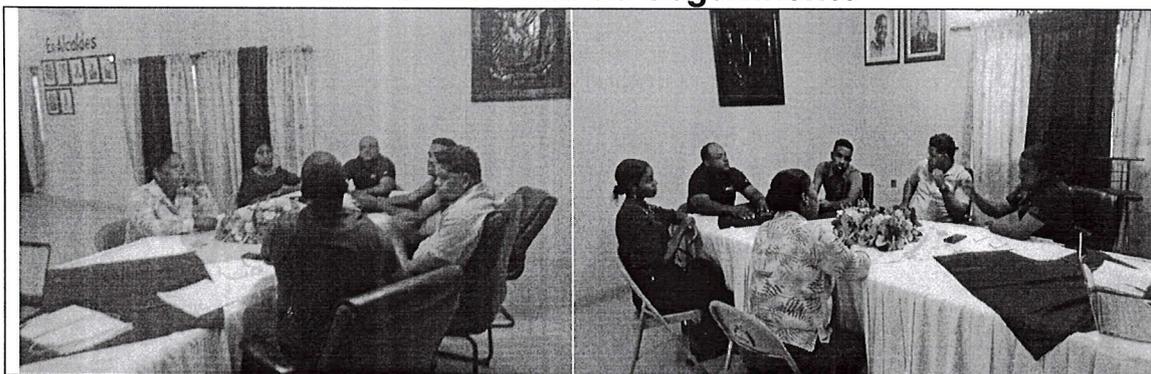

**Fecha:** *Lunes, 16 de enero de 2023*  
**Hora:** *5:30 p.m.*  
**Lugar:** *Salón de Actos y Sesiones.*
