



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

Santo Domingo, D.N.
20 de junio de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución del D.M. Chirino**

En la visita técnica realizada el 17 de marzo del 2023 se validó la ejecución de 1,004.85 metros cuadrados de aceras y 1,053.32 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del "Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales".

La supervisión externa ha validado la ejecución de 154.60 metros lineales de contenes con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 1,004.85 metros cuadrados de acera y 1,207.92 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz

Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 290103

REGIÓN: HIGUAMO

PROVINCIA: MONTE PLATA

MUNICIPIO: MONTE PLATA

DISTRITO MUNICIPAL: CHIRINO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 17/3/2023

1. Arq. Zunilda Del Rosario

TÉCNICOS: 2. Ing. Richard Cabrera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECCION SAN FRANCISCO	614.50	1.00	1.00	642.62	1.00	614.50	642.62
TRAMO B	SECCION SAN FRANCISCO	390.36	1.00	1.00	410.70	1.00	390.36	410.70
Total							1,004.86	1,053.32

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,468,891.52

Monto desembolsado RD\$ 3,468,891.52 (100%)

Avance de obra 115.64%



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: HIGUAMO
PROVINCIA: MONTE PLATA
MUNICIPIO: MONTE PLATA
DISTRITO MUNICIPAL: CHIRINO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 17/3/2023


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,004.86 metros cuadrados de aceras y 1,053.32 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Se observó una terminación buena en las aceras y contenes de acuerdo las especificaciones técnica.
2. Durante la inspección también encontramos la construcción de canaleta para poder causar el agua pluvial.

IMÁGENES

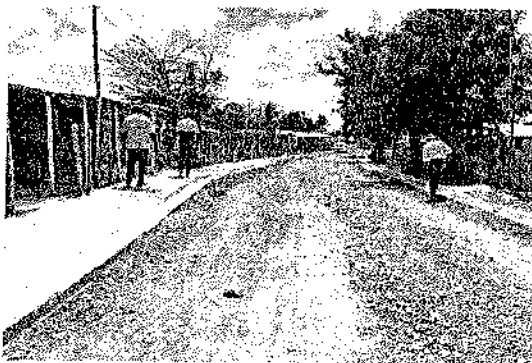



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA



Suministra los datos de este reporte,

Zunilda del Rosario C.
ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO
Técnico

RC
ING. RICHARD CABRERA
Técnico



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

REPORTES DE AVANCE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA:

MUNICIPIO:

DISTRITO MUNICIPAL:

BARRIO Y/O SECTOR:

Monte Plata
Chiriquí
San Francisco

--

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local

☒

b. Contratista

☐

Razón Social

RNC ó Cédula:

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

a. Reparación de aceras y contenes: ☒

b. Incluye demoliciones de tramos: ☒

c. Incluye badenes: ☐

d. Otros:

--

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m ²)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M	Carretera. Division MP-18	18.7137749	-69.7911942	18.7148241	-69.7919168	154.60	1	154.60	154.60	
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Gerardo E. Henríquez P.

CÉDULA:

001-1022649-5


CODIA:


21125

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

07/06/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,





Firma y sello
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal

