



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 250108

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: SANTIAGO

MUNICIPIO: SANTIAGO

DISTRITO MUNICIPAL: SANTIAGO OESTE

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 7 de septiembre de 2022

1. Ing. Danilo Mercado

TÉCNICOS: 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Antigua Autopista Duarte	382.00	1.00	2	382.00	2	764	764
TRAMO B	Antigua Autopista Duarte				156.20	1		156.2
TRAMO C	Principal Llanos del Ingenio a Valle Lindo	299.00	0.92	2	299.00	2	550.16	598
TRAMO D	Calle 2 de Valle Lindo	34.30	1.00	2	120.15	2	68.6	240.3
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							1382.76	1758.5

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 11,992,539.45
Monto desembolsado RD\$ 5,996,269.73 (50%)
Avance de obra 51.34%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 7 de septiembre de 2022

PROVINCIA: SANTIAGO

MUNICIPIO: SANTIAGO

DISTRITO MUNICIPAL: SANTIAGO OESTE


REPORTE


A la fecha de 07/09/yyyy se ha ejecutado 1382,7600 metros cuadrados de aceras y 1758,500 metros lineales de contén, lo que corresponde al 0.51% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS



1. La construcción cumple con los estándares recomendados, teniendo una óptima calidad.
2. La Obra se esta ejecutando por Contrato o Comparación de precio.
3. Se estan construyendo tanto aceras como contenes de manera simultanea.

IMÁGENES

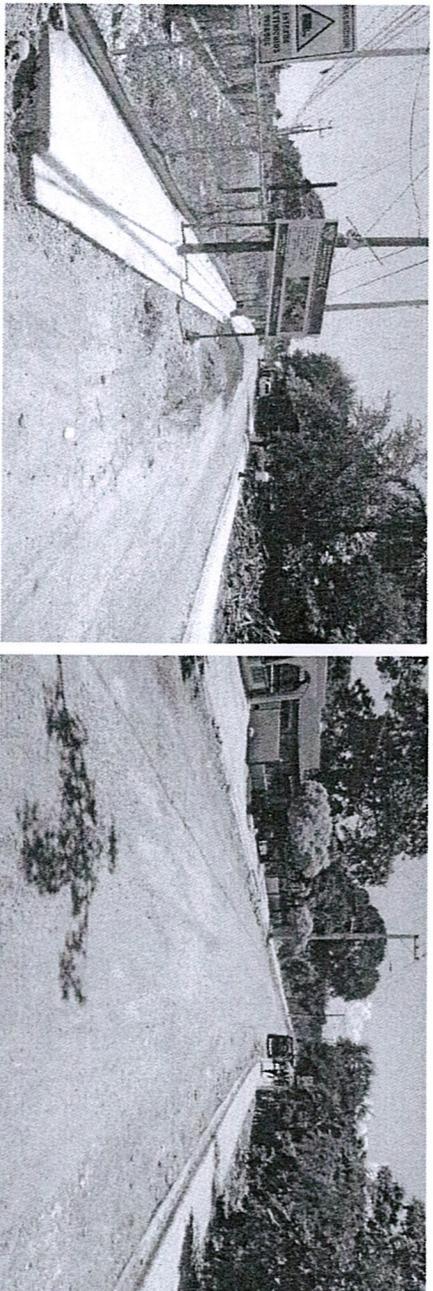



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

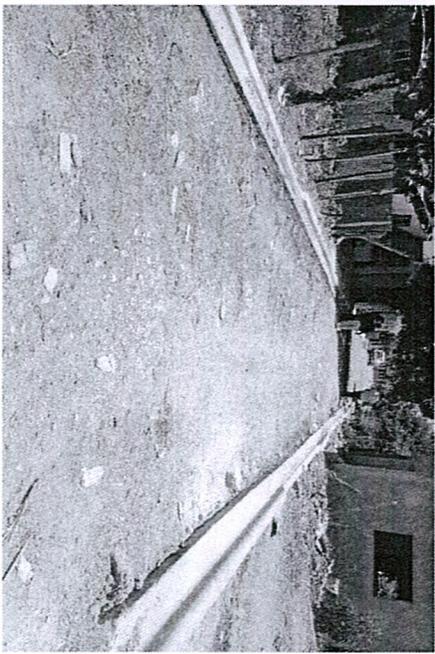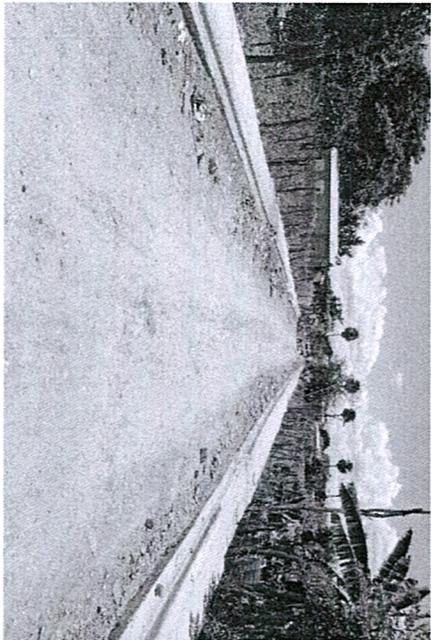

Suministra los datos de este reporte,

Juan D. Mercado
ING. DANILO MERCADO
Técnico

César de los Santos
CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico

