


ORIGINAL




Luciano | Sarkis
INGENIERIA

INFORME — BITACORA DE OBRA

CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y VERJA PERIMETRAL

CEMENTERIO CRISTO REDENTOR

DIU-039-2022



Movimiento de Tierra


Viernes 11 de Agosto del 2023


Llegada de retropala al cementerio Cristo Redentor




13 de Agosto del 2023

Inicio de trabajos retropala, acondicionamiento para acceso al terreno a intervenir




Realizado por:



Revisado y Autorizado por:



2600


Lunes 14 de Agosto del 2023

Inicio del movimiento de tierra para construcción de verjas




Jueves 17 de Agosto del 2023

Continuación de movimiento de material, arreglo de casa afectada por golpe de retropala



Viernes 18 de Agosto del 2023

Movimiento de material, y movido al punto de acopio



Realizado por:





Revisado y Autorizado por:

0000


Viernes 25 de Agosto del 2023

Combustible a retropala, Inicio de Botes de material, y continuación de movimiento de material.




Sábado 26 de Agosto del 2023

Continuación de movimiento de material y desbroce de arboles



Realizado por:





Revisado y Autorizado por:




Lunes 28 de Agosto del 2023

Continuación de movimiento de material y continuación de bote de materiales.




Martes 29 de Agosto del 2023

Seguimiento de movimiento de material en palma real 2, colocación de block.




Realizado por:


[Handwritten signature]



Revisado y Autorizado por:



[Handwritten signature]



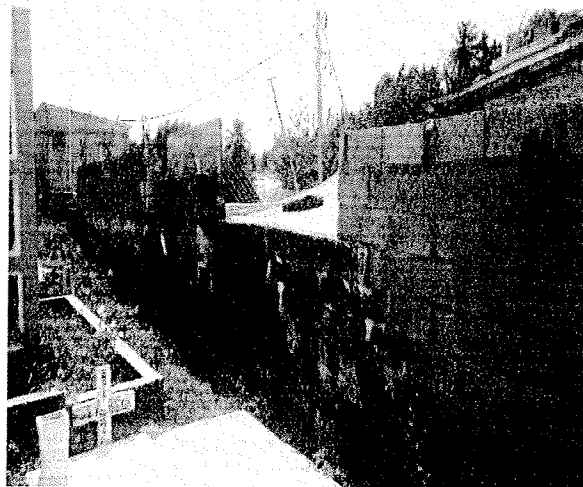


Miércoles 30 de Agosto del 2023


Continuación de colocación de block, continuación de movimiento de material y inicio de excavación de zanja para zapata.



Realizado por:




Revisado y Autorizado por:





Jueves 31 de agosto del 2023


Continuación de movimiento de material excedente para excavación de muros, continuación de excavación de zanja para zapata y demolición de muro existente encima de alcantarilla. Colocacion de block




Realizado por:





Revisado y Autorizado por:



000007


Viernes 01 de Septiembre del 2023

Movimiento de material excavado, llevado a punto de acopio de material, nivelación del terreno en material movido, continuación de colocación de block.



Sábado 02 de Septiembre del 2023

Continuación de movimiento de material, armado de zapata y vaciado, arreglo de la casa afectada por golpe de retropala.




Realizado por:



Revisado y Autorizado por:

000008

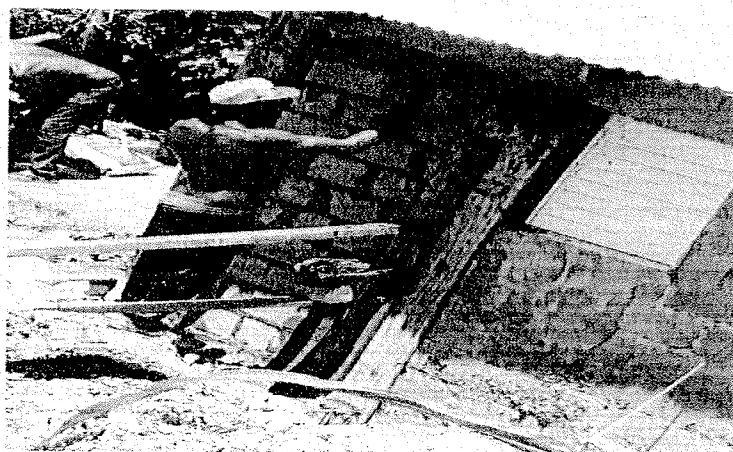

Martes 05 de Septiembre

Acondicionamiento de solar en 2do punto a entrar, para inicio de movimiento de tierra, inicio de movimiento de material y desbroce de árboles y matas existentes.



Realizado por:




Revisado y Autorizado por:

Manuel Vass


000009

Miércoles 06 de septiembre

Trabajo de demolición de muros existentes con brigada a mano, desbroce de maleza y desyerbado



Realizado por:






Revisado y Autorizado por:


000010


Jueves 7 de Septiembre del 2023

Mantenimiento a la retropala, cambio de aceite, filtro y engrase, cambio de goma dañada, continuación de demolición y zanja con brigada a mano




Realizado por:







Revisado y Autorizado por:


000011

Viernes 8 de septiembre del 2023


Continuación de excavación y movimiento de material. Continuación de demolición de muros con brigada a mano.



Realizado por:




Revisado y Autorizado por:



000012

Sábado 09 de Septiembre del 2023

Continuación de movimiento de material, realización de botes de material, continuación de trabajo a mano con brigada.



Realizado por:





Revisado y Autorizado por:

000013

Lunes 11 de septiembre

Inicio de excavación en tramo pegado a la casa afectada por golpe de retropala con fines de zapara, continuación de acondicionamiento y movimiento de material para habilitar el acceso hasta el punto final marcado por topografía.



Realizado por:




Revisado y Autorizado por:


000014

Martes 12 de Septiembre del 2023

Continuación de movimiento de material y habilitación del terreno para llegada al punto final indicado por topografía.



Realizado por:



Revisado y Autorizado por:


000015

Lunes 11 de septiembre

Inicio de excavación en tramo pegado a la casa afectada por golde de retropala con fines de zapara, continuación de acondicionamiento y movimiento de material para habilitar el acceso hasta el punto final marcado por topografía.



Realizado por:




Revisado y Autorizado por:

Manuel Vargas


000016

Martes 12 de Septiembre del 2023


Continuación de movimiento de material y habilitación del terreno para llegada al punto final indicado por topografía.



Realizado por:




Revisado y Autorizado por:



000017

Miércoles 13 de septiembre

Limpieza y nivelación del terreno del primer acceso, palma real 2, terreno donde fue afectada la casa de Don Mario, movimiento del material hasta el punto de acopio, colocación de block en el primer tramo intervenido, Manzana 19 con manzana 9, llenada de huecos de block, en este tramo por disposición y recomendación del supervisor Manuel Vargas fue indicado colocar una viga intermedia en la construcción de verjas, es decir a cada 7 u 8 líneas de block colocar una viga de amarre. En horas del medio día fue movida la retropala al segundo terreno a intervenir, por el solar del señor Chanflin, donde se inició el acondicionamiento, limpieza y nivelación de este tramo.





Realizado por:


Luciano Sarkis
INGENIERIA
RNC: 131261876

Revisado y Autorizado por:

000018

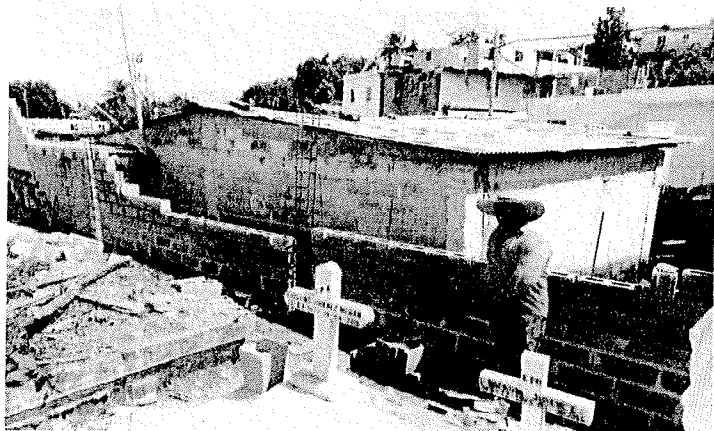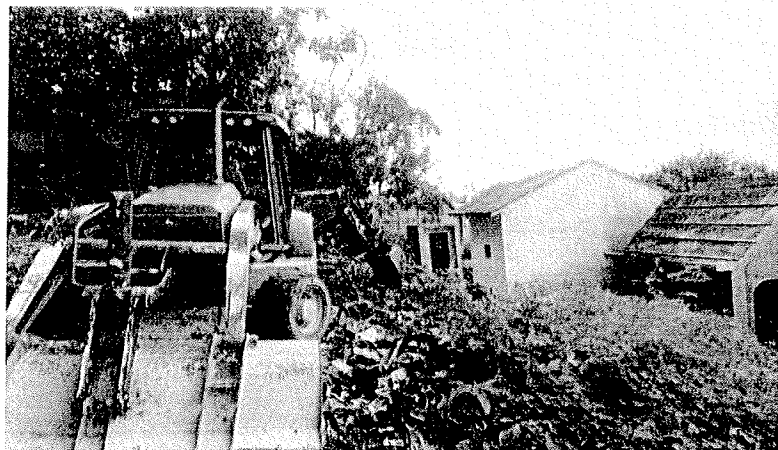


Realizado por:




Revisado y Autorizado por:


000019

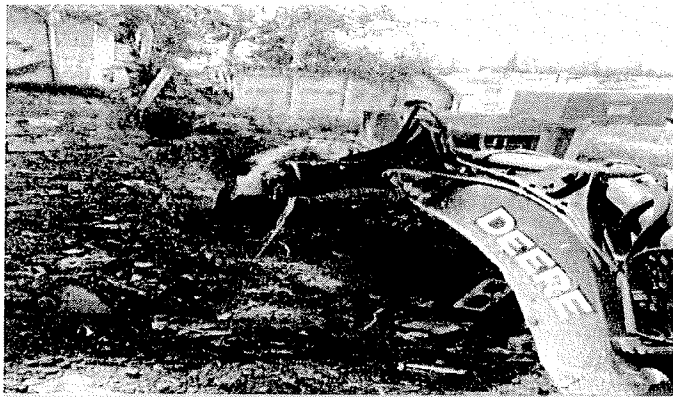

Realizado por:




Revisado y Autorizado por:




000021

Viernes 15 de septiembre

Encuentro en campo con el señor Johan, donde fue tratado el tema de diseño de las zapatas, también tratado el tema de modificación en algunas especificaciones y materiales a utilizar en el primer y segundo tramo intervenido por la retropala, el señor Johan indico que se inicien los trabajos de aceras y contenes en conjunto con los de verjas. Replanteo con hilo y Cal en el primer tramo intervenido para fines de excavación, la misma fue realizada el mismo día. Continuación de brigada a mano en el movimiento de tierra para la llegada a la estación final. Inicio del armado de columnas y vigas.






Realizado por:




Revisado y Autorizado por:



000022

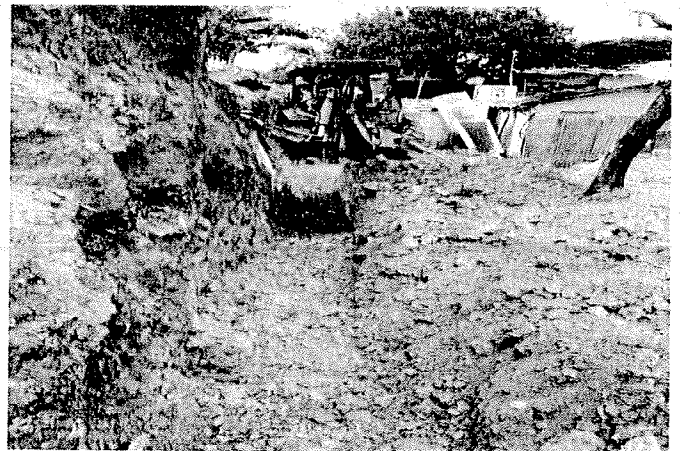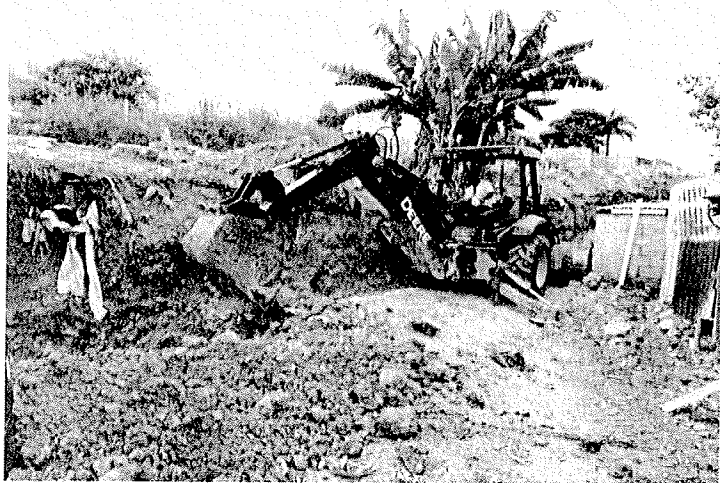

Realizado por:






Revisado y Autorizado por:

Manoel Vazquez

000024

Sabado 16 de septiembre

Continuación de excavación en el segundo terreno intervenido, para fines de zapata, demolición de muro existentes en ese tramo, tumbada de árbol seco que estaba justo al centro por donde va la zapata, nivelación y limpieza de terreno, material sobrante movido y acopiado en el punto de acopio. Armado y vaciado de columnas y viga encima del cabezal de alcantarilla. Continuación de movimiento de tierra con brigada a mano, en el primer tramo intervenido por retropala.





Realizado por:

Luciano | Sarkis
INGENIERIA
RNC: 131261676

Santiago, Rep. Dom.


Revisado y Autorizado por:

000025

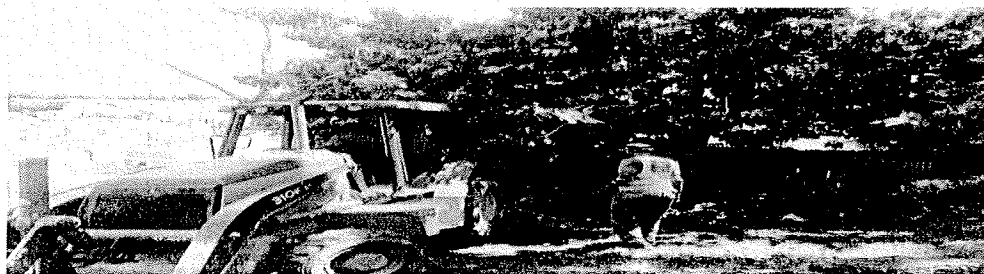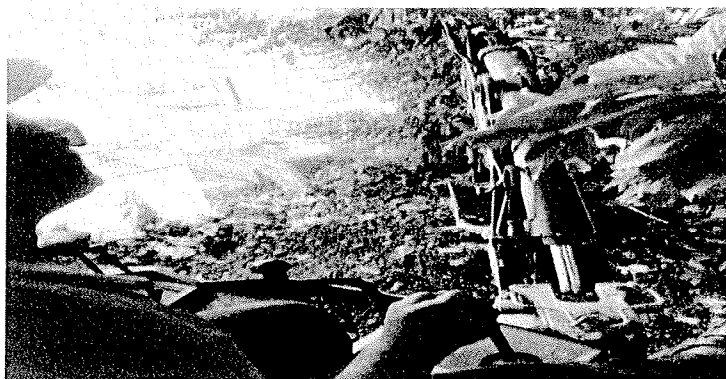

Lunes 18 de septiembre

Movida de retropala para el 3er tramo a intervenir, ubicada en la Cañada, acondicionamiento de este terreno, nivelación de terreno, demolición de verjas existentes y movimiento del material excedente al punto de acopio. Armado y vaciado de viga intermedia en los trabajos de verjas, a 10 líneas de block. Perfilación y nivelación de terrenos intervenidos por retro pala con brigadas a mano.









Realizado por:




Revisado y Autorizado por:





000026

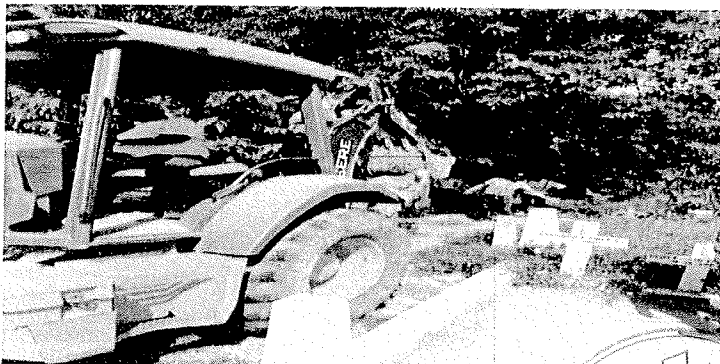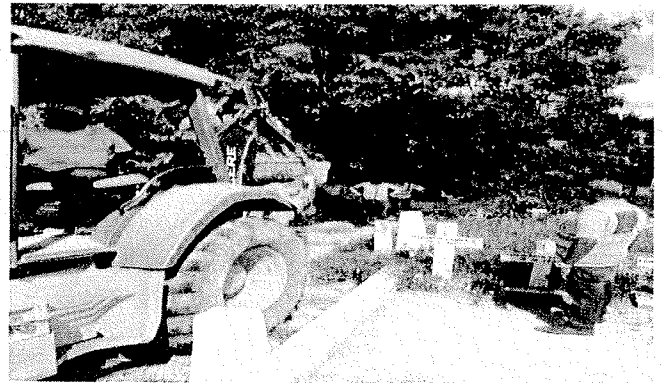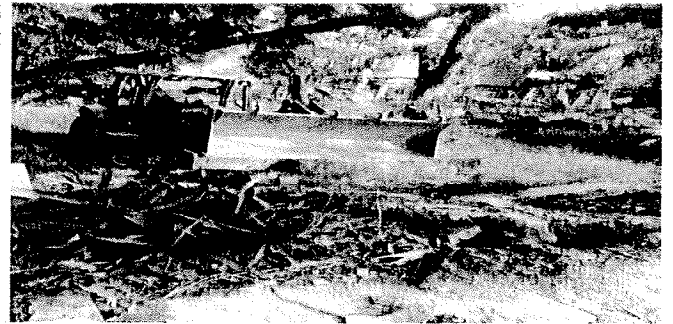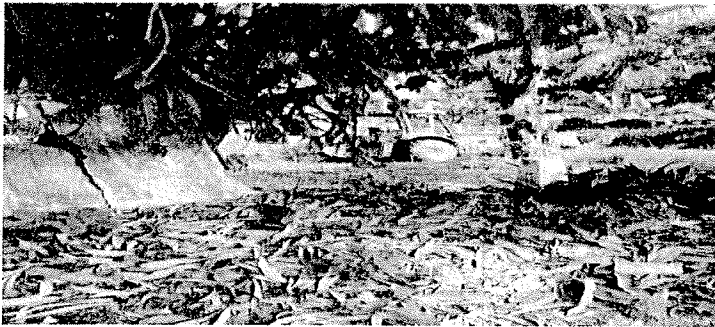



Realizado por:




Revisado y Autorizado por:

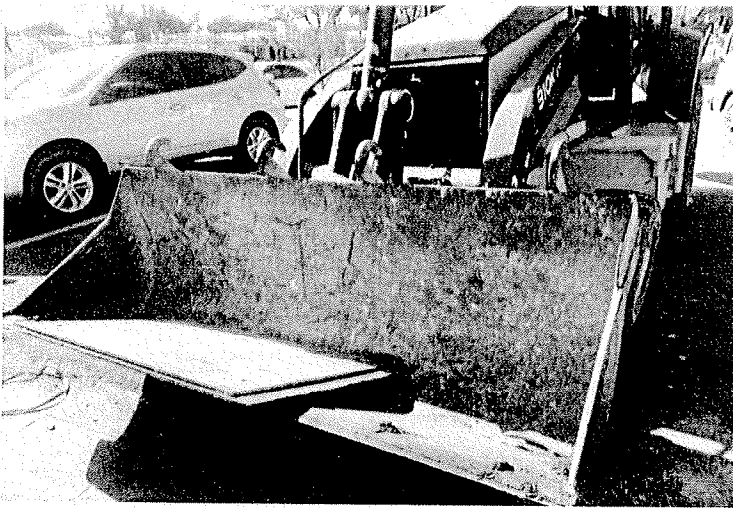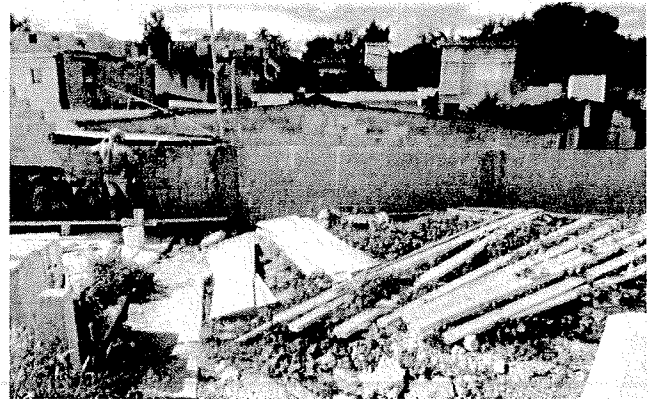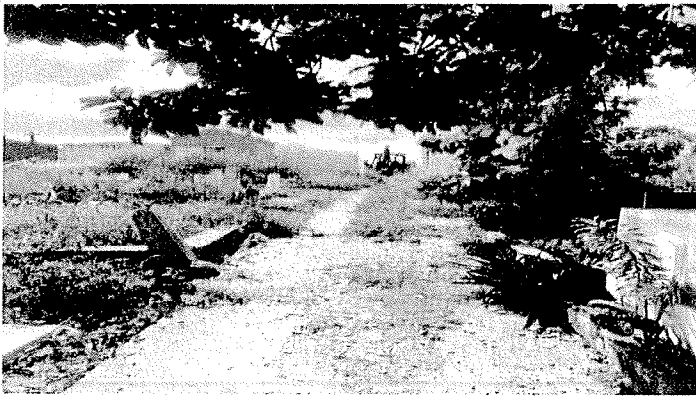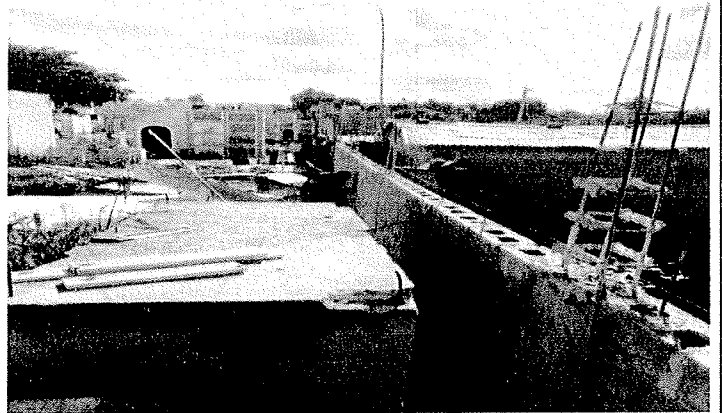

Realizado por:






Revisado y Autorizado por:




000028

Martes 19 de septiembre

Combustible a Retropala. Visita al campo del supervisor del ADN Manuel Vargas, donde se hizo un recorrido breve para verificar cuales aceras y contenes se someterán a demolición y construcción nueva. Demolición de block en muros ya terminados a su altura de 3.0 metros, con fines de meterles columnas como lo establecido en el diseño realizado por el ADN. Continuación de colocación de block encima de viga intermedia desencofrada. Continuación de perfilacion de terrenos intervenidos por retropala. Descubierta de Zapata existente en tramo del señor Chanflin. Continuación de nivelación, limpieza y acondicionamiento de terreno en la cañada, reunión con los vecinos dueños de solares en la cañada y el supervisor del ADN, donde se tocaron temas de delimitación de terrenos y frutos sembrados por los mismos. Vaciado de viga intermedia continua en el primer tramo intervenido.






Realizado por:



Revisado y Autorizado por:

Manuel Vargas

000029

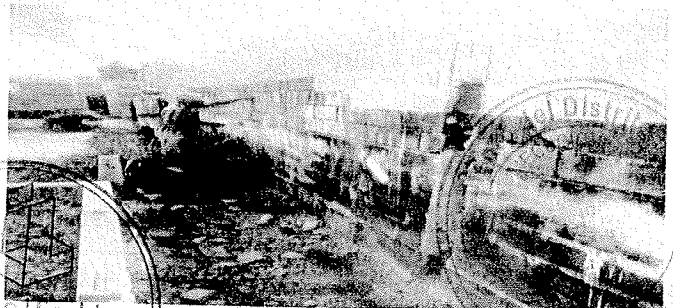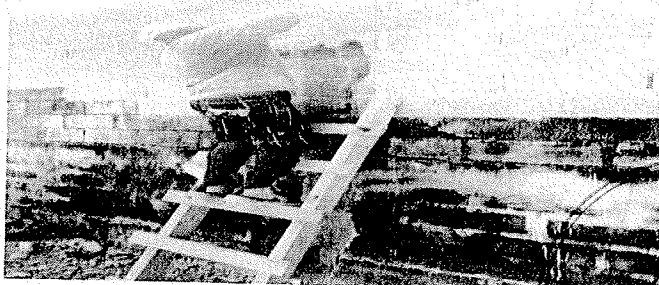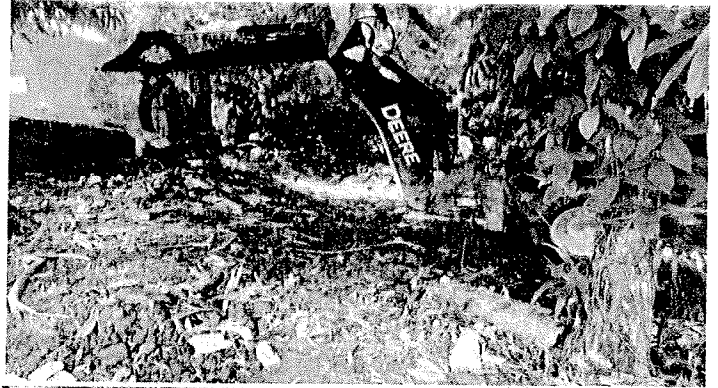


Realizado por:

Luciano Sarkis
INGENIERIA
RNC: 131261876
Santiago, Rep. Dom.

Revisado y Autorizado por:


000030

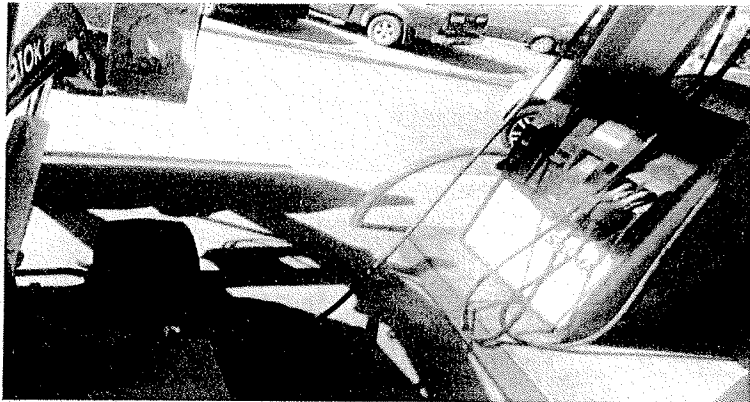



Miércoles 20 de septiembre


Visita de alcaldesa Carolina Mejía al proyecto, continuación de colocación de block en tramo visitado por alcaldesa, encofrado y vaciado de columnas de refuerza en mismo tramo, repicada de continuación de este tramo para colocación de block y refuerzo. Conflicto con vecinos en la cañada, por misma razón la retropala fue sacada y movida al 2do terreno intervenido, solar de Chanflin, donde la retropala saco la zapata existente y descubierta por brigada a mano, nivelación y limpieza de terreno, movimiento de tierra y movida a punto de acopio, continuación de perfilación y nivelación de terreno con brigada a mano.









Realizado por:





Revisado y Autorizado por:



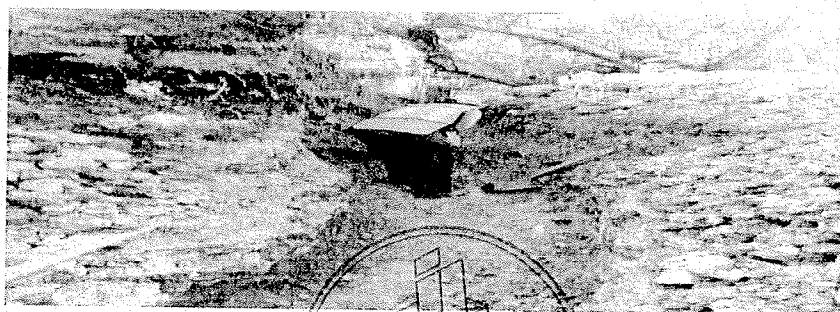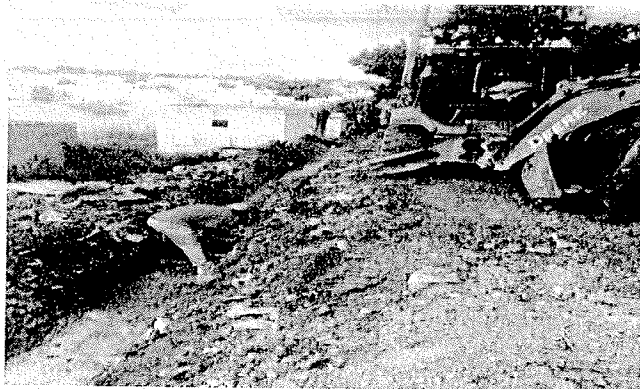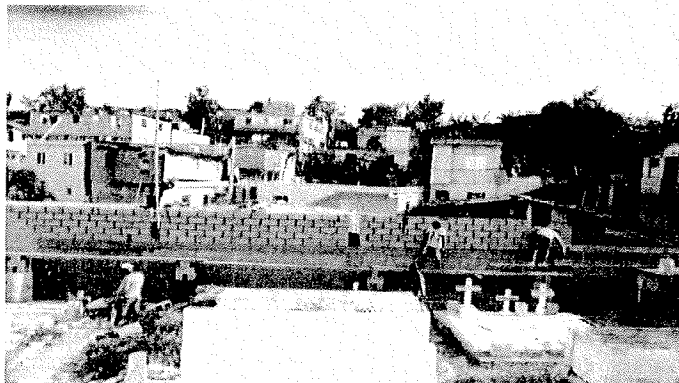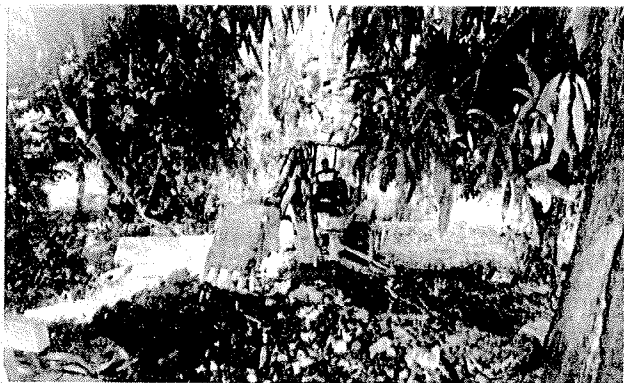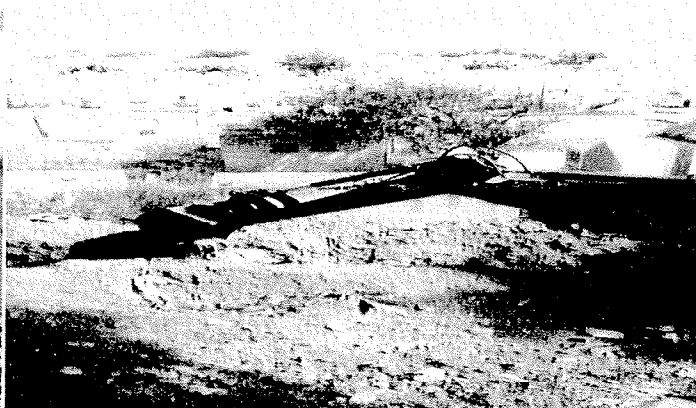

Realizado por:




Revisado y Autorizado por:



000032

ORIGINAL




Luciano | Sarkis
INGENIERÍA




BITACORA DE OBRA


PARTE II


CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y VERJA PERIMETRAL
RECONSTRUCCION CEMENTERIO CRISTO REDENTOR

DIU-039-2022




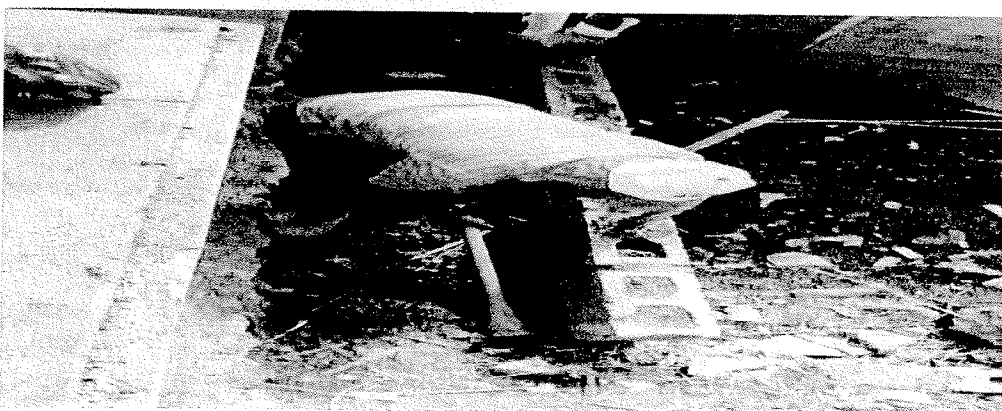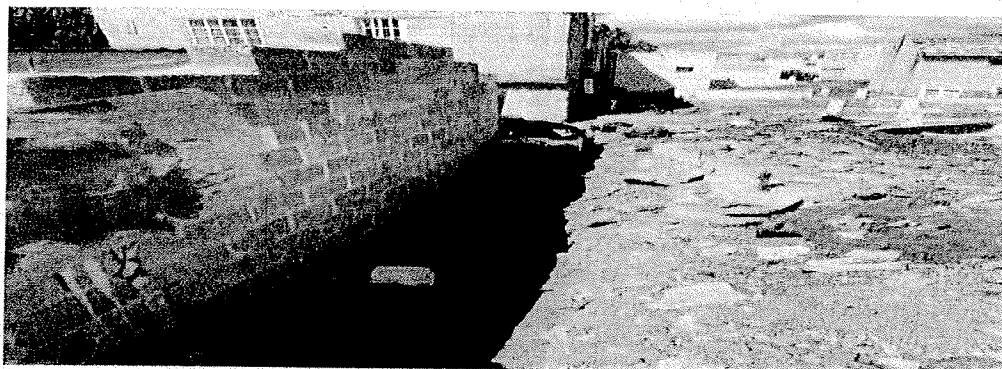

Realizado por: 



Revisado y Autorizado por: 

000039

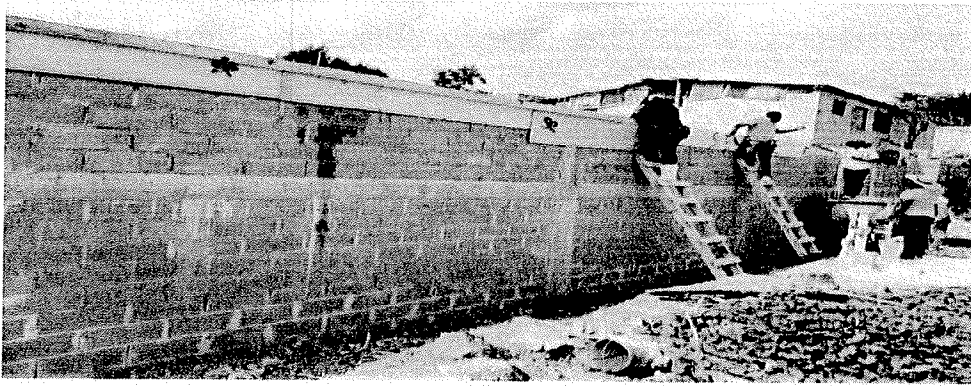

Lunes 25 de Septiembre del 2023

Continuación de acondicionamiento de próximo terreno a intervenir, continuación de excavación para zapata, realización de canastos, columnas y armado para zapatas y vigas en dicho tramo. Reunión propuesta para el tratar el tema de la cañada.



Realizado por:



Revisado y Autorizado por:





000038

Viernes 22 de Septiembre

Continuación de encofrado para viga de coronación al tope del muro. Excavación con brigada a mano de terreno de Chanflin, nivelación y perfilación de zanja hecha, demolición de muro existente en el mismo tramo. Continuación de colocación de block en tramo próximo a verja ciclónica.

Acondicionamiento de solar en 2do punto a entrar, para inicio de movimiento de tierra, inicio de movimiento de material y desbroce de árboles y matas existentes. Retro pala a espera de que se reúnan con el departamento del ayuntamiento y las juntas de vecinos para continuar los trabajos en la cañada.



Realizado por:







Revisado y Autorizado por:


000036

Sábado 23 de Septiembre del 2023


Continuación y terminación de encofrado para viga de coronación al tope del muro, vaciado de la misma viga. Inicio de acondicionamiento y retiro de zinc en terreno cercano al muro ya hecho, inicio de excavación para zapata en este mismo tramo. Trabajos de retro pala en movida de materiales para concreto de vaciar la viga.



Realizado por:



Revisado y Autorizado por:





Miércoles 20 de septiembre


Visita de alcaldesa Carolina Mejía al proyecto, continuación de colocación de block en tramo visitado por alcaldesa, encofrado y vaciado de columnas de refuerza en mismo tramo, repicada de continuación de este tramo para colocación de block y refuerzo. Conflicto con vecinos en la cañada, por misma razón la retropala fue sacada y movida al 2do terreno intervenido, solar de Chanflin, donde la retropala saco la zapata existente y descubierta por brigada a mano, nivelación y limpieza de terreno, movimiento de tierra y movida a punto de acopio, continuación de perfilación y nivelación de terreno con brigada a mano.










Realizado por:



Revisado y Autorizado por:




000031

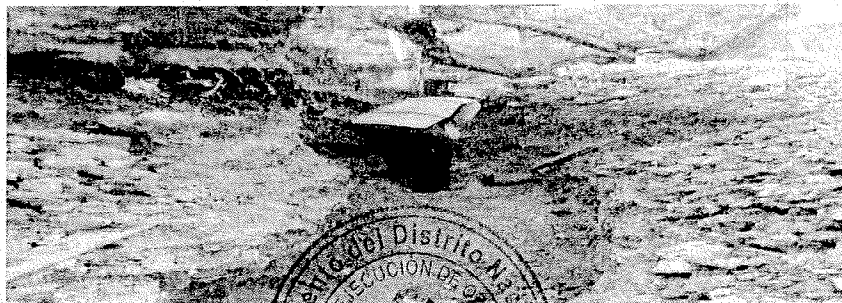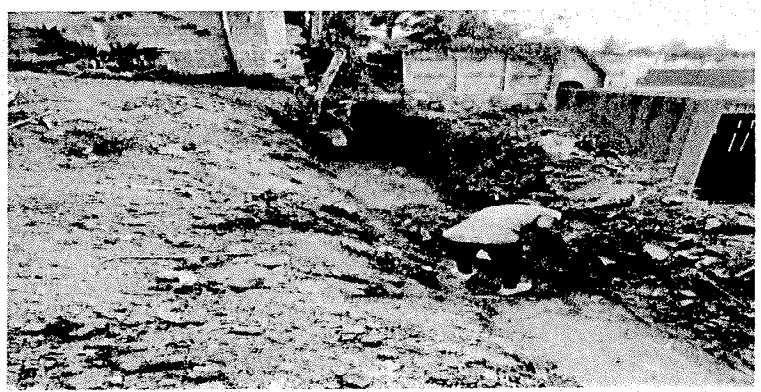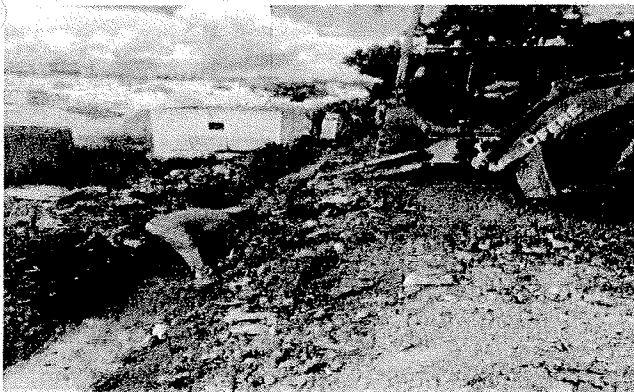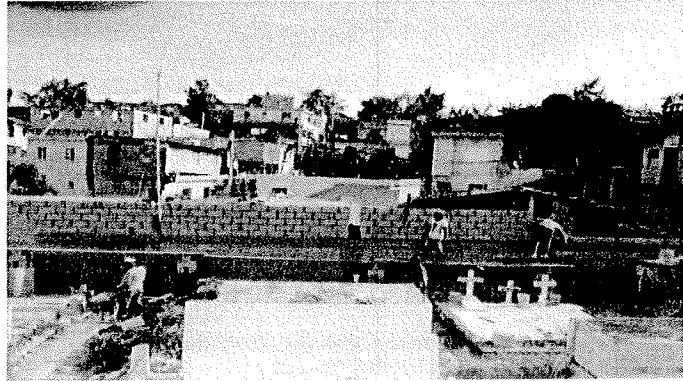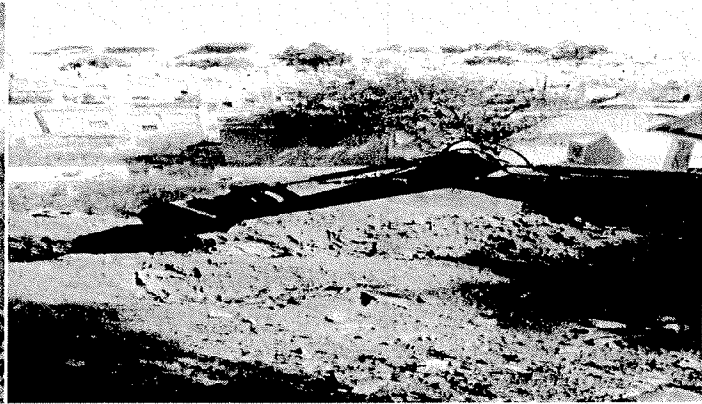


[Handwritten signature]
Realizado por:

[Handwritten signature]
Revisado y Autorizado por:

000032

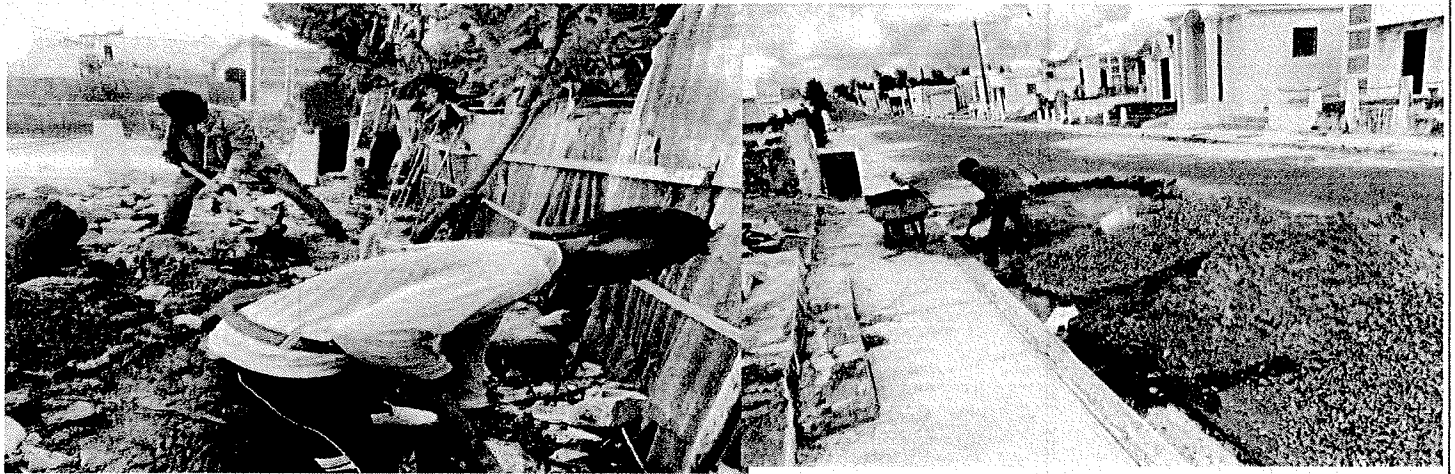


 Realizado por:







 Revisado y Autorizado por:



000033

Jueves 21 de Septiembre del 2023




Retro pala fue sacada el miércoles 13 de la cañada por el conflicto que se registró con los vecinos, la misma fue movida al primer terreno intervenido, para ampliación de zanja ya hecha con fines de zapata, cuya ampliación se debió al cambio de diseño en este tramo por empuje. Visita al proyecto del supervisor Manuel Vargas y demás compañeros del ADN. Enconfrado y vaciado de columnas en muro levantado. Comienzo de carpintería enconfrado de viga de coronación en muro terminado. Continuación de colocación de blocks encima de muro existente a topar con verja ciclónica.



Realizado por:

Revisado y Autorizado por:

000034

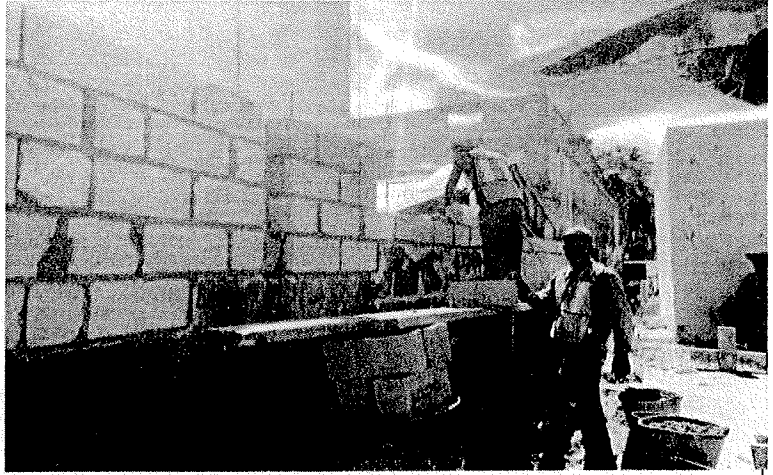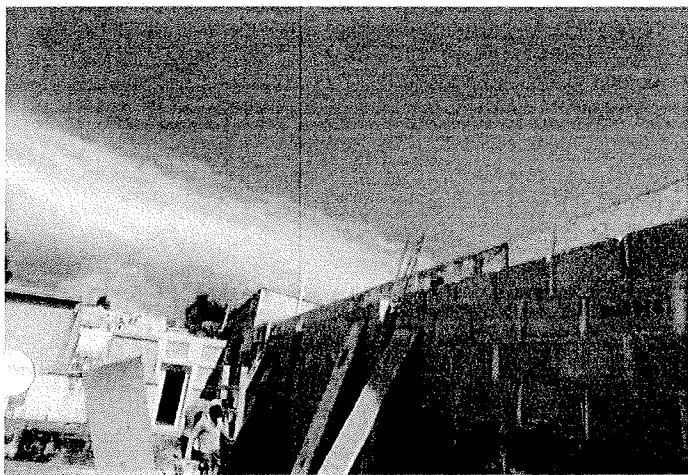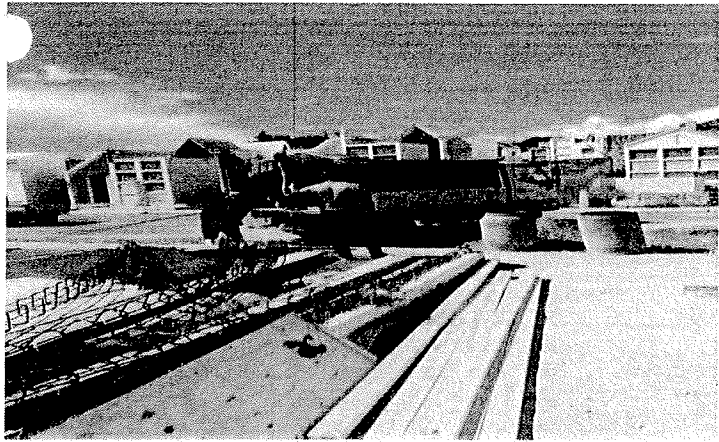

Realizado por:









Revisado y Autorizado por:

000035

Martes 26 de Septiembre del 2023

Finalización de excavación para zapata, armado y vaciado de la misma. Quitada de verja ciclónica para colocación de block, viga intermedia y viga de coronación, repicada de muro existente para viga intermedia.





Realizado por:



Revisado y Autorizado por:


000040

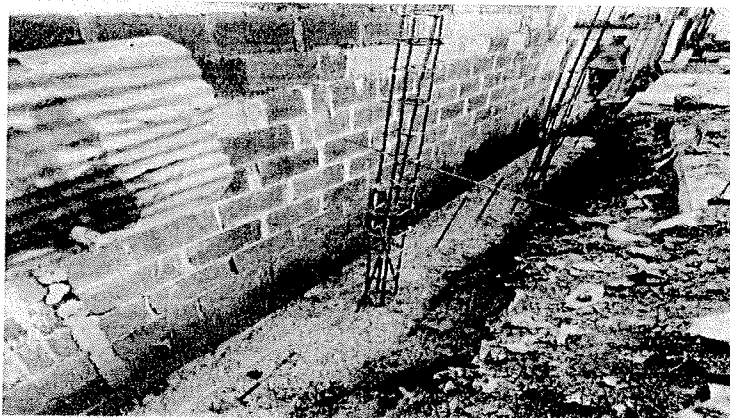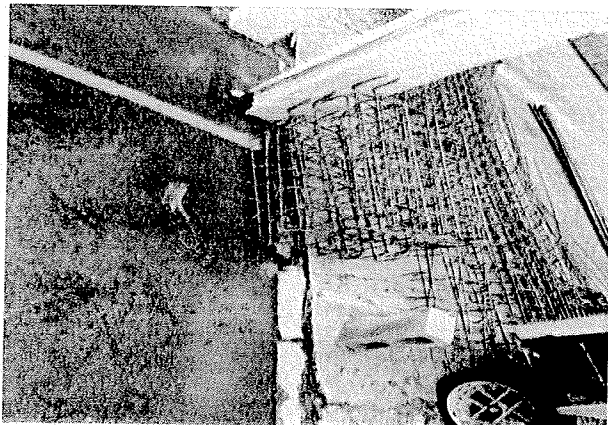

Realizado por:







Revisado y Autorizado por:




000041

Miércoles 27 de Septiembre


Continuación de vaciado de viga intermedia encima de línea de block descubierta en la demolición de muro quebrado existente, inicio de colocación de block en zapata en nuevo tramo, demolición de muros continuos a los trabajados, demolición de columnas y zapatas.



Realizado por:







Revisado y Autorizado por:



Jueves 28 de Septiembre del 2023

Continuación de colocación de block, dejado a nivel de viga intermedia, inicio de colocación de block en tramo donde se vació viga en día anterior, dejado también a nivel de viga intermedia, retropala parada al día de hoy por espera de reunión del ADN con los vecinos dueños de solares. Trabajos de armado de acero para columnas, vigas, zapatas para terreno de Chanflin. Demolición de muro existente en tramo progresivo al de colocación de block.



Realizado por:






Revisado y Autorizado por:

000043

Viernes 29 de Septiembre del 2023

Demolición de muro, zapata y columnas en terreno donde Chanflin, nivelación y perfilación del mismo, demolición de muro en tramo en progresiva al terreno donde se está colocando block, armado para vaciado de viga intermedia.





Realizado por:

Revisado y Autorizado por:

000044

Sábado 30 de septiembre del 2023


Llegada de materiales a obra, grava, arena azul y arena itabo. Continuación de colocación de block en tramos donde ya se vació la viga intermedia, continuación de demolición de muro y nivelación de terreno de Chanflin.



Realizado por:







Revisado y Autorizado por:



000045

Lunes 02 de Octubre del 2023


Llegada de cemento a obra, definido los puntos a demoler en aceras con Marco y Manuel Vargas supervisor del ADN, vaciado de viga intermedia, inicio de excavación para zapatas de columnas en terreno de Chanflin.



Realizado por:







Revisado y Autorizado por:



000016

Martes 03 de Octubre


Arranque de trabajo con retropala, nivelación del terreno de Chanflin con retropala para acopiar los materiales a utilizar en zapata, vigas y muro en el mismo. Continuación de colocación de block encima de viga intermedia en tramo trabajado, continuación de excavación para zapatas de columnas, continuación de armado de acero para vigas y columnas.



Realizado por:



Revisado y Autorizado por:




000047



Miércoles 04 de Octubre

Inicio de trabajos de demolición en aceras, inicios de trabajos en zapata en terreno de Chanflin, vaciado de un tramo de zapata en el terreno de Chanflin. Continuación de demolición de muro quebrado.





Realizado por:

Luciano Sarkis
INGENIERÍA
RNC: 131261876

Santiago, Rep. Dom.


Revisado y Autorizado por:

0000018

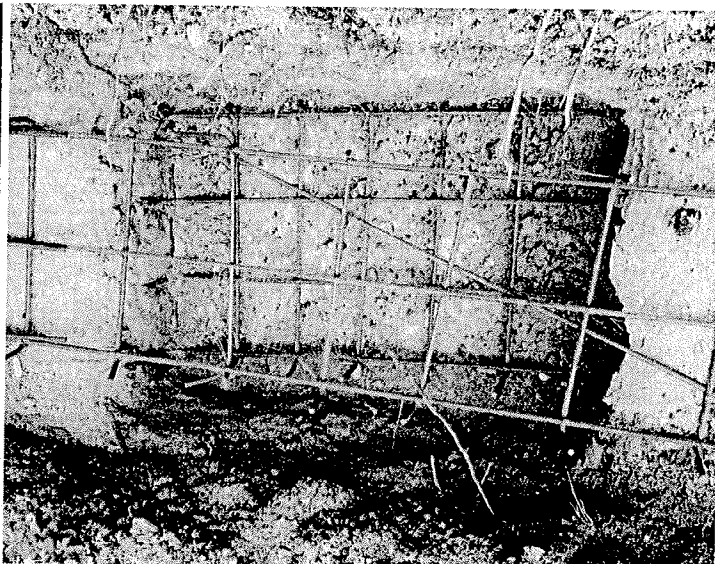
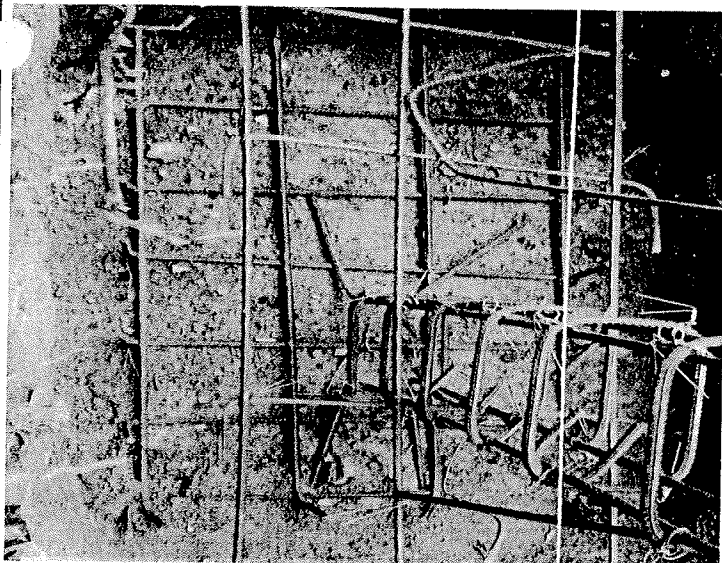


Jueves 05 de Octubre del 2023


Continuación de vaciado de zapata en terreno de Chanflin, inicio de colocación de block en el tramo ya vaciado, armado de carpintería para viga de coronación en el tramo de abajo, continuación de demolición de muro, zapata y columnas en tramo progresivo.



Realizado por:



Revisado y Autorizado por: 000079




Luciano | Sarkis
INGENIERIA

BITACORA DE OBRA


PARTE III

CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y VERJA PERIMETRAL
RECONSTRUCCION CEMENTERIO CRISTO REDENTOR

DIU-039-2022



ORIGINAL




Luciano | Sarkis
I N G E N I E R Í A

BITACORA DE OBRA

PARTE III



CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y VERJA PERIMETRAL
RECONSTRUCCION CEMENTERIO CRISTO REDENTOR


DIU-039-2022





Lunes 09 de Octubre del 2023

Inicio de carpintería en tramos donde está a nivel de viga intermedia en el terreno de chanflin, en el mismo tramo por causas de los escalones en la zapata de muro, se ha visto en la necesidad de llevar la altura de block a unas 8, 9, 10, 11 líneas de block, altura a las que se colocara la viga intermedia, debido a que si se hace a unas 7 o menor líneas en algunos tramos quedara enterrada por la condición del terreno, esta decisión fue planteada y aprobada por el supervisor Manuel Vargas vía llamada telefónica del celular del Administrador del Cementerio Marcos Mejía, continuación de colocación de block en tramos finales del terreno de chanflin, terminación de vaciado de viga de coronación en el otro tramo, continuación de la demolición de muro, zapata y columnas en otros tramos. Continuación de trabajos de demolición de aceras con retropala.





Realizado por:





Revisado y Autorizado por:

000055

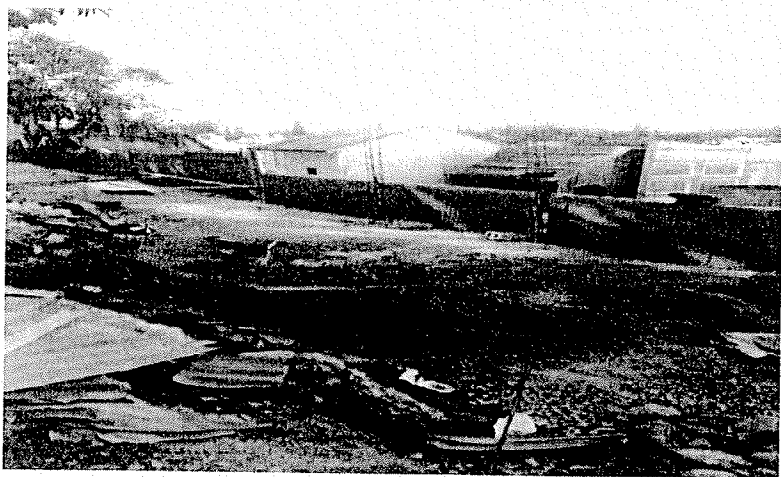

LB
Realizado por:




Luciano | Sarkis
Revisado y Autorizado por:


003056

Martes 10 de Octubre del 2023

Continuación de trabajos de carpintería donde Chanflin para colocar vigas intermedia, continuación de colocación de block en el mismo tramo. Vaciado de Zapata en tramo de la mata grande, demolición de muros quebrados existentes y columnas en mal estado, en tramo progresivo al tramo de la mata grande, muros quebrados chequeados días antes por el supervisor del ADN Manuel Vargas y llegado a la conclusión de demolerlos.






Realizado por:




Revisado y Autorizado por:

000057

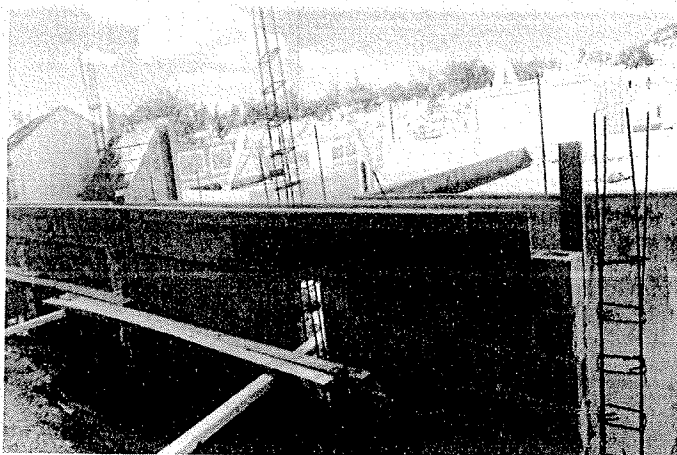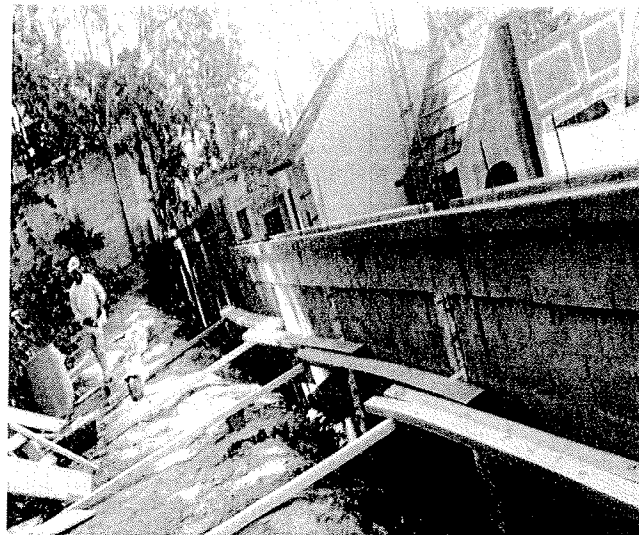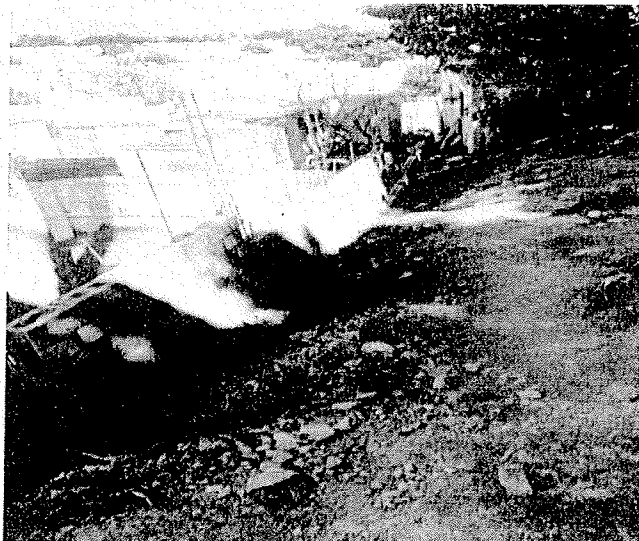

[Signature]
Realizado por:




[Signature]
Revisado y Autorizado por:


000058

Miercoles 11 de Octubre del 2023

Continuación de colocación de block y armado de carpintería para vaciar viga intermedia en el terreno de Chanflin, cargada de materiales para vaciar viga con retropala, continuación de demolición de muro en tramo de la mata grande. Demolición de aceras con retropala. Nivelacion del terreno donde don Mario, debido a las lluvias el terreno de deslizo nuevamente.




Realizado por:




Revisado y Autorizado por:

000059

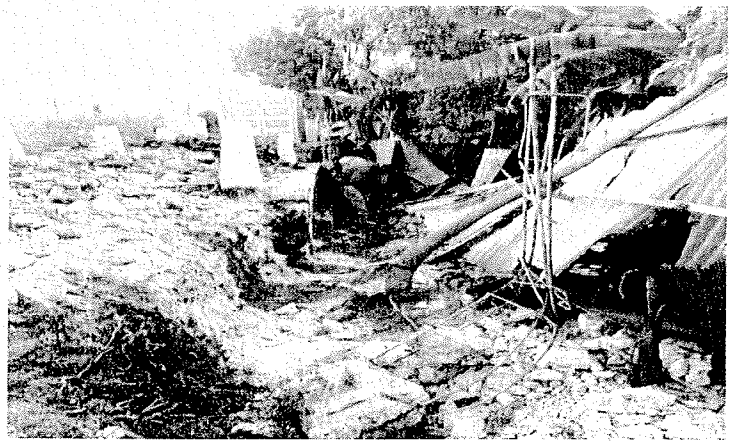

Jueves 12 de Octubre del 2023

Continuación de colocación de block donde chanflin, vaciado de viga intermedia y columnas donde chanflin. Continuación de preparación de taller en el tramo de la mata grande, demolición de muro y columnas, tambien de zapatas.



Realizado por:







Revisado y Autorizado por:

000060

Viernes 13 de Octubre del 2023

Continuación de colocación de block en tramo donde chanflin, continuación del vaciado de viga y columnas, y desencofrado de las ya vaciadas. Continuación de la preparación de talleres para vaciado de vigas y levantar muros. Retropala en espera de la seguridad en la cañada para trabajar ahí.



Realizado por:




Revisado y Autorizado por:


000061

Sábado 14 de Octubre del 2023

Colocación de block encima de viga intermedia vaciada en el tramo donde chanflin. Inicio de excavación para zapatas de columnas autorizada por el supervisor del ADN Manuel Vargas en el tramo del muro de 8. Reposición de relleno en terrenos ya trabajados.



Realizado por:





Revisado y Autorizado por:

000662

Lunes 16 de Octubre del 2023

Continuación de colocación de block en tramos donde chanflin, un tramo llevado a punto de viga intermedia. Reunion en la oficina administrativa con el regidor de Pantoja y el presidente de la junta de vecino para tratar el tema de la cañada. Trabajos en armado de canastos para viga y columna. Retro pala en espera de que lleguen la seguridad para entrar a la cañada, ya que fue agredida por los vecinos.



Martes 17 de Octubre del 2023

Colocacion de block en el tramo de la mata grande donde se vacio zapata. Continuation de preparaci3n de terreno en tramo de la mata grande, demolici3n de muro y zapata existente. Continuation de excavaci3n para zapatas de columnas en el tramo de don Mario. Retro pala aun en espera de la seguridad para poder entrar a la cañada.



Realizado por:




Revisado y Autorizado por: 000063



Miercoles 18 de Octubre del 2023

Continuación de preparación del tramo progresiva a la mata grande, ya demolida la zapata, columnas, y muro, tambien realizada la excavación con fines de zapata para muro. Continuation de colocación de block en tramos listos. Reunion con las autoridades en la cañada, para tratar el tema de los trabajos en la cañada.



Realizado por:






Revisado y Autorizado por:


000064

Jueves 19 de Octubre del 2023

Continuación de los mismos talleres, en campo en terreno donde chanflin, por disposición del supervisor Manuel Vargas, fue establecido que le aumentos 2 y 3 líneas más de block a algunos tramos señalados por el.



Realizado por:




Revisado y Autorizado por:


000065

Viernes 20 de Octubre del 2023

Continuación de excavación para zapatas de columnas en tramo de Don Mario, vaciado de zapata para muro y para columnas en tramo preparado por brigada en la mata grande. Continuación de colocación de block en tramo donde chanflin. Retro pala en espera de las autoridades y seguridad para poder trabajar en la cañada.



Realizado por:





Revisado y Autorizado por:

000066

Sabado 29 de Octubre del 2023

Vaciado de viga de coronación y columnas en algunos tramos del terreno de chanflin, continuación de vaciado de zapata en el tramo de la mata grande, continuación de reposición de relleno en tramos listos. Retro pala aun en espera de la seguridad para los trabajos de la cañada.




Realizado por:



Revisado y Autorizado por: 000067

Lunes 23 de Octubre del 2023

Continuación de reposición de relleno, iniciado de punto para iniciar a colocar block en tramo de zapata vaciada ya.



Realizado por:



Revisado y Autorizado por:


000068

Martes 24 de Octubre del 2023

Continuación de frentes de taller, reposición de relleno, bote de material y escombros con retro pala.



Realizado por:



Revisado y Autorizado por:


000069

Lunes 30 de Octubre del 2023

Demolición de muro a 2.40 m de altura, demolición de 5 columnas (0.50x0.20x2.4), y demolición de zapata en tramo en progresiva al terreno de chanflin a pegar con la mata de naranja. Reposición de relleno en terreno de chanflin parte adentro con la retro pala. Retro pala en espera de la seguridad para entrar a la cañada.



Realizado por:




Revisado y Autorizado por:


000070

Martes 31 de Octubre del 2023

Continuación de demoliciones para preparación de terrenos en tramo en progresiva a chanflin. Retro pala en posición de entrar a la cañada, aun en espera de la seguridad. Tramo en la mata grande dejado a la altura de viga intermedia, listo para vaciarse.



Realizado por:




Revisado y Autorizado por:

000071

Miércoles 01 de Octubre del 2023

Tramo en progresiva de chanflin hasta la mata de naranja preparado y listo para vaciarse zapatas, llegada de seguridad a la cañada, entrada de retro pala a la cañada pero amaneció lloviendo y no pudo ser concretado.



Realizado por:

Revisado y Autorizado por:

000072
