



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 020202

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: LAS CHARCAS

DISTRITO MUNICIPAL: PALMAR DE OCOA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 6 de septiembre de 2022

1. Ing. Ana Indhira Rámirez

TÉCNICOS: 2. Ing. Asamín Ferreras

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ Padre Billini				135.40	2		270.8
TRAMO B	C/ Juana De Arco	112.90	1.00	2			225.8	
TRAMO C	C/ Intercepcion Juana Hantton 1				148.70	2		297.4
TRAMO D	Respaldo detrás del Play				253.3	2		506.6
TRAMO E	C/ La Funeraria				46.75	2		93.5
TRAMO F	C/ Proyecto				120.4	2		240.8
TRAMO G	C/ Intercepcion Juana Hantton 2				54.1	2		108.2
TRAMO H	C/ Juana Hanton				79	2		158
TRAMO I	C/ Juana Hanton 3				71.95	2		143.9
TRAMO J	Entrada de Durange Aguida Amador	39.40	1.00	2			78.8	
Total							304.60	1819.20

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,937,573.43

Monto desembolsado RD\$ 1,468,786.72 (50%)

Avance de obra 172.72%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIÁ

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 6 de septiembre de 2022

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: LAS CHARCAS

DISTRITO MUNICIPAL: PALMAR DE OCOA


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 304.60 metros cuadrados de aceras y 1,819.20 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. La modalidad de ejecución fue por contrato.
2. La Alcaldía empleó la mayoría de los fondos en contenes para aprovechar el programa de alfaldado.
3. Se cumplieron con las normas constructivas sugeridas dentro de este programa.
4. Los municipios se encuentran satisfechos con la ejecución del programa de aceras y contenes.

IMÁGENES

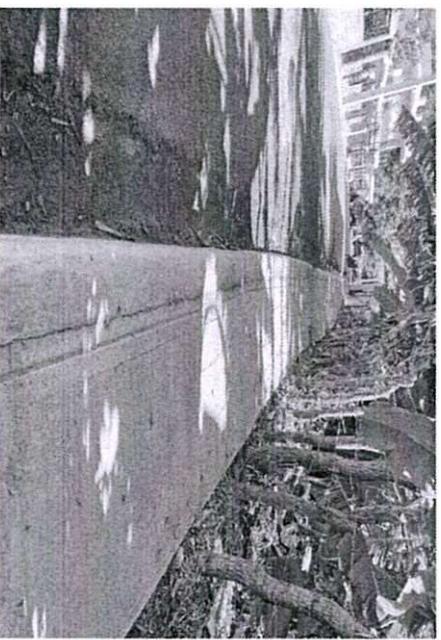



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

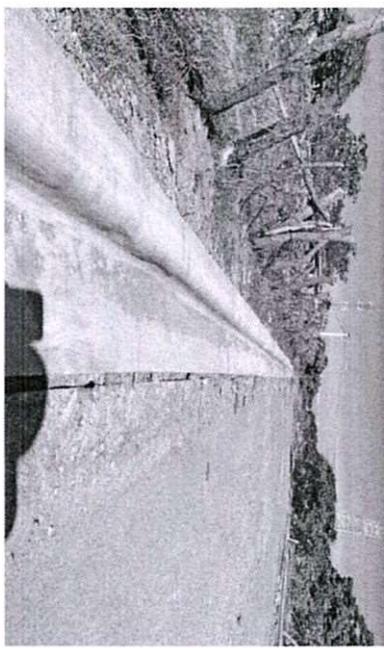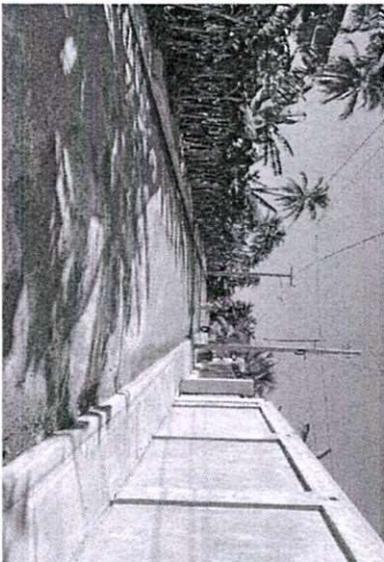

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RAMÍREZ

Técnico


ING. ASAMÍN FERRERAS

Técnico

