

LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 020202

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: LAS CHARCAS

DISTRITO MUNICIPAL: PALMAR DE OCOA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 2 de septiembre de 2022

TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Rámirez
2. Ing. Asamín Ferreras

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ Padre Billini				135.40	2		270.8
TRAMO B	C/ Juana De Arco	112.90	1.00	2			225.8	
TRAMO C	C/ Intercepcion Juana Hantton 1				148.70	2		297.4
TRAMO D	Respaldo detrás del Play				253.3	2		506.6
TRAMO E	C/ La Funeraria				46.75	2		93.5
TRAMO F	C/ Proyecto				120.4	2		240.8
TRAMO G	C/ Intercepcion Juana Hantton 2				54.1	2		108.2
TRAMO H	C/ Juana Hantton				79	2		158
TRAMO I	C/ Juana Hantton 3				71.95	2		143.9
TRAMO J	Entrada de Durange Aguida Amador	39.40	1.00	2			78.8	
TRAMO K								
TRAMO DK								
Total							304.6	1819.2

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA		
Monto asignado	RD\$ 2,937,573.43	
Monto desembolsado	RD\$ 1,468,786.72	(50%)
Avance de obra	172.72%	



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIYA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 2 de septiembre de 2022

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: LAS CHARCAS

DISTRITO MUNICIPAL: PALMAR DE OCCA



REPORTE


A la fecha de 02/09/2022 se ha ejecutado 304,60 metros cuadrados de aceras y 1,819,20 metros lineales de contén, lo que corresponde al 172.72% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS


1. Este distrito municipal esta construyendo por contrato.
2. Tienen construido más contenes que aceras, el Alcalde expresó que le van a enviar el programa de asfaltado y quieren aprovecharlo en su totalidad.
3. Los construido cumple con las normas sugeridas por dicho programa.
4. Los municipe del lugar estan más que feliz con la obra ya que venían pidiendo el arreglo de esta.

IMÁGENES

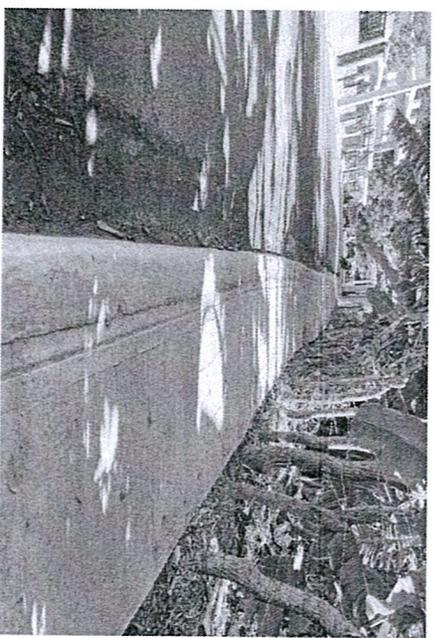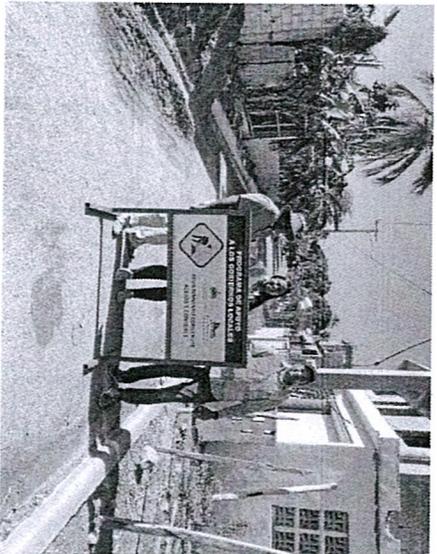



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

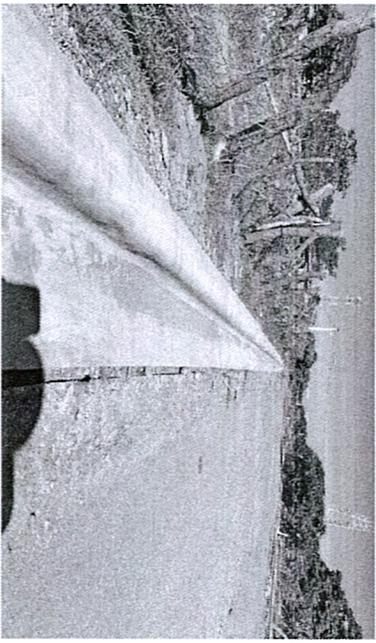

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RAMIREZ

Técnico


ING. ASAMÍN FERRERAS

Técnico

