



# LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 020302

**REGIÓN:** VALDESIA

**PROVINCIA:** AZUA

**MUNICIPIO:** LAS YAYAS DE VIAJAMA

**DISTRITO MUNICIPAL:** VILLARPANDO

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 1 de agosto de 2022

1. Ing. Ana Indhira Rámirez

**TÉCNICOS:** 2. Ing. Danilo Mercado

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CARR. VIEJA SÁNCHEZ	429.92	1.00	2	439.60	2	859.84	879.2
TRAMO B	CARR. VIEJA SÁNCHEZ				482.10	2		964.2
TRAMO C								
TRAMO D								
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							859.84	1843.40

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,383,104.09

Monto desembolsado RD\$ 1,691,552.05 (50%)

Avance de obra 172.96%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 1 de agosto de 2022

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: LAS YAYAS DE VIAJAMA

DISTRITO MUNICIPAL: VILLARPANDO


## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 859,84 metros cuadrados de aceras y 1,843,40 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### NOTAS



1. La modalidad de ejecución es por contrato.
2. La calidad de la obra es óptima.
3. Al momento de la visita se observaban escombros y malezas, por lo que se les sugirió realizar una limpieza final.

### IMÁGENES

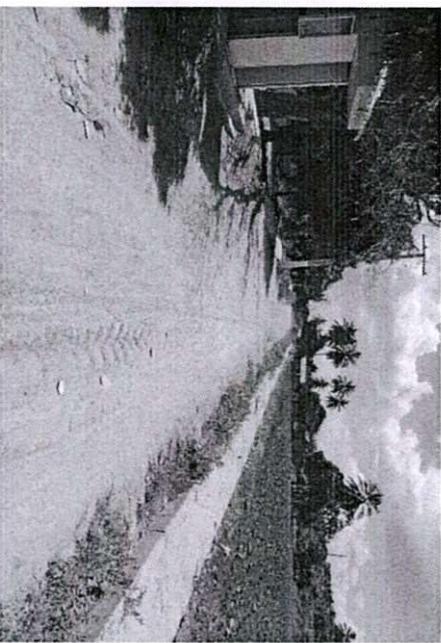



**LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —**

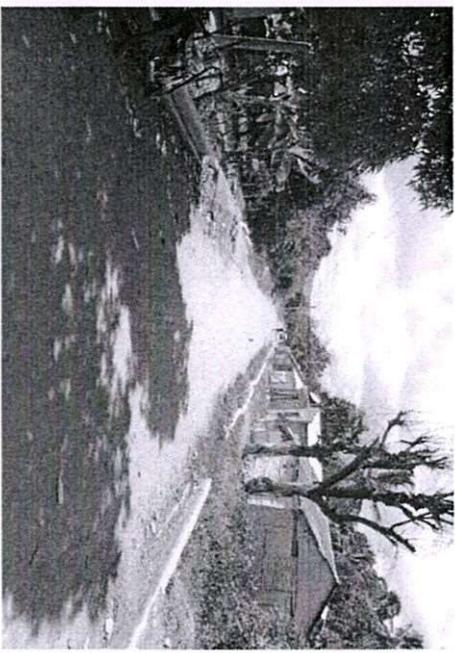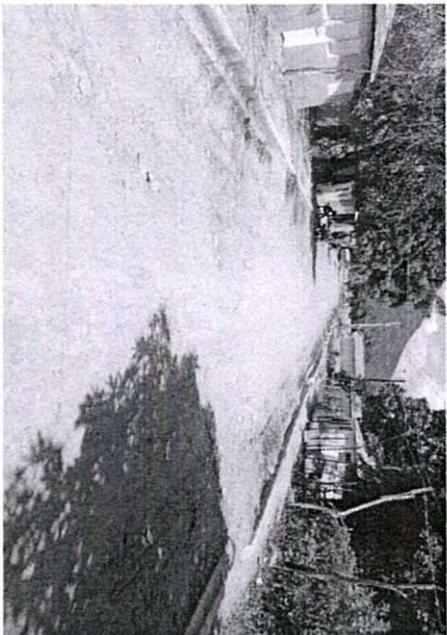

Suministra los datos de este reporte,

  
ING. ANA INDHIRA RAMIREZ

Técnico

  
ING. DANILLO MERCADO

Técnico

