



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 020402

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: PADRE LAS CASAS

DISTRITO MUNICIPAL: LAS LAGUNAS

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 20 de febrero de 2023

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

TÉCNICOS: 2. César De Los Santos


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	PAULINO AGRAMONTE	257.00	1.00	1.00			257.00	
TRAMO B	PAULINO AGRAMONTE	46.60	1.00	1.00			46.60	
TRAMO C	CALLE RAMON GARCIA	342.55	1.00	2.00	351.92	2.00	685.10	703.84
Total							988.70	703.84

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,071,839.97

Monto desembolsado RD\$ 3,071,839.97 (100%)

Avance de obra 100.44%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESA

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: PADRE LAS CASAS

DISTRITO MUNICIPAL: LAS LAGUNAS

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 20 de febrero de 2023


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 988.70 metros cuadrados de aceras y 703.84 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Este distrito esta construyendo por contrato.
2. Este cumple con los parametros recomendados.

IMÁGENES

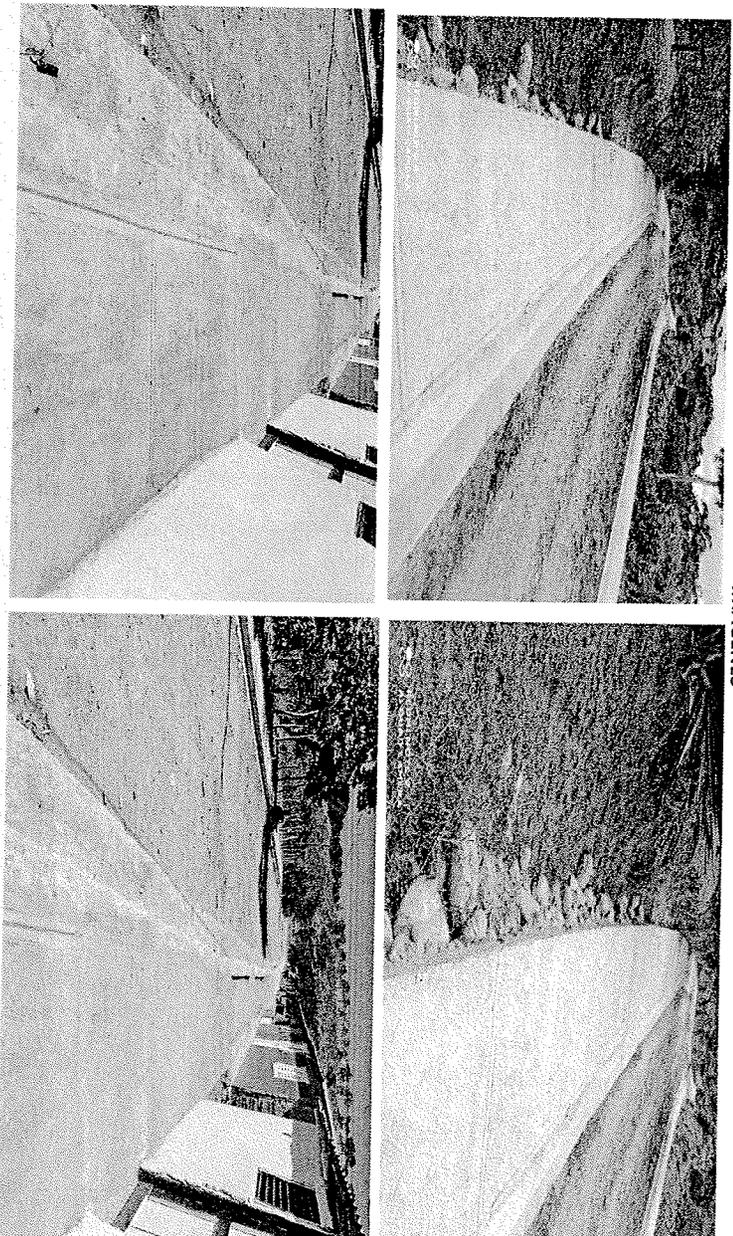





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

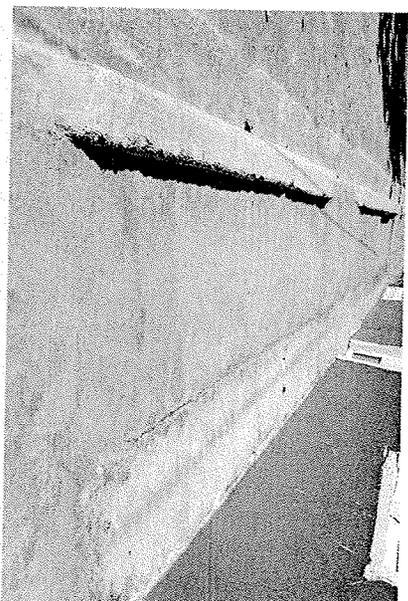

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDIRA RÁMIREZ
Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico
