



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 020601
REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: AZUA
MUNICIPIO: SABANA YEGUA
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 14 de julio de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Richard Cabrera
2. Felipe Reyes


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE PROYECTO BARRIO TRANQUILO	412.30	1.00	1.00	1,675.30	1.00	412.30	1,675.30
Total							412.30	1,675.30

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,725,060.81

Monto desembolsado RD\$ 3,725,060.81 (100%)

Avance de obra 129.99%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 14 de julio de 2023

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: SABANA YEGUA

DISTRITO MUNICIPAL: -



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 412.30 metros cuadrados de aceras y 1,675.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. Se observó buena terminación en contenes y aceras.
2. Cumplen con las especificaciones técnicas del programa.

IMÁGENES

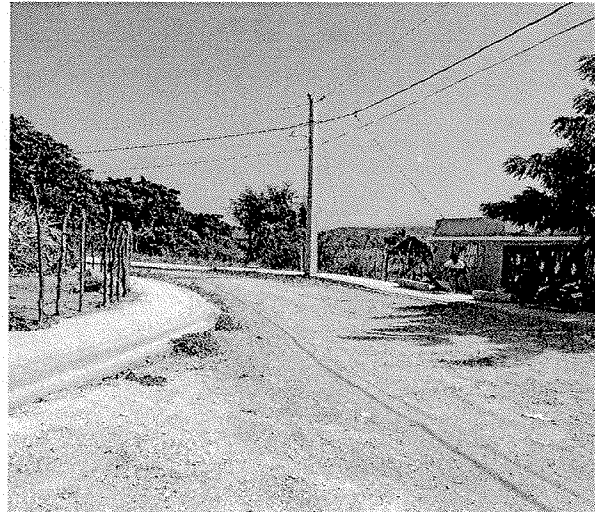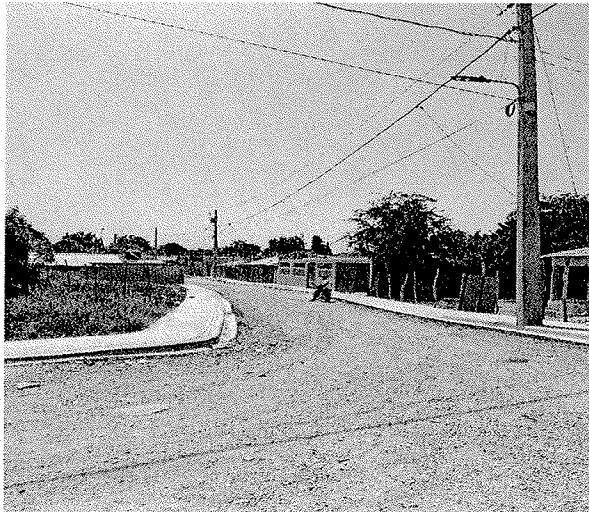



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

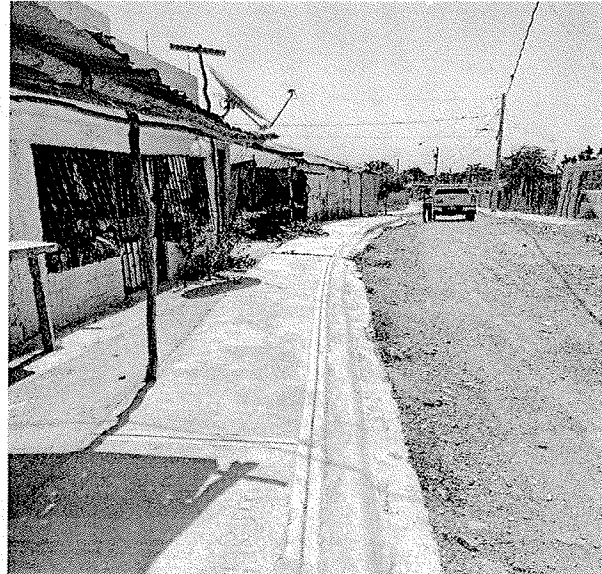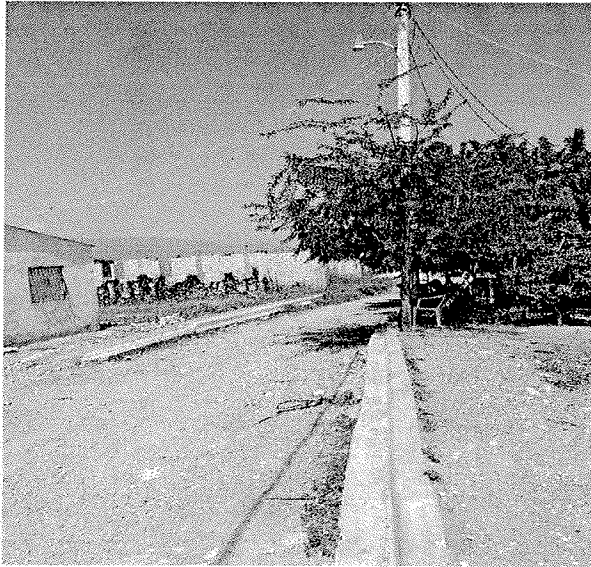

Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA

Técnico

FELIPE REYES

Técnico
