



**LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -**


SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANTEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 11 de octubre de 2022
TÉCNICOS: 1. Ing. Richard Cabrera
 2. Ing. Danilo Mercado
CODIGO: 020701
REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: AZUA
MUNICIPIO: PUEBLO VIEJO
DISTRITO MUNICIPAL: -

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE 1 ERA	35.55	0.67	2	35.55	2	47.637	71.1
TRAMO B	CALLE 2 DA	117.00	0.85	2	117.00	2	198.9	234
TRAMO C	CALLE 2 DA	50.00	0.80	2	50.00	2	80	100
TRAMO D	CALLE 1 ERA	87.75	0.93	2	87.75	2	163.215	175.5
TRAMO E	CALLE 3 ERA	53.40	0.93	2	53.4	2	99.324	106.8
TRAMO F	CALLE 4 TA	71.00	0.75	2	57.2	2	106.5	114.4
TRAMO G		96.90	1.12	2	100.85	2	217.056	201.7
Total							912.63	1003.50

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,386,466.18
 Monto desembolsado RD\$ 3,386,466.18 (100%)
 Avance de obra 110.98%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 11 de octubre de 2022

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: PUEBLO VIEJO

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 912.63 metros cuadrados de aceras y 1,003.50 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. El proyecto se ejecuto vía contrato.
2. La obra cumple con los estándares de calidad exigido por el programa.

IMÁGENES






LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -

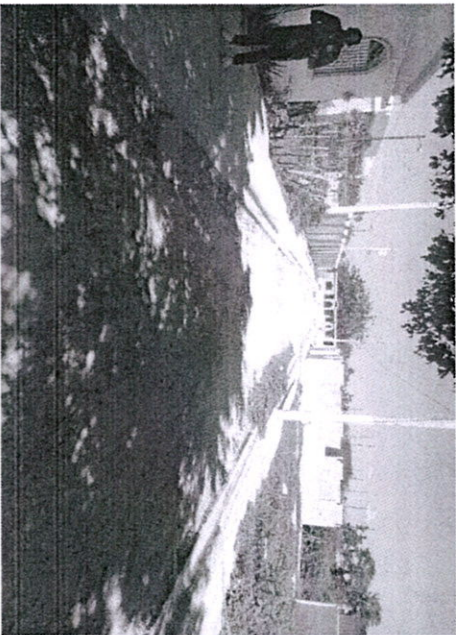

Suministra los datos de este reporte,



ING. RICHARD CABRERA
Técnico



ING. DANILLO MERCADO
Técnico

