



3er Componente

LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: AZUA
MUNICIPIO: AZUA
DISTRITO MUNICIPAL: PUEBLO VIEJO
BARRIO Y/O SECTOR: LAS TERRERAS
BARRIO EL ABANICO DE LAS TERRERAS

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
b. Contratista

Razón Social
RNC ó Cédula: 430003093

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)


- a. Reparación de aceras y contenes: X
b. Incluye demoliciones de tramos:
c. Incluye badenes:
d. Otros:

[Empty box for additional project description]

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.





LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 020701

REGIÓN: VALDESI/A

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: PUEBLO VIEJO

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 11 de octubre de 2022

1. Ing. Richard Cabrera

TÉCNICOS: 2. Ing. Danilo Mercado

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANGHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE 1 ERA	35.55	0.67	2	35.55	2	47.637	71.1
TRAMO B	CALLE 2 DA	117.00	0.85	2	117.00	2	198.9	234
TRAMO C	CALLE 2 DA	50.00	0.80	2	50.00	2	80	100
TRAMO D	CALLE 1 ERA	87.75	0.93	2	87.75	2	163.215	175.5
TRAMO E	CALLE 3 ERA	53.40	0.93	2	53.4	2	99.324	106.8
TRAMO F	CALLE 4 TA	71.00	0.75	2	57.2	2	106.5	114.4
TRAMO G		96.90	1.12	2	100.85	2	217.056	201.7
Total							912.63	1003.50

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,386,466.18

Monto desembolsado RD\$ 3,386,466.18 (100%)

Avance de obra 110.98%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 11 de octubre de 2022

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: PUEBLO VIEJO

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 912.63 metros cuadrados de aceras y 1,003.50 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. El proyecto se ejecuto vía contrato.
2. La obra cumple con los estándares de calidad exigido por el programa.

IMÁGENES

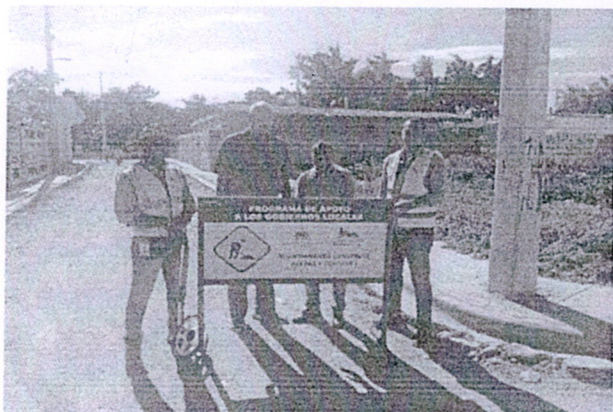



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA

Técnico

ING. DANILO MERCADO

Técnico

