

### SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 020901

**REGIÓN: VALDESIA** 

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: GUAYABAL

**DISTRITO MUNICIPAL: -**

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 9 de agosto de 2022

1. Ing. Richard Cabrera

TÉCNICOS: 2. Ing. Danilo Mercado

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Justo Morillo	359.30	0.85	. 1	416.70	1	305.405	416.7
TRAMO B								325 2. 5 0
TRAMO C								
TRAMO D								
TRAMO E								
TRAMOF								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMOI								
TRAMOJ								
Total							305.405	416.7

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,177,366.10

Monto desembolsado RD\$ 1,588,683.06 (50%)

Avance de obra 46.13%



# SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 9 de agosto de 2022

PROVINCIA: AZUA REGIÓN: VALDESIA

MUNICIPIO: GUAYABAL

DISTRITO MUNICIPAL: -


# REPÓRTE


corresponde al 46.13% del fondo asignado para este territorio. A la fecha de 09/08/2022 se ha ejecutado 305.41 metros cuadrados de aceras y 416.70 metros lineales de contén, lo que

## NOTAS

- Se esta ejecutando por contrato la obra.
- empalizadas. Se hizo una ampliación de la calle donde se realizó limpieza, corte de talud y remocion de


# **IMÁGENES**







**DOMINICANA**-

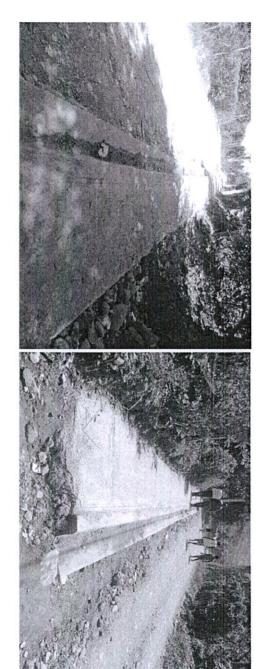

Suministra los datos de este reporte, ING. RICHARD CABRERA Técnico ING. DANILO MERCADO Técnico
