



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

**CODIGO:** 030302

**REGIÓN:** ENRIQUILLO

**PROVINCIA:** BAHORUCO

**MUNICIPIO:** TAMAYO

**DISTRITO MUNICIPAL:** UVILLA

**FECHA DE ÚLTIMA VISITA:** 19 de agosto de 2022


1. Arq. Zunilda Del Rosario

**TÉCNICOS:** 2. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CARRETERA PRINCIPAL				80.30	2		160.6
TRAMO B	CARRETERA PRINCIPAL				8.00	1		8
TRAMO C	CARRETERA PRINCIPAL				8.20	2		16.4
TRAMO D	CALLE VIDAL FELIZ AL LADO SRA. LOURDES				8.5	1		8.5
TRAMO E	CALLE VIDAL FELIZ AL LADO SRA. LOURDES				55.3	2		110.6
TRAMO F	CALLE VIDAL FELIZ AL LADO SRA. LOURDES				9.3	1		9.3
TRAMO G	CALLE CAMINO VIEJO				84.6	2		169.2
TRAMO H	CALLE CAMINO VIEJO				28	1		28
TRAMO I	CALLE JACINTA AGRAMONTE				22.4	1		22.4
TRAMO J	CALLE JACINTA AGRAMONTE				62.2	2		124.4
TRAMO K	CALLE JACINTA AGRAMONTE				6.4	1		6.4
TRAMO L	CALLE DR. ELVIN SANTANA				121	2		242
TRAMO M	CALLE DELIVER RODRIGUEZ				36.4	1		36.4
TRAMO N	CALLE DELIVER RODRIGUEZ				32.8	1		32.8
TRAMO O	CALLE DELIVER RODRIGUEZ				14.4	1		14.4
<b>Total</b>							<b>0</b>	<b>989.4</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado	RD\$ 2,930,957.71	
Monto desembolsado	RD\$ 1,465,478.86	(50%)
Avance de obra	87.45%	



# LIGA MUNICIPAL —DOMINICANA—

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 19 de agosto de 2022

PROVINCIA: BAHORUOCO

MUNICIPIO: TAMAYO

DISTRITO MUNICIPAL: UVILLA




## REPORTE


A la fecha de 19/08/2022 se ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 989.40 metros lineales de contén, lo que corresponde al 87.45% del fondo asignado para este territorio.

## NOTAS

1. Solo se esta construyendo contenes para aprovechamiento del plan de asfaltado.
2. Se visualiza buena terminación en el acabado de los contenes.

## IMÁGENES

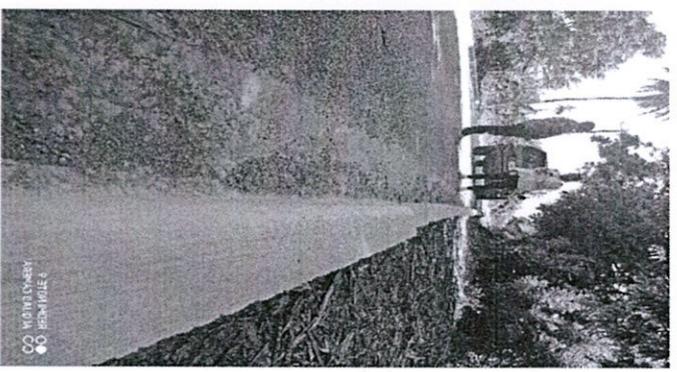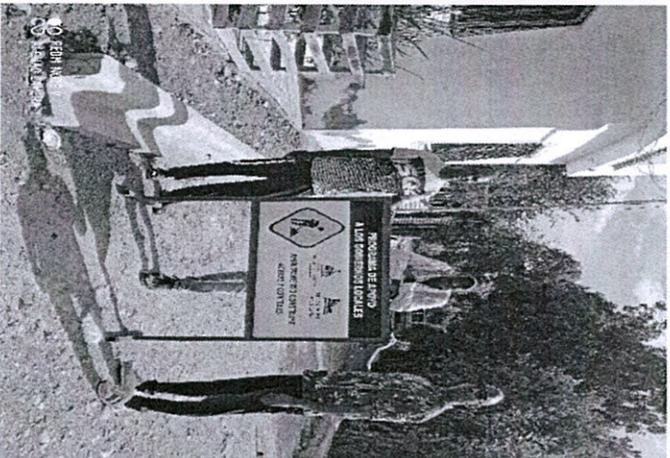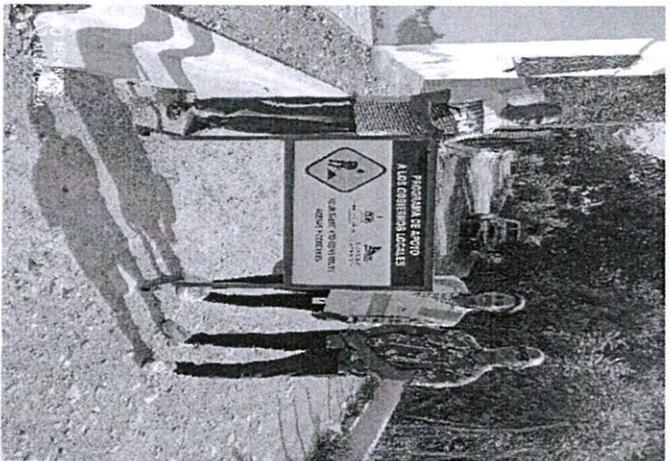



LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

Suministra los datos de este reporte,

*Zunilda Del Rosario G.*

ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO

Técnico

*Stanylin Mendoza*

ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico

