



**Municipio
Santa Cruz
de Barahona**

C / 30 de mayo, No. 32, Centro, Barahona
Municipio de Barahona, Rep. Dom.
Teléfono: 809-524-2613
Email: alcaldiard@gmail.com

**Noviembre 14, 2022
Barahona, Rep. Dom.**

Señor;
Víctor D'Aza.
Presidente de la Liga Municipal Dominicana
Sus manos;

Honorable;

Luego de un cordial saludo, tenemos a bien dirigirme a usted a los fines de hacer entrega formal del informe de fecha 09 de noviembre del año en curso, sobre la construcción de aceras y contenes, donde se especifica los lugares donde se han ejecutado los fondos para la construcción de aceras y contenes; así como la cantidad de estos, de igual forma establecemos que no hemos recibido fondos de otras instituciones para el mismo tipo de obra.

Quedamos atentos a cualquier información adicional que requieran para validar, lo informado, se despide con alta consideración y estima;


Mictor Emilio Fernandez De La Cruz
Alcalde municipal





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
INFORME DE EJECUCION DE FONDOS TRANSFERIDOS DE LA LIGA
MUNICIPAL (2022)

Miércoles 09, noviembre del 2022
Barahona, Rep. Dom.


Informe:

Que en fecha dos (02) de marzo del año Dos Mil Veintidós (2022), fue transferidos a la cuenta de Inversión y Capital No. 040-200919-3, del ayuntamiento municipal de Barahona, el monto de **Nueve Millones Setecientos Veintitún Mil Novecientos Noventa y Cinco pesos con 58/100 (RD\$9,721,995.58).**

En virtud de la solicitud realizada a la Liga Municipal para la construcción de Aceras y Contenes en el marco del Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales para obras de Infraestructura de Competencia Municipal (Aceras y Contenes), se procedió a realizar ejecuciones administrativas a los fines de crear impacto social en el municipio, a través de Sorteo de Aceras y Contenes a la Asociación de Maestros Constructores del Municipio de Barahona, el cual se distribuyeron en las siguientes localidades y con metros asignados:

No.	Descripción	Cantidad	Metro	Obra
1,2,3	Av. Casandra Damián	3 lotes	543 metro (c/u)	Aceras y Contenes
4	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	1 lote	580.63 metro	Aceras y Contenes
5	C/ Duarte, Parque Villa Estrela	1 lote	242.85 metro	Aceras y Contenes
6	Bloque No. 1 Los Multis	1 lote	390.22 metro	Aceras y Contenes
7	Bloque No. 2 Los Multis	1 lote	322.46 metro	Aceras y contenes
8	Cuartel de la Policía Nacional	1 lote	755.03 metro	Aceras y Contenes
9	Rotonda Pueblo Nuevo hasta Cancha Alto Velo	1 lote	609.80 metro	Aceras y Contenes
10	Barrio UASD	1 lote	262.20 metro	Aceras y Contenes
11	C/ B, Casandra	1 lote	240.00 metro	Aceras y Contenes
TOTAL, DE METROS			5,032.19 metro	

Atendiendo a lo antes expuesto, en fecha Dieciocho (18) de julio del año en curso, a través de un acto público en el Salón Luis Ayala del Ayuntamiento Municipal de Barahona, en horas de las 9:00 a.m., se procedió a sortear los lotes mencionados.

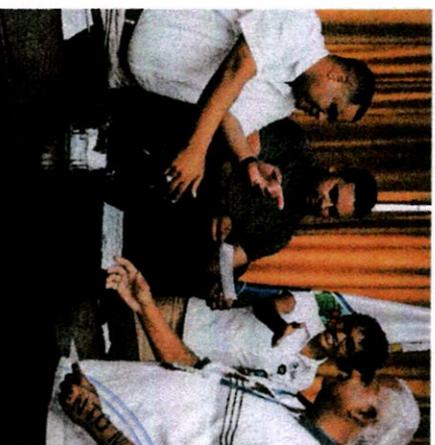




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 INFORME DE EJECUCION DE FONDOS TRANSFERIDOS DE LA LIGA
 MUNICIPAL (2022)


La distribución de los lotes, según el sorteo fue la siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Metro	Maestro Constructor
1	Av. Casandra Damirón	1 lote	543 metro	Arcindo Feliz Terrero
2	Av. Casandra Damirón	1 lote	543 metro	Bladimir A. Cuello
3	Av. Casandra Damirón	1 lote	543 metro	Alnides Feliz Torres
4	C/ Nuestra Señora del Rosario	1 lote	580.63 metro	Víctor M. Ventura
5	C/ Duarte, Parque Villa Estela	1 lote	242.85 metro	Andrés Adames
6	Bloque No. 1 Los Multis	1 lote	390.22 metro	Moisés Ferreras
7	Bloque No. 2 Los Multis	1 lote	322.46 metro	Ángel Danilo Adames
8	Cuartel de la Policía Nacional	1 lote	755.03 metro	Giovanny R. Fernandez P.
9	Rotonda Pueblo Nuevo hasta Cancha Alto Velo	1 lote	609.80 metro	Manolo Feliz Feliz
10	Barrio UASD	1 lote	262.20 metro	N/A
11	C/ B, Casandra	1 lote	240.00 metro	Antonio Carrasco Suero

Tal y como establece la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, se realizó un contrato de ejecución de obra con las cláusulas establecidas que debe contener dicho contrato para la firma y ejecución de estos. En fecha 28 de julio del año en curso, se les entregó un 25% de inicial del monto adjudicado a los fines de iniciar los trabajos.

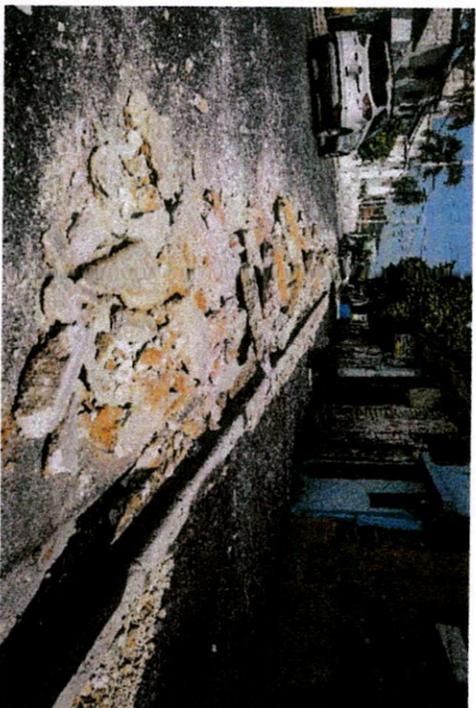

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 INFORME DE EJECUCION DE FONDOS TRANSFERIDOS DE LA LIGA
 MUNICIPAL (2022)

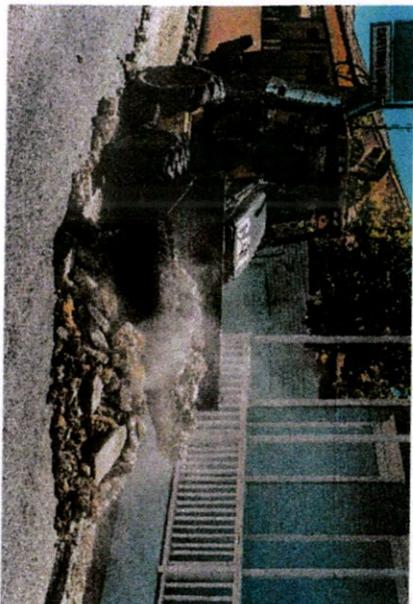

Vale destacar que los lotes adjudicados son solamente gestionados para mano de obra, entre los cuales tienen los siguientes montos:

No. Lote	Nombre	Monto
1	Arcindo Feliz Terrero	RD\$304,080.00
2	Bladimir Adames Cuello	RD\$304,080.00
3	Alnides Feliz Torres	RD\$304,080.00
4	Víctor M. Ventura Gómez	RD\$325,152.80
5	Andrés Adames	RD\$135,996.00
6	Moisés Ferreras	RD\$218,523.20
7	Ángel Danilo Adames	RD\$180,577.60
8	Giovanny Rafael Fernandez Pérez	RD\$422,816.80
9	Manolo Feliz Feliz	RD\$341,488.00
10	N/A	RD\$146,832.00
11	Antonio Suero Carrasco	RD\$134,400.00
TOTAL		2,818,024.60

Que en fecha Diecinueve (19) del mes de julio del año Dos Mil Veintidós (2021), se realizó una compra directa a **Cementos Santo Domingo S.A.** por la compra de 2,000 fundas de cementos para ser utilizados en las construcciones contempladas, de los cuales tuvimos una inversión de **Ochocientos Cuarenta y Seis Mil Pesos (RD\$846,000.00)**. (Anexo sustento legal de dicha compra).


Que en fecha Catorce (14) del mes de junio del año Dos Mil Veintidós (2022), se realizó una solicitud de colaboración a **Block Khoury Industria**, a los fines de solicitarle su colaboración para la donación de 600 metros de arena y 600 metros de grava, para ser utilizados en la construcción de las aceras y contenes intervenidas, obteniendo con esto un rendimiento económico para la intervención de las localidades del Municipio de Barahona, en la cual podemos impactar con estos fondos transferidos para Aceras y Contenes.

Que en fecha Veinticinco (25) de julio del año en curso, tuvimos respuesta positiva ante tal solicitud realizada a **Block Khoury Industria**, por lo que se procedió a contratar Transporte para trasladar los agregados donados, lo cual han sido transferidos a través de viajes de metro de arena de lo que toma un camión de 8 metro.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
INFORME DE EJECUCION DE FONDOS TRANSFERIDOS DE LA LIGA
MUNICIPAL (2022)

Que en fecha Diecinueve (19) de julio del año Dos Mil Veintidós (2022), a través del Contrato Transporte de Materiales Agregados, con el señor **Pedro Rolando Pérez Díaz**, titular de la cedula de identidad No. 018-0067838-3, se contrató el transporte de dichos agregados por un monto de **Quinientos Cuatro Mil Pesos (RD\$504,000.00)**, con un cronograma de entrega de dichos materiales. (Anexo sustento legal de dicha compra).

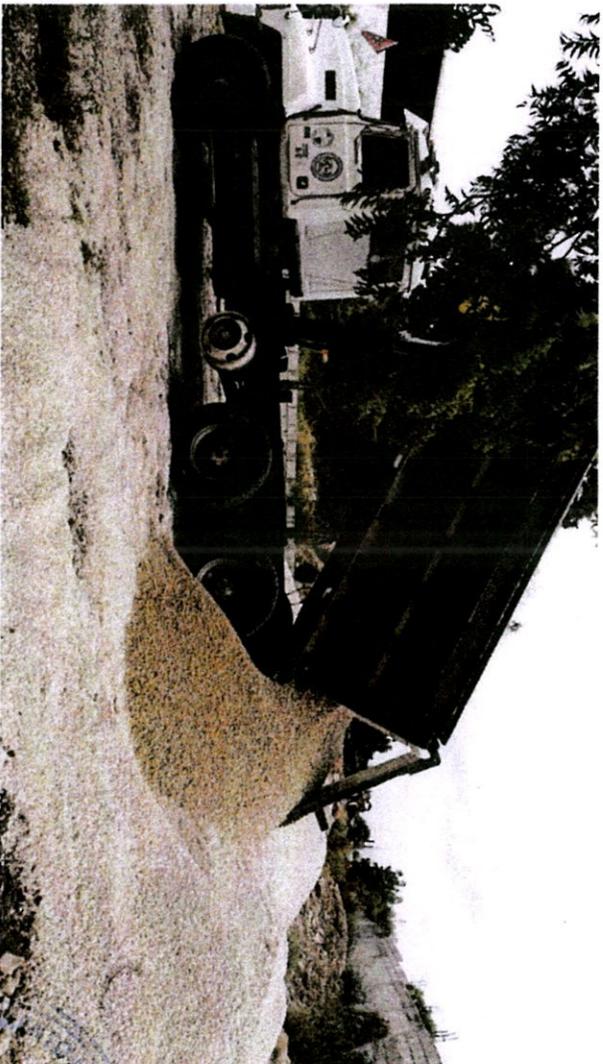




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
INFORME DE EJECUCION DE FONDOS TRANSFERIDOS DE LA LIGA
MUNICIPAL (2022)

Que en fecha Diez (10) de agosto del año en curso, a través del Contrato Servicio de Transporte, con el señor **Jousy Rafael Peláez Santana**, titular de la cedula de identidad No. 018-0014448-5, se contrató para el retiro y bote de los escombros generados en los lugares intervenidos por un monto de **Veinticuatro Mil Pesos (RD\$24,000.00)**. (Anexo sustento legal de dicha compra).




Que en fecha Veinticinco (25) de julio del año en curso, se realizó una compra directa a **Maderas González**, por la compra de 33 maderas 1x12x14 bruta para ser utilizados como planilla para la construcción de aceras y contenes, de los cuales tuvimos una inversión de **Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Diez pesos (RD\$48,510.00)**. (Anexo sustento legal de dicha compra).

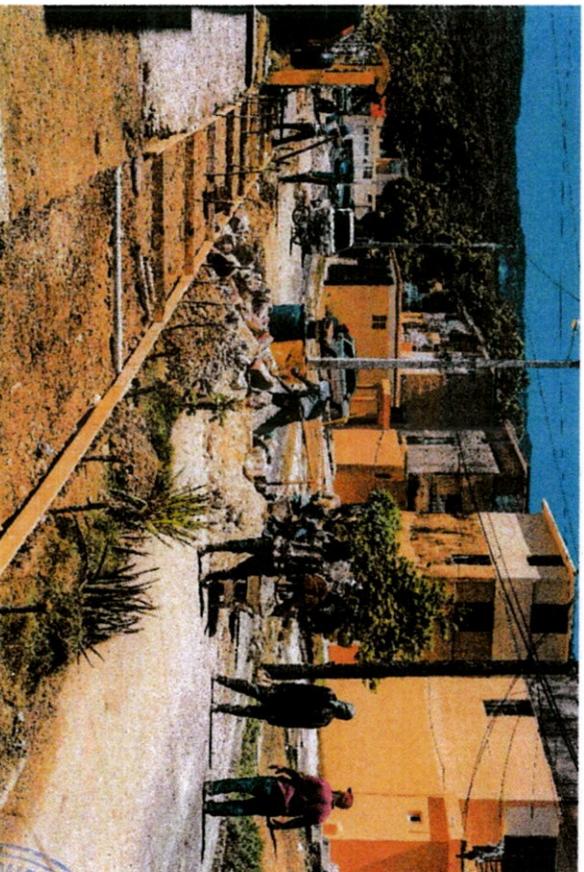




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
INFORME DE EJECUCION DE FONDOS TRANSFERIDOS DE LA LIGA
MUNICIPAL (2022)

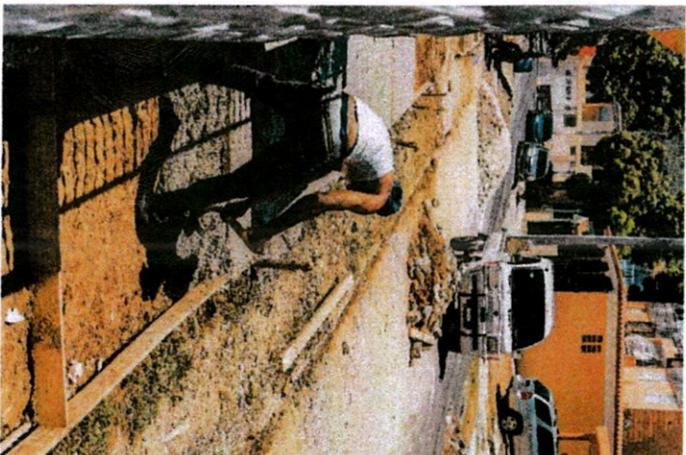


Que en fecha Doce (12) de julio del año en curso, se realizó una compra directa a **Estervino Pérez y Asociados**, por la compra de materiales (hierros) para ser utilizados para la elaboración de burros vehicular a ser colocado en las obras en cuestión, de los cuales tuvimos una inversión de **Sesenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Seis pesos (RD\$66,986.06)**. (Anexo sustento legal de dicha compra).

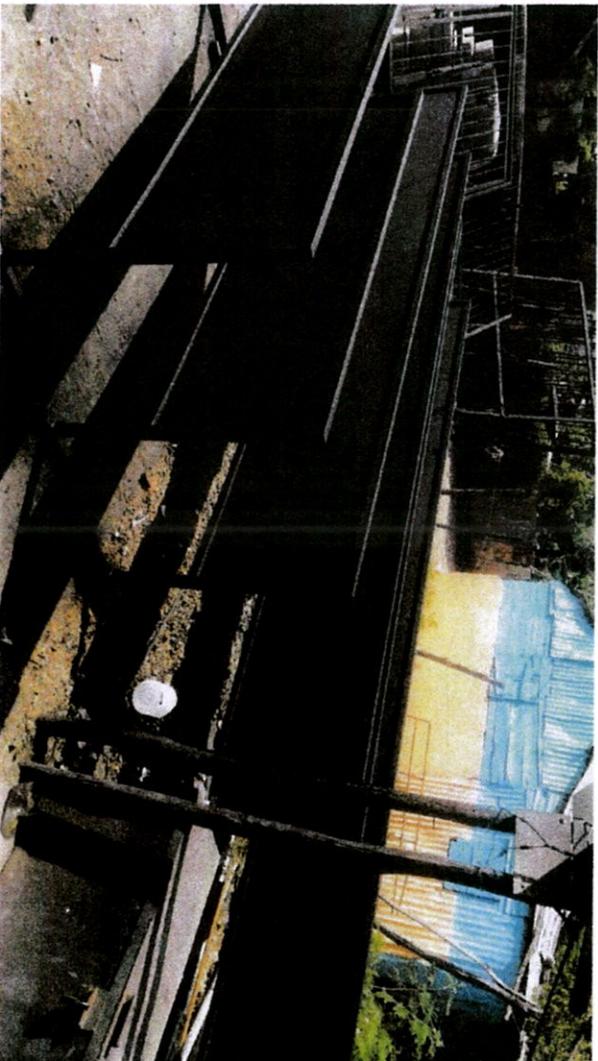



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
INFORME DE EJECUCION DE FONDOS TRANSFERIDOS DE LA LIGA
MUNICIPAL (2022)

Que en fecha Ocho (08) de agosto del año en curso, se realizó una compra directa a **Victor Osvaldo Ramírez Brito**, por la rotulación de los burros vehicular a ser colocado en las obras en cuestión, de los cuales tuvimos una inversión de Treinta y Seis Mil Setecientos pesos (RD\$36,700.00). (Anexo sustento legal de dicha compra).

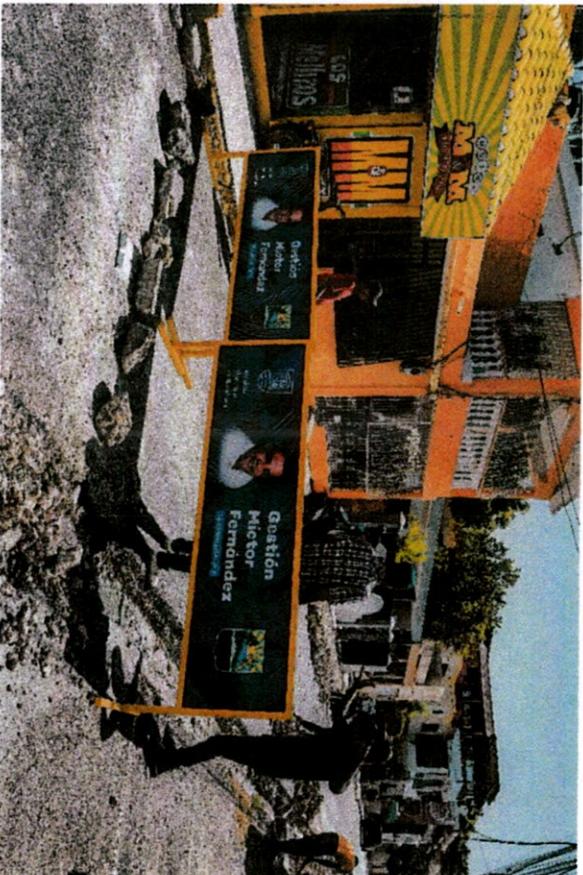


Que en fecha Treinta (30) de agosto del año en curso, por exigencia de los moradores del sector Casandra del Municipio de Barahona, sostenían la carencia de un puente vehicular para el buen tránsito de los ciudadanos en dicho sector, por lo que esta alcaldía considerando esta pequeña obra de impacto social, realizo las ejecuciones correspondientes para construir la misma. Trabajo pagado al señor Eudín Agustín Pérez Cuevas, por una inversión de Cincuenta y Cinco Mil Pesos (RD\$55,000.00).

Que en fecha Veinticinco (25) de agosto del año en curso, se realizó una compra directa a **Transporte y Ferreteria Ivanny SRL**, por la compra de materiales de construcción para hacer el puente, de los cuales tuvimos una inversión de Cincuenta y Cinco Mil Quinientos pesos (RD\$55,500.00). (Anexo sustento legal de dicha compra).





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
INFORME DE EJECUCION DE FONDOS TRANSFERIDOS DE LA LIGA
MUNICIPAL (2022)

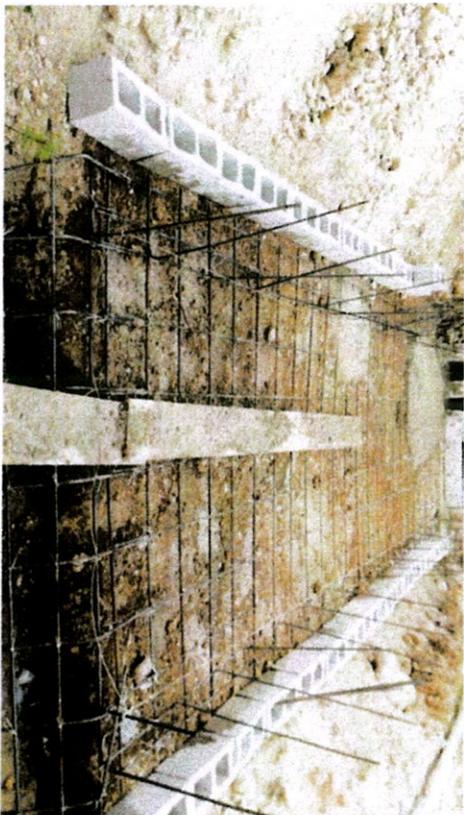

Resumen de Ejecución de Fondos:

Fecha	Nombre	Monto	Descripción
28-07-2022	Alnides Feliz Torres	76,020.00	Pago del 25% obra
28-07-2022	Bladimir Adames Cuello	76,020.00	Pago del 25% obra
28-07-2022	Arcindo Feliz Terrero	76,020.00	Pago del 25% obra
28-07-2022	Andrés Adames	33,999.00	Pago del 25% obra
28-07-2022	Manolo Feliz Feliz	85,372.00	Pago del 25% obra
28-07-2022	Ángel Danilo Adames	45,144.00	Pago del 25% obra
28-07-2022	Giovanny Rafael Fernandez Pérez	105,704.02	Pago del 25% obra
28-07-2022	Moisés Ferreras	54,630.80	Pago del 25% obra
28-07-2022	Antonio Suero Carrasco	33,600.00	Pago del 25% obra
28-07-2022	Víctor Manuel Ventura Gómez	81,288.02	Pago del 25% obra
26-07-2022	Roberto González Bonifacio	48,510.00	Pago de compra de madera
19-07-2022	Cemento Santo Domingo S,A	846,000.00	Pago de compra cemento
12-07-2022	Estervirno Pérez y Asociados	66,986.06	Pago de compra para elaboración de burros vehicular
25-07-2022	Pedro Rolando Pérez Diaz	50,000.00	Pago de transporte de agregados
28-07-2022	Nadin Santana Olivero	82,700.00	Pago de elaboración de aceras y contenes en la delicia
AGOSTO			
22-08-2022	Antonio Suero Carrasco	53,760.00	Pago de la 1era cubicación
22-08-2022	Giovanny Rafael Fernandez Pérez	57,382.28	Pago de la 1era cubicación
22-08-2022	Andrés Adames	44,684.40	Pago de la 1era cubicación
22-08-2022	Víctor Manuel Ventura Gómez	54,579.22	Pago de la 1era cubicación
24-08-2022	Pedro Rolando Pérez Diaz	80,000.00	Pago de transporte de agregados
08-08-2022	Víctor Osvaldo Ramírez Brito	36,700.00	Pago de rotulación de burros
10-8-2022	Jousy Rafael Peláez Santana	24,000.00	Pago de bote de escombros
25-8-2022	Transporte y Ferrería Ivanny	55,500.09	Pago de compra de materiales de construcción





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
INFORME DE EJECUCION DE FONDOS TRANSFERIDOS DE LA LIGA
MUNICIPAL (2022)

30-8-2022	Eudin Agustín Pérez Cuevas	55,000.00	Pago de mano de obra de puente peatonal	
SEPTIEMBRE				
07-9-2022	Luis Manuel Corniell Sánchez	35,000.00	Servicios de elaboración de letreros	
08-9-2022	Melvin Castillo Florentino	120,347.50	Pago de dirección técnica	
08-9-2022	Melvin Castillo Florentino	240,695.00	Pago de 1era cub. dirección técnica	
08-9-2022	Moisés Ferreras	57,752.56	Pago de la 1era cubicación	
12-9-2022	Andrés Adames	64,112.40	Pago final de obra	
12-9-2022	Cemento Santo Domingo S.A.	438,000.78	Compra de 1000 fundas cemento	
12-9-2022	Carlos Manuel Castro	76,542.84	Construcción aceras en Baitoita	
20-9-2022	Pedro Rolando Pérez Diaz	160,000.00	Pago de 20 viajes de materiales	
20-9-2022	Manolo Feliz Feliz	51,223.20	Pago de la 1era cubicación	
20-9-2022	Domingo Antonio Feliz Pérez	7,000.00	Pago de descargo de 1,000 cementos	
20-9-2022	Víctor Manuel Ventura Gómez	189,285.38	Pago final de obra	
20-9-2022	José David Cuello	109,863.00	Construcción aceras en la Sánchez	
30-9-2022	Andrés Adames	65,427.70	Pago final de la obra	
OCTUBRE				
05-10-2022	Alnides Feliz Torres	39,096.00	Pago de la 1era cubicación	
05-10-2022	Giovanny Rafael Fernandez Pérez	54,664.17	Pago de la 2da cubicación	
05-10-2022	Moisés Ferreras	106,139.84	Pago final de la obra	
05-10-2022	Arcindo Feliz Terrero	39,096.00	Pago de la 1era cubicación	
05-10-2022	Bladimir Adames Cuello	39,096.00	Pago de la 1era cubicación	
06-10-2022	Barahon Com SRL	3,324.00	Pago de transporte de camiones	
06-10-2022	Barahon Com SRL	3,324.00	Pago de transporte de camiones	
12-10-2022	Antonio Suero Carrasco	57,360.00	Pago final de la obra	
18-10-2022	Manolo Feliz Feliz	91,470.00	Pago de la 2da cubicación	
18-10-2022	Víctor Manuel Ventura Gómez	120,323.68	Pago de adicional y construcción de aceras en el sector río chill	
18-10-2022	Jonathan Miguel Alcántara	35,200.00	Construcción aceras en canta la rana	
18-10-2022	Francis Junior Cuevas Ramírez	118,800.00	Construcción aceras en alto velo	
18-10-2022	Moisés Ferreras	103,642.43	Pago final de la obra	
18-10-2022	Pedro Rolando Pérez Diaz	112,000.00	Pago de 14 viajes de materiales	
20-10-2022	Cementos Santos Domingo S. A	438,000.78	Pago de 1000 fundas cemento	
20-10-2022	Ángel Danilo Adames	124,891.56	Construcción aceras en el sector Río Biran	
20-10-2022	Antonio Suero Carrasco	125,685.52	Construcción aceras en el sector Río Biran	
31-10-2022	Arcindo Feliz Terrero	188,964.00	Pago de la 1era cubicación	
31-10-2022	Domingo Antonio Feliz Pérez	8,000.00	Pago de descarga 1000 cemento	
TOTAL, EJECUTADO:		RD\$5,641,281.53		
TOTAL, FALTANTE		RD\$3,695,318.21		

En total se han construido 3,909.56 metros cuadrados de aceras y 1,371.43 metros lineales de contenes, teniendo un excedente de construcción de aceras y contenes de 248.80 metros. No hemos recibido fondos de otras instituciones para la actual finalidad de esta obra, solamente de la Liga Municipal de Dominicana, los designados.

Es importante resaltar, que la Comunicación presupuestaria, la cual certifica el monto restante en las cuentas presupuestaria, tiene una diferencia de RD\$3,324.00 lo cual





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
INFORME DE EJECUCION DE FONDOS TRANSFERIDOS DE LA LIGA
MUNICIPAL (2022)

fueron ejecutados en el mes de Noviembre y el presente informe, es hasta el mes de octubre, debido a que no hay mas pago hasta la fecha.

Anexo:

- Copia de Solicitud de Informe construcción aceras y contenes LMD
- Informe de tesorería de cheques emitido en esta programática (aceras y contenes)
- Carta presupuestaria, la cual certifica el monto restante en las cuentas.


Lidia Luz Rodríguez
Encargada de Compra y Contrataciones
Ayuntamiento Municipal de Barahona





**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

SAOPPOT-1344-2022



Mano de Emilio Fernandez De La Cruz

Santo Domingo, D.N
18 de octubre del 2022

Al:

Señor

Mictor Emilio Fernandez De La Cruz

Alcalde

Municipio de Barahona

Sus manos-

Asunto:

Solicitud de informe construcción aceras y contenes


Luego de un cordial saludo, visto el convenio LMD-Ayuntamiento específicamente el Art.3 y sus literales **F, G y J** que establecen:

- F.** Informar a la Liga Municipal Dominicana todo lo relativo a las diferentes etapas del proceso de ejecución de obras.
- G.** Identificar e informar a la LMD, los lugares específicos en los que se construirán las aceras, contenes y sus obras complementarias si fueran necesarias. En la eventualidad de realizar obras complementarias, estas correrán por cuenta del presupuesto del Ayuntamiento.
- J.** Presentar los informes correspondientes a los organismos de control del estado y a la LMD.

Le estamos solicitando nos informen por escrito los lugares donde se han ejecutado los fondos para la construcción de aceras y contenes; así como la cantidad de estos, de igual forma nos informen si han recibido fondos de otra institución para el mismo tipo de obra, o si han ejecutado las obras mencionadas anteriormente con los fondos propios del Ayuntamiento.

Nota: Requerimos de esta información con la mayor celeridad posible,

Muy atentamente,


Ing. Valentin Santos Garza

Subsecretario

Subsecretaría de Apoyo Municipal de Obras
Públicas, Planeamiento y Ordenamiento
Territorial

VS/ep



**Municipio
Santa Cruz
de Barahona**

C/ 30 de mayo, No. 32, Centro, Barahona
Municipio de Barahona, Rep. Dom.
Teléfono: 809-524-2613
Email: alcaldiard@gmail.com

**Miércoles 09, noviembre 2022
Barahona, Rep. Dom.**

**Sra.
Luz Rodríguez
Enc. Compra y Contrataciones
Sus manos;**

Luego de un cordial saludo, me dirijo a usted para hacerle de su conocimiento el listado de los comprobantes de los beneficiarios por cheques y transferencia por los cuales son destinados para la construcción de aceras y contenes del Municipio de Barahona.

En el encontrara los pagos por primera cubicación, segunda y en caso de pagos adicionales, también pago de la compra de cemento, materiales para las construcciones de valla, pago de alquiler de maquina para trasladar la arena y grava, pago de mano por descarga de cemento.

Sin mas en particular, se despide;



Lic. Yoel Barahona
Tesorero Municipal de Barahona

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

Listado Comprobantes Devengados por Partida Presupuestaria

Programática : 11.01.0055 - Construccion Aceras y Contenes LMD
Objeto Gasto : 7.02.4.01 - Infraestructura terrestre y obras anexas
Destino Fondo : 2.2 - Obras de Infraestructura
Cuenta : 040-200919-3 - Cuenta de Inversion
FF : 10 - Fuente General
FE : 100
OF : 100 - Tesoro Nacional
ER : 0

Fecha	N° Comprobante	Tipo de Pago	Proveedor	Monto
12/7/2022	2022-001258	CK	ESTERVINO PEREZ & ASOCIADOS SRL	66,986.06
19/7/2022	2022-001271	Tf	CEMENTOS SANTO DOMINGO SA	846,000.00
25/7/2022	2022-001352	Tf	PEDRO ROLANDO PEREZ DIAZ	50,000.00
26/7/2022	2022-001359	CK	ROBERTO GONZALEZ BONIFACIO	48,510.00
28/7/2022	2022-001367	CK	NADIN SANTANA OLIVERO	82,700.00
28/7/2022	2022-001371	CK	ALNIDES FELIZ TORRES	76,020.00
28/7/2022	2022-001372	CK	BLADIMIR ADAMES CUELLO	76,020.00
28/7/2022	2022-001373	CK	ARCINDO FELIZ TERRERO	76,020.00
28/7/2022	2022-001374	CK	ANDRES ADAMES	33,999.00
28/7/2022	2022-001375	CK	MANOLO FELIZ FELIZ	85,372.00
28/7/2022	2022-001376	CK	ANGEL DANIL O ADAMES	45,144.40
28/7/2022	2022-001377	CK	GIOVANNY RAFAEL FERNANDEZ PEREZ	105,704.02
28/7/2022	2022-001378	CK	MOISES FERRERAS	54,630.80
28/7/2022	2022-001379	CK	ANTONIO SUERO CARRASCO	33,600.00
28/7/2022	2022-001380	CK	VICTOR MANUEL VENTURA GOMEZ	81,288.02
8/8/2022	2022-001461	Tf	VICTOR OSVALDO RAMIREZ BRITO	36,700.00
10/8/2022	2022-001486	CK	JOUSY RAFAEL PELAEZ SANTANA	24,000.00
22/8/2022	2022-001545	CK	ANTONIO SUERO CARRASCO	53,760.00
22/8/2022	2022-001546	CK	GIOVANNY RAFAEL FERNANDEZ PEREZ	57,382.28
22/8/2022	2022-001547	CK	ANDRES ADAMES	44,684.40
22/8/2022	2022-001548	CK	VICTOR MANUEL VENTURA GOMEZ	54,579.22
23/8/2022	2022-001602	Tf	PEDRO ROLANDO PEREZ DIAZ	8,000.00
25/8/2022	2022-001624	Tf	PEDRO ROLANDO PEREZ DIAZ	72,000.00
25/8/2022	2022-001629	Tf	TRANSPORTE Y FERRETERIA IVANNY SRL	55,500.99
30/8/2022	2022-001644	CK	EDUIN AGUSTIN PEREZ CUEVAS	55,000.00
7/9/2022	2022-001682	CK	LUIS MANUEL CORNIELL SANCHEZ	35,000.00
8/9/2022	2022-001695	CK	MELVIN CASTILLO FLORENTINO	1120,347.50
8/9/2022	2022-001696	CK	MELVIN CASTILLO FLORENTINO	240,695.00
8/9/2022	2022-001698	CK	MOISES FERRERAS	57,752.56
12/9/2022	2022-001714	CK	ANDRES ADAMES	64,112.40
12/9/2022	2022-001715	Tf	CEMENTOS SANTO DOMINGO SA	438,000.78
12/9/2022	2022-001724	CK	CARLOS MANUEL CASTRO	76,542.84



20/9/2022	2022-001755	Tf	28080312881	PEDRO ROLANDO PEREZ DIAZ	160,000.00
20/9/2022	2022-001756	CK	20134	MANOLO FELIZ FELIZ	51,223.20
20/9/2022	2022-001779	CK	20136	DOMINGO ANTONIO FELIZ PEREZ	7,000.00
20/9/2022	2022-001780	CK	20137	VICTOR MANUEL VENTURA GOMEZ	189,285.38
20/9/2022	2022-001781	CK	20138	JOSE DAVID CUELLO	109,863.00
30/9/2022	2022-001863	CK	20141	ANDRES ADAMES	65,427.70
5/10/2022	2022-001895	CK	20152	ALNIDES FELIZ TORRES	39,096.00
5/10/2022	2022-001896	CK	20153	GIOVANNY RAFAEL FERNANDEZ PEREZ	54,664.17
5/10/2022	2022-001897	CK	20154	MOISES FERRERAS	106,139.84
5/10/2022	2022-001898	CK	20155	ARCINDO FELIZ TERRERO	39,096.00
5/10/2022	2022-001899	CK	20156	BLADIMIR ADAMES CUELLO	39,096.00
12/10/2022	2022-001950	CK	20169	ANTONIO SUERO CARRASCO	57,360.00
18/10/2022	2022-001962	CK	20172	MANOLO FELIZ FELIZ	91,470.00
18/10/2022	2022-001963	CK	20173	VICTOR MANUEL VENTURA GOMEZ	120,323.68
18/10/2022	2022-001964	CK	20174	JONATHAN MIGUEL ALCANTARA	35,200.00
18/10/2022	2022-001965	CK	20175	FRANCIS JUNIOR CUEVAS RAMIREZ	118,800.00
18/10/2022	2022-001966	CK	20176	MOISES FERRERAS	103,642.43
18/10/2022	2022-001967	Tf	28385685362	PEDRO ROLANDO PEREZ DIAZ	112,000.00
20/10/2022	2022-001974	Tf	28400886819	CEMENTOS SANTO DOMINGO SA	438,000.78
20/10/2022	2022-001983	CK	20178	ANGEL DANIL O ADAMES	124,891.56
20/10/2022	2022-001984	CK	20180	ANTONIO SUERO CARRASCO	125,685.52
31/10/2022	2022-002125	CK	20186	ARCINDO FELIZ TERRERO	188,964.00
31/10/2022	2022-002126	CK	20187	DOMINGO ANTONIO FELIZ PEREZ	8,000.00
TOTAL					5,641,281.53





**Municipio
Santa Cruz
de Barahona**

C/ 30 de mayo, No. 32, Centro, Barahona
Municipio de Barahona, Rep. Dom.
Teléfono: 809-524-2613
Email: alcaldiard@gmail.com

**Lunes 14, noviembre 2022
Barahona, Rep. Dom.**

**Sra.
Luz Rodríguez**
Enc. Compra y Contrataciones
Sus manos;

Luego de un cordial saludo, me dirijo a usted para hacerle de su conocimiento del disponible del presupuesto de gastos por los cuales son destinados para la construcción de aceras y contenes del Municipio de Barahona.

El monto restante es Tres millones seiscientos noventa y cinco mil trecientos dieciocho pesos con veinte un centavo (RD\$ 3,695,318.21), ver adjunto anexo.

Sin más en particular, se despide;



Licda. Leonela Fajiz
Enc. Administrativa y Financiera



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

Balance Presupuesto del Gasto

Correspondiente al mes de **NOVIEMBRE** del 2022

Clasificador del Gasto	Función	FF	FE	OF	ER	DF	Balance
2.3.9.8.01 Repuestos	3202	20	1955	100	0	2.1	751.60
2.6.1.9.01 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	3202	20	1955	100	0	2.1	0.00
2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	3202	20	1955	100	0	2.1	0.00
2.6.5.8.01 Otros equipos	3202	20	1955	100	0	2.1	0.00
12.00.0004 - Supervisión y Administración de Cementerios							0.00
2.3.6.3.04 Herramientas menores	3101	20	1955	100	0	2.1	0.00
12.00.0005 - Administración y Reparación de Unidades Motorizadas							24,897.64
2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	0	2.1	9,089.00
2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y ele	2102	20	1955	100	0	2.1	4,020.00
2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	2102	20	1955	100	0	2.1	0.00
2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	2102	30	9996	102	0	2.1	1,431.00
2.3.6.3.04 Herramientas menores	2102	30	9998	102	0	2.1	25.01
2.3.7.1.02 Gasoil	2102	30	9995	102	0	2.1	5,794.94
2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p	2102	30	9996	102	0	2.1	0.69
2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	2102	20	1955	100	0	2.1	0.00
2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	2102	30	9998	102	0	2.1	1,130.00
2.6.5.7.01 Máquinas-herramientas	2102	30	9998	102	0	2.1	3,407.00
12.00.0007 - Supervisión y Administración de Mercados							0.00
2.6.9.2.02 Adquisición de mejoras para la ejecución de proyecto	3202	40	9992	103	0	2.1	0.00
96.00.0002 - Pago de intereses							0.41
2.9.1.1.01 Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	0	2.1	0.41
2.2 Obras de Infraestructura							12,598,037.22
2 CLASIFICADOR DEL GASTO							12,598,037.22
11.01.0051 - Reparación de aceras y contenes Policia Nacional							0.00
2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0	2.2	0.00
11.01.0055 - Construcción Aceras y Contenes LMD							3,691,994.21
2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0	2.2	3,691,994.21
11.05.0051 - Construcción de Parque en la Raqueta							159,338.68
2.7.2.7.01 Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0	2.2	159,338.68
11.06.0051 - Remodelacion glorieta del parque central							0.00
2.7.2.7.01 Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0	2.2	0.00
11.06.0052 - Remodelacion Parque Villa Estela							1,557,083.64
2.7.2.7.01 Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0	2.2	1,557,083.64
11.07.0051 - Construcción de plaza de los caídos							4,252,721.26
2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	0	2.2	4,252,721.26
11.13.0051 - Construcción de almacen equipo y transporte							0.00
2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	0	2.2	0.00
11.14.0051 - Reparacion de Cocina del palacio Municipal							0.00
